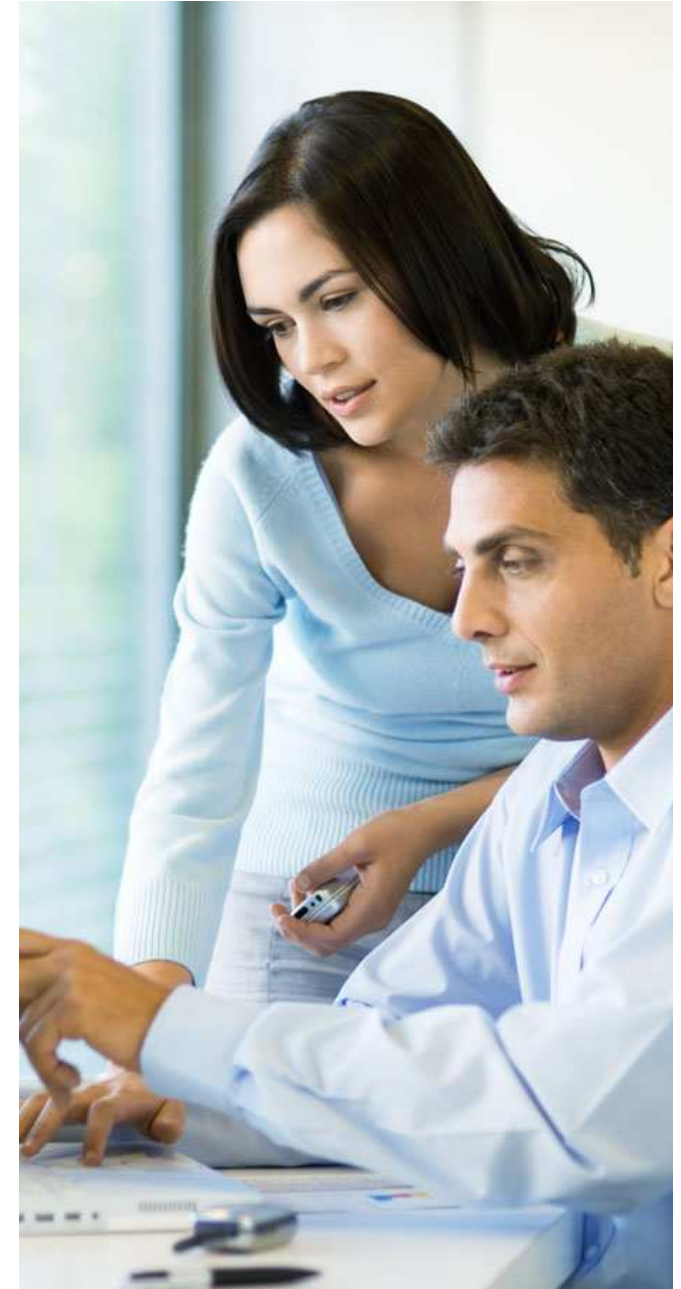

Clarity Best Practice

...ein paar Beispiele

05.02.2010

Stuttgart



Manchmal sind es Kleinigkeiten, die die Stimmung heben:

- Umgang mit Kosten und Benefits in Clarity 12
- Effiziente Ressourcenbeantragung
- Priorisierung und Machbarkeit



- Der neue Finanzplan
- Konfigurierbar
- Ein paar kleine Hilfen

CA Clarity™ PPM



Der nicht mehr isolierte Finanzplan

CLARITY Suchen [Erweiterte Suche]

Kostenplan - Details (Projekt: AM Barmer | Prognose: Migrated budget cost plan)

Eigenschaften **Detail**

Anzeigen: Selbst - Ansicht

Kostenplan - Detail - Filter [--Aktionen--]

Filter [--Auswählen--] [Filter einblenden]

Anzuzeigende Daten Einheiten und Kosten Vergleiche Nur Plan Ansicht aktualisieren

Einheit, Kosten und Ertrag - Details																
	Gruppieren/Untergruppieren nach	Planeinheiten	Plankosten		2008/01	2008/02	2008/03	2008/04	2008/05	2008/06	2008/07	2008/08	2008/09	2008/10	2008/11	2008/12
☐	PF3020	0	0,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	PF3020 Eigenleistung kontierend	0	0,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	PF7013	0	1,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	PF7013 Fremdleistung n. kontierend	0	1,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	PF7065	0	0,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	PF7065 Eigenleistung kontierend	0	0,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	PF7065 Fremdleistung n. kontierend	0	0,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	SF7070	0	544.242,25	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	544.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	SF7070 Eigenleistung kontierend	0	0,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	SF7070 Fremdleistung kontierend	0	0,00	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
☐	SF7070 Fremdleistung n. kontierend	0	544.242,25	Planeinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plankosten	544.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	544.243,25													

Hinzufügen ☒ Löschen Aus Ressourcenplan füllen Eingabeassistent f. kfm. Meilensteine Abbrechen

Währung = EUR

Der nicht mehr isolierte Finanzplan

CLARITY™ Suchen [Erweiterte Suche]

Eingabeassistent f. kfm. Meilensteine

Filter
Transaktionsklassen-Typ Alle

Filter Leeren

Kostenplan nach kfm. Meilensteinen

☒	Transaktionsklasse	Trans.- Klasse ID	Kosten lt. Plan	Umsatz lt. Plan	Geplante Kosten	Geplanter Umsatz	Verknüpfter Meilenstein
☐	PF3020 Eigenleistung kontierend	PF3020_0	0,00	0,00		0,00	[--Auswählen--]
☐	PF7013 Fremdleistung n. kontierend	PF7013_2	1,00	2,00	1,00	2,00	Projektende (30.04.13)
☐	PF7065 Eigenleistung kontierend	PF7065_0	0,00	99,38		99,38	[--Auswählen--]
☐	PF7065 Fremdleistung n. kontierend	PF7065_2	0,00	27.540,00	0,00	27.540,00	[--Auswählen--]
☐	SF7070 Eigenleistung kontierend	SF7070_0	0,00	3.207.577,90		3.207.577,90	[--Auswählen--]
☐	SF7070 Fremdleistung kontierend	SF7070_1	0,00	170.738,97		170.738,97	[--Auswählen--]
☐	SF7070 Fremdleistung n. kontierend	SF7070_2	544.242,25	578.060,00	544.242,25	578.060,00	Projektstart (01.01.08)
Summe			544.243,25	3.984.018,25	544.243,25	3.984.018,25	

Speichern Übernehmen Hinzufügen Teilen Löschen Abbrechen

Navigation:

- Persönlich**
 - Übersicht
 - Organizer
 - Wissensdatenbank
 - Zeitformulare
 - Berichte und Aufträge
 - Benutzereinstellungen
- Portfoliomangement**
 - Portfolios
 - Programme
 - Projekte**
 - Anwendungen
 - Aktivposten
 - Produkte
 - Andere Aufgabe
- Organisation**
 - Abteilungen
- IT-Dienstverwaltung**
 - Dienste
- Reporting**
 - Ertragssicht
 - Faktura Countdown
 - Ist-Aufwand
 - Unberücks. Transaktionen
 - Wochenbericht
- Bedarfsmanagement**
 - Ideen
 - Vorfälle
- Ressourcenmanagement**
 - Ressourcen
 - Ressourcenplanung
 - Ressourcensuche
 - Ressourcenanforderungen

Zusätzliche Auswertung direkt abrufen

The screenshot displays two overlapping web browser windows from the Clarity software. The background window, titled 'Clarity :: Budget Details', shows a table with columns for months from January 2010 to December 2010, and rows for 'For Actuals', '% Total', 'Units', 'Cost', 'Revenue', and 'Revenue for Actuals'. The foreground window, titled 'Clarity :: Write Off', is a modal dialog box. It contains a 'Write Off Filter' section and a table with the following columns: 'Kosten am Tag', 'Ist-Kosten am Tag', 'Tagessatz', 'Ist-Tagessatz', 'Write Off', and 'Ist-Write Off'. The table shows a single row of data with values: 2'069.17, 2'046.06, 2'187.61, 2'035.50, 5.41%, and -0.52%. Below the table, it says 'Total Results: 1'. The dialog box also includes a 'SOLUTION PROVIDERS' logo and a copyright notice 'Copyright © 2008 CA. All rights reserved.'.

Verschiedene Sichten direkt im Plan

Kostenplan - Details (Projekt: AM Barmer | Prognose: Migrated budget cost plan)

Eigenschaften **Detail**

Anzeigen: Selbst - Ansicht

Kostenplan - Detail - Filter

Filter: [--Auswählen--]

Anzuzeigende Daten: Alle

☒ Gruppieren/Unternach

☐ B_COS

☐ BU COS Eigenleistung kont. (inaktiv)

☐ B_CSD

Einheiten und Kosten
Einheiten und Umsatz
Kosten und Umsatz
Einheiten
Kosten
Umsatz

	Isteinheiten	Abweichung Einheiten	Plankosten	Istkosten	Abweichung Kosten	Planumsatz	Istumsatz	Abweichung Umsatz	
	0	0	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	Plan
									Istei
									Abw
									Plan
									Istko
									Abw
									Plan
									Istui
									Abw
	0	0	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	Plan
									Istei
									Abw
									Plan
									Istko
									Abw
									Plan
									Istui
									Abw
	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	Plan
									Istei
									Abw
									Plan
									Istko
									Abw
									Plan

Verschiedene Sichten direkt im Plan

Kostenplan - Details (Projekt: AM Barmer | Prognose: Migrated budget cost plan)

Eigenschaften **Detail**

Anzeigen: Selbst - Ansicht

Kostenplan - Detail - Filter

Filter: [--Auswählen--]

Anzuzeigende Daten: Alle **Vergleiche:** Alle Plan- und Ist-Werte **Plan und Abweichung** Nur Plan Ansicht aktualisieren

☐	Gruppieren/Untergruppieren nach	Planeinheiten	Isteinheiten	Plankosten	Istkosten	Abweichung Kosten	Planumsatz	Istumsatz	Abweichung Umsatz	
☐	B_COS	0	0	0 0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	Plan Ist Abw Plan Ist Abw Plan Ist Abw
☒	BU COS Eigenleistung kont. (inaktiv)	0	0	0 0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	Plan Ist Abw Plan Ist Abw Plan Ist Abw
☐	B_CSD	0	0	0 0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	Plan Ist Abw Plan Ist Abw Plan Ist

- Die beiden Standards im Vergleich
- Die praktische kleine Lösung

Hippenstocks Strategien



Die einfache Lösung

- Team anlegen und planen
- Status auf „Soft“
- Bedarf wird erkannt (Portlet)
- Genehmigen oder ändern

➤ Keine Workflowunterstützung

„So einfach geht es leider nicht immer“

Die komplexe Lösung

- Team anlegen und planen
- Anforderung anlegen
- Anforderungen übernehmen und bearbeiten
- Anforderung Ganz oder teilweise genehmigen

- Auch Workflow getrieben, Prozessschritte sind fest
- Zusätzliches Objekt

„So komplex und starr muss es auch nicht sein“

Miteinander reden müssen wir sowieso

Pflege der Zuweisungen in der OWB

Aufgabe	Ressource	Rolle	Skills	Gesamt	Ist	Rest												
Ressource	Personalnummer	Typ Personalressource	Abteilung				2009						2010					
							Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	J
Test Task	Willi Winzig10	Anwendungsentwickler	Oracle	0,00		0,00												
	Willi Winzig91995	Anwendungsentwickler	Mainframe	2,44		2,44			11,0	8,5								
Test Task 2	Willi Winzig10	Anwendungsentwickler	Oracle	0,00		0,00												
	Winzig1001, Willi	Projektmanager	Projektcontrolling	90,00		90,00	72,8	169	178	178	121							
	Willi Winzig91995	Anwendungsentwickler	SAP	0,00		0,00												
				92,44		92,44												
Administrator, Niku	999991337	Intern	/Postbank Systems															
Extern aktivierbar			/Postbank Systems															
Intern nicht aktivierbar																		
Extern nicht aktivierbar																		
Willi Winzig91995	9999991995	Extern	/Postbank Systems						11,0	8,5								
Willi Winzig1005	92131	Intern	/Postbank Systems															
Willi Winzig1002	92132	Intern	/Postbank Systems															
Willi Winzig10	99167	Intern	/Postbank Systems															
Winzig1001, Willi	999991001	Intern	/Postbank Systems/Anwendun				72,8	169	178	178	121							

Planung in das Team übernehmen

Projekt: Team: Mitarbeiter (Projekt: P1_langes_Projekt) [Registerkarten von Projekt verwalten]

Eigenschaften **Team** Aufgaben Finanzpläne Rückbelastungen Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Audit Dashboard

Mitarbeiter Detail Rollenkapazität Teilnehmer Teilnehmergruppen Anforderungen

Szenario [--Grundlegender Plan--] Neu Mehr>> Vergleich mit [--Grundlegender Plan--]

Projektteam [--Aktionen--]

Filter Systemstandardwert [Filter einblenden]

	Ressource	OE	Personal- typ	Details	Buchungs- status	Anforderungs- status	Planung	Zusage	Ist	Monatliche Zuordnung												Kommentar Peoplemanager		
										2010														
										Jan 10	Feb 10	Mrz 10	Apr 10	Mai 10	Jun 10	Jul 10	Aug 10	Sep 10	Okt 10	Nov 10	Dez 10			
☐	Extern aktivierbar				Gemischt	geplant	100,00	488,89	0,00	Planung Zusage	1,50 1,50	1,50 1,50	1,72 1,72	1,50 1,50	1,42 1,42	1,65 0,67	1,65	1,65	1,65	1,57	1,65	1,57		
☐	Extern nicht aktivierbar				Gemischt	geplant	1.264,90	1.384,00	0,00	Planung Zusage	31,81 1,50	31,81 1,50	36,59 1,72	31,81 1,50	30,22 1,42	34,99 0,67	34,99	34,99	30,18	13,19	13,82	13,19		
☐	Intern aktivierbar				Gemischt	geplant	100,00	488,80	0,00	Planung Zusage	1,50 1,50	1,50 1,50	1,72 1,72	1,50 1,50	1,42 1,42	1,65 0,67	1,65	1,65	1,65	1,57	1,65	1,57		
☐	Intern nicht aktivierbar				Gemischt	geplant	542,10	2.175,25	0,00	Planung Zusage	13,63 1,50	13,63 1,50	15,68 1,72	13,63 1,50	12,95 1,42	15,00 0,67	15,00	15,00	12,94	5,65	5,92	5,65		
☐	pema1, pema1		Intern		Gemischt	geplant	0,00	592,00	0,00	Planung Zusage				20,00	24,00									
Summe Planung							2.007,00				48,44	48,44	55,71	48,44	46,02	53,28	53,28	46,41	21,99	23,03	21,99			
Summe Zusage							5.128,95				2,99	2,99	3,44	22,99	26,84	1,35								
Abweichung							3.121,95				-45,45	-45,45	-52,26	-25,45	-19,18	-51,94								

Ergebnisse insgesamt: 5

Hinzufügen Nach OSP hinzufügen/aktualisieren Entfernen Mehr>>

Arbeitsaufwand = Tage

- ☒ Zuordnung verschieben
- ☒ Zuordnung festlegen
- ☒ Zuweisungsrollen
- ☒ Nach Schätzwerten zuordnen
- ☒ Anforderungen erstellen
- ☒ Feste Zuordnung akzeptieren
- ☒ Zuordnung nach Plan autorisieren

Ressource anfordern

Projekt: Team: Mitarbeiter

(Projekt: P1_langes_Projekt)

[Registerkarten von Projekt verwalten]

Eigenschaften

Team

Aufgaben

Finanzpläne

Rückbelastungen

Hierarchie

Risiken/Probleme/Änderungen

Zusammenarbeit

Prozesse

Audit

Dashboard

Mitarbeiter

Detail

Rollenkapazität

Teilnehmer

Teilnehmergruppen

Anforderungen

Szenario

[--Grundlegender Plan--]

Neu

Mehr>>

Vergleich mit

[--Grundlegender Plan--]

Projektteam

[--Aktionen--]

Filter Systemstandardwert

[Filter einblenden]

☐	Ressource	OE	Personal- typ	Details	Buchungs- status	Anforderungs- status	Planung	Zusage	Ist	Monatliche Zuordnung												Kommentar Peoplemanager		
										2010														
										Jan 10	Feb 10	Mrz 10	Apr 10	Mai 10	Jun 10	Jul 10	Aug 10	Sep 10	Okt 10	Nov 10	Dez 10			
☐	Extern aktivierbar				Gemischt	angepasst zugesagt	100,00	488,89	0,00	Planung Zusage	1,50 1,50	1,50 1,50	1,72 1,72	1,50 1,42	1,65 0,67	1,65	1,65	1,65	1,65	1,57	1,65	1,57		
☐	Extern nicht aktivierbar				Vorgemerkt	angefordert	1.264,90	1.384,00	0,00	Planung Zusage	31,81 31,81	31,81 31,81	36,59 31,81	30,22 31,81	34,99 34,99	34,99	34,99	30,18	13,19	13,82	13,19			
☐	Intern aktivierbar				Gemischt	angefordert	100,00	488,80	0,00	Planung Zusage	1,50 1,50	1,50 1,50	1,72 1,72	1,50 1,42	1,65 0,67	1,65	1,65	1,65	1,65	1,57	1,65	1,57		
☐	Intern nicht aktivierbar				Vorgemerkt	angefordert	542,10	2.175,25	0,00	Planung Zusage	13,63 13,63	13,63 13,63	15,68 13,63	12,95 13,63	15,00 15,00	15,00	15,00	12,94	5,65	5,92	5,65			
☐	pema1, pema1		Intern		Vorgemerkt	geplant	0,00	592,00	0,00	Planung Zusage			20,00	24,00										
Summe Planung							2.007,00				48,44	48,44	55,71	48,44	46,02	53,28	53,28	53,28	46,41	21,99	23,03	21,99		
Summe Zusage							5.128,95				2,99	2,99	3,44	22,99	26,84	1,35								
Abweichung							3.121,95				-45,45	-45,45	-52,26	-25,45	-19,18	-51,94								

Ergebnisse insgesamt: 5

Speichern

Hinzufügen

Nach OSP hinzufügen/aktualisieren

✓ Entfernen

Mehr>>

Arbeitsaufwand = Tage

☒ = Erforderlich

E-Mail und Übersichts-Portlet zu den betroffenen Projekten

Projekte mit zu genehmigenden Anforderungen

Filter: [--Auswählen--]

Filter ausblenden

[-Aktionen-]

Name Projekt:  

Manager:  

Status: 

Ressourcenrunde: 

Betroffen: 

Filter:

Name Projekt ▲	Manager	Status	Ressourcenrunde	Betroffen
P1_langes_Projekt		angelegt		

Ergebnisse insgesamt: 1

Genehmigung, Änderung und Überlast

Projekt: Team: Detail (Projekt: P1_langes_Projekt) [Registerkarten von Projekt verwalten]

Eigenschaften **Team** Aufgaben Finanzpläne Rückbelastungen Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Audit Dashboard

Mitarbeiter : Detail : Rollenkapazität : Teilnehmer : Teilnehmergruppen : Anforderungen

Szenario [--Grundlegender Plan--] Neu Mehr>> Vergleich mit [--Grundlegender Plan--]

Projektteam [Aktionen--]

Filter Systemstandardwert [Filter einblenden]

	Ressource	OE	Personal- typ	Details	Buchungs- status	Anforderungs- status	Planung	Zusage	Ist		Monatliche Zuordnung												Kommentar Peoplemanager
											2010												
											Jan 10	Feb 10	Mrz 10	Apr 10	Mai 10	Jun 10	Jul 10	Aug 10	Sep 10	Okt 10	Nov 10	Dez 10	
☐	Extern aktivierbar				Gemischt	angepasst zugesagt	100,00	488,89	0,00	Planung Zusage Sonstige Zusage Verfügbarkeit	1,50 1,50	1,50 1,50	1,72 1,72	1,50 1,50	1,42 1,42	1,65 0,67	1,65	1,65	1,65	1,57	1,65	1,57	
☒	Extern nicht aktivierbar				Vorgemerkt	angefordert	1.264,91		0,00	Planung Zusage Sonstige Zusage Verfügbarkeit	31,81	31,81	36,59	31,81	30,22	35,00	35,00	35,00	30,18	13,19	13,82	13,19	
☐	Intern aktivierbar				Gemischt	angepasst zugesagt	100,00	488,80	0,00	Planung Zusage Sonstige Zusage Verfügbarkeit	1,50 1,50	1,50 1,50	1,72 1,72	1,50 1,50	1,42 1,42	1,65 0,67	1,65	1,65	1,65	1,57	1,65	1,57	
☐	Intern nicht aktivierbar				Vorgemerkt	geplant	542,10		0,00	Planung Zusage Sonstige Zusage Verfügbarkeit	13,63	13,63	15,68	13,63	12,95	15,00	15,00	15,00	12,94	5,65	5,92	5,65	
☐	pema1, pema1		Intern		Gemischt	angepasst zugesagt	0,00	592,00	0,00	Planung Zusage Sonstige Zusage Verfügbarkeit				20,00	24,00								
Summe Planung							2.007,01				48,44	48,44	55,71	48,44	46,02	53,28	53,28	53,28	46,41	21,98	23,03	21,98	
Summe Zusage							1.569,70				2,99	2,99	3,44	22,99	26,84	1,35							
Differenz							-437,31				-45,45	-45,45	-52,27	-25,45	-19,18	-51,94							

Ergebnisse insgesamt: 5

Hinzufügen Nach OSP hinzufügen/aktualisieren ✓ Entfernen Mehr>>

Arbeitsaufwand = Tage

- ✓ Zuordnung verschieben
- ✓ Zuordnung festlegen
- ✓ Zuweisungsrollen
- ✓ Nach Schätzwerten zuordnen
- ✓ Anforderungen erstellen
- ✓ Feste Zuordnung akzeptieren
- ✓ Zuordnung nach Plan autorisieren

Detailanzeige je Ressource per Klick auf den Status

Überlastungswarnungen pro Monat

Überlastungswarnungen

Überlastungswarnungen pro Ressource

[--Aktionen--]

Monat	Zusage [PT]	Verfügbarkeit [PT]	Überlastung	Überlastungsschwelle [PT]
03-2009	32	21	149%	25
04-2009	32	21	149%	25
05-2009	30	20	149%	24
06-2009	32	21	149%	25
07-2009	33	22	149%	27

Ergebnisse insgesamt: 5

Angepasste Aktionen in einer Anforderung

Persönlich

Allgemein
OE Leiter
Organizer
Zeitformulare
Berichte und Aufträge
Benutzereinstellungen

Organisation

Abteilungen
Wissensbank

IT-Dienstverwaltung

Dienste

[de: OMB Submissions]

[de: Exhibit 53 (2007)]
[de: Exhibit 300 (2007)]

Anforderungen erstellen (Projekt: Test-Projekt Ressourcenanforderung)

Anforderungstyp auswählen

Anforderung - Typ ☒ Buchung aktualisieren (ersetze feste Zuordnung durch Plan)
☐ Rollen anfordern (falls noch keine festen Zuordnungen vorhanden sind, werden diese erzeugt. Falls der Buchungsmanager eine bereits vorhandene Ressource vorschlägt, wird die angeforderte Kapazität der festen Zuordnung hinzugefügt)
☐ Ressourcenbuchung aufheben (Spezialmodus, wird selten verwendet. Die feste Zuordnung wird verringert, wenn der Plan geringer ist)

Ressourcen

Ressource	* Buchungsmanager
Aatz, Nikolaus-Christopher	Administrator, Niku ▼

Erstellen Erstellen und öffnen Abbrechen

***** = Erforderlich

Project Ranking – nicht nach Sympathie

- Wie weit komme ich mit meinen Ressourcen?
- Wie komme ich zu einer Bewertung?

CA Clarity™ PPM



Die Projekt und die Ressourcensituation auf einen Blick

Allgemein Geldgeber Portfolio... Portfolio... Programm-D... PM-Warnung... Projekt-Da... Terminplan Probleme u... DEMO Project ranking Thomas' Ta...																		
Priority allocation for roles in period [--Aktionen--]																		
Filter [--Auswählen--] [Filter ausblenden]																		
Start 1/1/2009																		
Finish 12/31/2009																		
Filter Alle anzeigen Filter speichern Leeren																		
							Architect				Business Analyst				Consultant			
Order of Ranking	Project No.	Project Name	Required Resources	Missing Resources	Feasibility %	Feasibility	Required Resources	Missing Resources	% of required Resources	Utilised	Required Resources	Missing Resources	% of required Resources	Utilised	Required Resources	Missing Resources	% of required Resources	Utilised
1	PR1016	ATM Security Enhancements	103	0	100%	◆	11	0	100%	◆	26	0	100%	◆	66	0	100%	◆
2	PR1018	Compliance Audit - Security	26	-22	15%	◆	0	0	100%	◆	0	0	100%	◆	26	-22	15%	◆
3	PR1024	Change Mgt for Internal Portal	1,486	-1,225	17%	◆	42	0	100%	◆	1,401	-1,182	15%	◆	43	-43	0%	◆
4	PR1026	Change Mgt for Online Banking	1,242	-1,085	12%	◆	1,200	-1,043	13%	◆	21	-21	0%	◆	21	-21	0%	◆

Das Scoring am Projekt

Projekt: Eigenschaften: Stammdaten - Allgemein (Projekt: ATM Security Enhancements) [Registerkarten von Projekt verwalten]

Eigenschaften Team Vorgänge Finanzpläne Rückbelastungen Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Prüfung Dashboard

Stammdaten Unterprojekte Abhängigkeiten Basisplan Verknüpfte Freigaben

[de - Open+In+Open+Workbench] Lese-/Schreibzugriff OK [--Aktionen--]

Szenario [--Grundlegender Plan--] Neu Mehr>> Vergleich mit [--Grundlegender Plan--]

Speichern Übernehmen Abbrechen [Zu meinen Projekten hinzufügen][Aus Vorlage kopieren]

Allgemein

Projektname	ATM Security Enhancements	Status	Nicht genehmigt
Projekt-ID	PR1016	Genehmigt von	[--Auswählen--]
Typ	Major Project	Genehmigt am	
Kategorie	New Development	Phase	Initiation
Aktiv	☒ (Aktiv)		
Projekttyp RSC	eigene Innovation		
Partition	IT		

Total Score for Project Ranking

RSC Total Scoring	210	Final Prio	100.00
		Bemerkung zur Final Prio	war zu viel des Guten, da haben die Kollegen übertrieben

Project Ranking

Das Scoring im Detail

Projekt: Eigenschaften: Stammdaten - RSC Criterias and Score (Projekt: ATM Security Enhancements) [Registerkarten von Projekt verwalten]

Eigenschaften Team Vorgänge Finanzpläne Rückbelastungen Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Prüfung Dashboard

Stammdaten Unterprojekte Abhängigkeiten Basisplan Verknüpfte Freigaben

[de - Open+in+Open+Workbench] Lese-/Schreibzugriff OK [--Aktionen--]

Szenario [--Grundlegender Plan--] Neu Mehr>> Vergleich mit [--Grundlegender Plan--]

Speichern Übernehmen Abbrechen

Total

RSC Total Scoring 210

Business Strategy

RSC Business Strategy fit Low RSC Business Urgency Medium

RSC Business Criticality Medium

Interdependencies

RSC Inderdependencies sequential High RSC Change Management Medium

RSC Inderdependencies overlapping Medium RSC Skill Level of Resources Medium

RSC Inderdependencies competing High

Risk External

RSC Legal/statutory requirements Medium RSC Vender maturity and size Medium

RSC Lost opportunities Medium RSC New Technology Medium

Risk Internal

RSC Resource Availability Medium RSC Business Process Impact Medium

Speichern Übernehmen Abbrechen

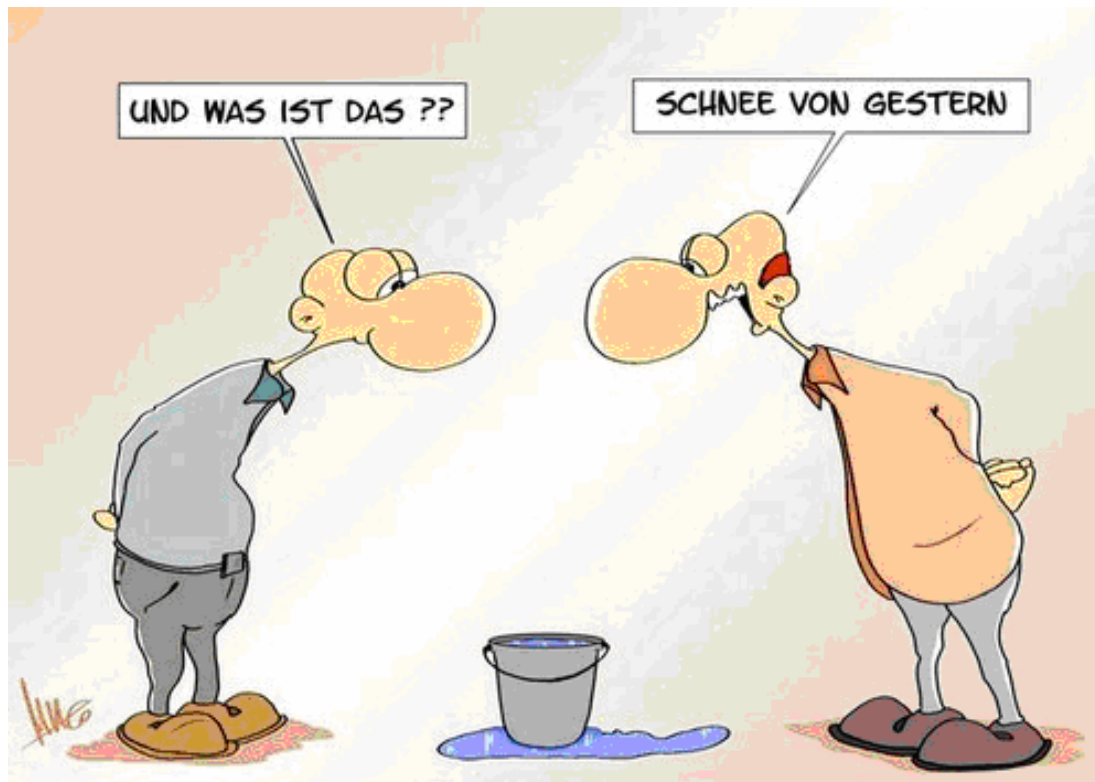
Eigenschaften

- Allgemein
- Terminplan
- Risiko
- Status Report Liste
- Budget
- Finanzen
- RSC Criterias and Score
- Schätzung
- Auftrag
- Zugriff auf dieses Projekt
 - Gesamtansicht
 - Ressource
 - Gruppe
 - OSP-Einheit

Raum für Ihre Fragen

itdesign

Ich hoffe das war es nicht!



Jörg Schäfer

(joerg.schaefer@itdesign.de)

itdesign GmbH
Karlstrasse 3
72072 Tübingen

www.itdesign.de
