

Clarity DACH – Flughafen München



Matthias Graf
12.05.2015



Agenda

1. Flughafen München - Company Profile
2. Projektmanagement
3. Clarity

Flughafen München Munich at a Glance



Introduction to Munich Airport

Location: 40 km Out of City Center




Flughafen München GmbH (FMG) Company Presentation

Flughafen München GmbH is the operating company of Munich Airport. FMG is a full service operator, all airport business are managed by FMG without the need for external services.



Shareholder Structure

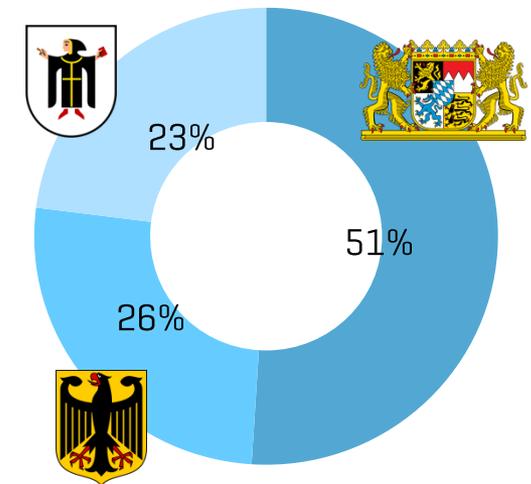

- The Free State of Bavaria
- Federal Republic of Germany
- City of Munich

Introduction to Munich Airport

Munich at a Glance

Financials 2014

- Total turnover: 1,200 million €
- Aviation: 51% - Non-Aviation: 49%
- EAT: 100 million €

Traffic 2014


- 39.7 million passengers
- 309,361 tons of freight
- 376,678 ATM

Infrastructure

- 2 Passenger Terminals with a total of 510,000 m²
- Cargo terminal and Aircraft Maintenance Area
- 2 parallel & independent runways

Commercial Activities, Advertising and Events

- 154 shops and 48 restaurants; 4 Conference Centers
- Two hotels (5* Hilton and 3* Novotel)
- Extraordinary events (Surfing, Airport Polo, Christmas market, company presentations)



Introduction to Munich Airport Non-Aviation Business and Commercial Activities

Events are a main part of Munich Airport's marketing strategy

- Unique event area [10.000 sqm] in the heart of the airport
- Ensuring awareness, creating fascination & attraction of spectators
- Expenses are refinanced with event revenues [food & beverage, cross-marketing with on-site tenants etc.] & sponsoring
- Events attract advertising partners
- Opening of airport to surrounding region



Introduction to Munich Airport Non-Aviation Business and Commercial Activities

Key factors for successful events are:

- Exceptional and unexpected ideas in an appropriate location – large-sized installations
- Marketing communication & PR-Budget / often in cooperation with media partners
- Free parking for every participant/visitor



Introduction to Munich Airport

The Award-Winning Airport

3x



era Airport Achievement Award

1st place: 2002, 2005/2006, 2007/2008

1x



German Project Excellence Award 2009

1st place: 2009
Finalist: 2014

3x



Vision Award - League of American Communications Professionals

1st place: 2014
2nd place: 2012, 2013

2x



**Europe's Best Cargo Airport:
100,000-400,000 tons**

1st place: 2014, 2015 (together with Zurich Airport)



**Europe's first 5 Star Airport
One of the five 5 Star Airports worldwide**

Introduction to Munich Airport Expansion Plan: The new Terminal 2 Passenger Satellite

1st phase of construction
Extending the GSH



2nd phase of construction
Pier East incl. baggage sorting system



Data

Satellite 1st phase

Satellite 2nd phase

In comparison: Terminal 2

Capacity

11 million Passengers

17 million passengers

25 million Passengers
[incl. 12 mil. remote passengers]

Contact positions

27 NB [max. 11 WB]

43 NB [max. 21 WB]

24 NB

Projektmanagement

MapIT Prozess im Detail




Schnittstellen



Clarity - Zusammenspiel mit SAP



- Zeiterfassung erfolgt in SAP-CATS
- Die erfassten Stunden werden mit EUR bewertet
- Die Kosten [EUR] werden nach Clarity übertragen



Zeiterfassung



Rechnungen



LIVE DEMO

Das Clarity Frühlings-Release
 Es ist so weit: Wir haben seit der Migration auf Clarity V13 unzählige Neuerungen und Anregungen aus Ihrer täglichen Projektarbeit umgesetzt und freuen uns, Ihnen das neue Frühlings-Release von Clarity vorstellen zu dürfen. Bei diesem Release stehen vor allem das Cockpit mit den relevanten Projektinformationen sowie eine bessere Bedienbarkeit der Tool-Funktionen im Vordergrund. Mit diesem Flyer möchten wir Sie durch die wichtigsten Neuerungen führen, Ihnen einen ersten Eindruck der Verbesserungen geben – und auch ein bisschen Appetit auf mehr Projektmanagement mit Clarity machen.

Neuigkeiten im Projekt-Cockpit
 Wesentliche Änderungen finden Sie vor allem im Projekt-Cockpit. Diese Sicht zeigt Ihnen auf einen Blick zentrale Informationen zu Ihrem Projekt. Hier werden weitere Informationen aufbereitet und zur Verfügung gestellt.

Projektplanung von Anfang an
 Die Open Workbench als Projektplanungstool von Clarity können Sie zukünftig direkt über das Projekt-Cockpit aufrufen. Somit kommen Sie ohne Umwege zur Open Workbench und können direkt in Ihre Projektplanung einsteigen.

Der Projektüberblick
 Der Projektüberblick im Cockpit enthält die wichtigsten Eckwerte Ihres Projekts. In der neuen Version von Clarity werden die Kosten noch detaillierter anhand des Ist- und Übbligo-Betrags dargestellt. Außerdem können Sie in einem neuen Feld wichtige Informationen vom PMO für den Projektleiter einsehen.

Kosten (Gesamt)	123.500,-	↳ 48.450,000 + Übbligo 75.050,-
Ist (EUR)	248.300	
Übbligo (EUR)	228.500	
Aktuelles Stand	2014-05-27 09:00	

Herzlich willkommen zum neuen Clarity Version 13
 Wir freuen uns, Ihnen das neueste Release von Clarity zu präsentieren. Die neue Version enthält viele Neuerungen, ein verbessertes Bedienkonzept und viele Ihrer Anregungen aus der täglichen Arbeit mit MMAPT. Beachtete Vorteile wie die gemeinsame Datenbasis, das zentrale Berichtswesen und revisionssichere Abläufe bleiben weiterhin bestehen. Die folgenden Seiten geben einen kleinen Überblick der wichtigsten Neuerungen. Sie sollen Ihnen den ersten Einstieg in die neue Version erleichtern und Lust auf ein weiteres Eintauchen in das neue Clarity machen. Viel Spaß dabei während Ihnen ihr IT Projektservice.

Die neue Startseite
 Als Erstes werden Sie mit der neuen Startseite begrüßt. Von hier aus können Sie mit einem Klick Ihre Projekte öffnen, einen neuen Projektantrag starten oder sich über wichtige Termine und Neuigkeiten aus dem Projektmanagement-Umfeld informieren.

Das Projekt-Cockpit
 Das Projekt-Cockpit erlaubt Ihnen einen ersten Überblick über Ihr Projekt und einen optimalen Einstieg in die weitere Projektarbeit. Die Phasengrafik zeigt die aktuelle Phase und erlaubt den Schnellzugriff auf alle relevanten Projektinhalte. Der Projektüberblick enthält die wichtigsten Projektparameter und die Projektfraktionen zeigen den Kostenverlauf des Projekts.

Neues Design und Benutzerführung
 Am auffälligsten ist das komplett überarbeitete Erscheinungsbild von Clarity, das auch bereits auf dem neuen Markenauftritt der FMG zugeschnitten ist. Dadurch verbürgt sich eine konsequente, modernisierte Benutzerführung. So ermöglicht der direkte Editiermodus die Dateneingabe direkt in Listenzellen, die Favoriten erlauben den schnellen Zugriff auf die meistgenutzten Inhalte und Eingabefelder werden per Autofill komplementiert.



Übersicht Anpassungen

- Allgemein
 - Logo auf der Logon-Seite
 - Stündlicher Wechsel der Farben
 - Portlet Projektantrag
- Projekt
 - Cockpit Startseite
 - OWB von Cockpit aus zu öffnen
 - Prozessportlet
 - Übersichtsportlet [Projekteckwerte]
 - Überblick Planung [Gantt]
 - Baselines
 - Statusberichte [Ablage im DMS]

Logo auf der Logon-Seite

M CA Clarity™ PPM
Verbindung leben

Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Anmeldung

Copyright © 2013 CA. Alle Rechte vorbehalten

Farbwechseln stündlich (1)

MapIT Clarity FMG IT Projektservice Abmelden Hilfe Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Allgemein Allocation Editor (ALE): Anfragen/Zusagen IT Projektübersicht Assignment Editor (ASE): Zuweisungen ACT2CO Project Helpers System Helpers Daily Check 1 >

Übersicht: Allgemein

Eigene Projekte

Projektcode	Projekt
CA03-15-001	Clarity4FMG
CA02-14-001	Pilot Ressourcenmanagement IT

1 - 2 von 2 angezeigt

[Neu](#) [Neu aus Vorlage](#)

Projektantrag

Sie möchten ein neues IT-Projekt starten? Hier können Sie einen neuen Projektantrag erstellen und beim IT-Steuerungskreis zur Genehmigung einreichen.

[Neuer Projektantrag](#)

Projektliste

[Filter: Systemstandardwert]

Projektname	<input type="text"/>	Projektleiter	<input type="text"/>
Projekt-ID	<input type="text"/>	Stellvertreter	<input type="text"/>
Projektphase	Alle	Bearbeitungsstatus	Alle
Methode	MapIT	Verfügbar	Ja
Kategorie	Alle	Power-Filter	[Power-Filter erstellen]

[Filter](#) [Alle anzeigen](#) [Filter speichern](#) [Leeren](#)

Aktuelle Ankündigungen

Wichtige Termine

Fertigstellung Statusberichte bis zum 11.05.2015 17:00 Uhr	IT-Projektstatus: 13.05.2015
Fertigstellung Statusberichte bis zum 12.06.2015 08:00 Uhr	IT-Projektstatus: 15.06.2015

MapIT wird acht Jahre alt



MapIT

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Liebe Kollegen,

heute, am 5.3.2015, wurde MapIT **acht** Jahre alt. Acht Jahre, in denen wir gemeinsam das Thema Projektmanagement einheitlich bei der FMG IT zum Leben erweckt und schließlich zu einer Erfolgsgeschichte gemacht haben.

In diesem Sinne hat heute auch das Engagement und die Arbeit, die jeder von Euch/Innen in dieses „Projekt“ gesteckt hat, Geburtstag! Auch dazu einen herzlichen Glückwunsch.

Wir hoffen auf noch viele weitere, erfolgreiche Jahre, in denen wir alle zusammen bei der FMG IT Projekte gestalten und leben.

Ein herzlicher Gruß an alle und weiterhin viel Erfolg wünscht das IT-PMO-Team

Farbwechseln stündlich (2)

MapIT Clarity

FMG IT Projektservice Abmelden Hilfe Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Allgemein Allocation Editor (ALE): Anfragen/Zusagen IT Projektübersicht Assignment Editor (ASE): Zuweisungen ACT2CO Project Helpers System Helpers Daily Check

Übersicht: Allgemein

Eigene Projekte

Projektcode	Projekt
CA03-15-001	Clarity4FMG
CA02-14-001	Pilot Ressourcenmanagement IT

1 - 2 von 2 angezeigt

Neu Neu aus Vorlage

Projektantrag

Sie möchten ein neues IT-Projekt starten? Hier können Sie einen neuen Projektantrag erstellen und beim IT-Steuerungskreis zur Genehmigung einreichen.

Neuer Projektantrag

Projektliste

[Filter: Systemstandardwert]

Projektname	<input type="text"/>	Projektleiter	<input type="text"/>
Projekt-ID	<input type="text"/>	Stellvertreter	<input type="text"/>
Projektphase	Alle	Bearbeitungsstatus	Alle
Methode	MapIT	Verfügbar	Ja
Kategorie	Alle	Power-Filter	[Power-Filter erstellen]

Filter Alle anzeigen Filter speichern Leeren

Aktuelle Ankündigungen

Wichtige Termine

Fertigstellung Statusberichte bis zum 11.05.2015 17:00 Uhr	IT-Projektstatus: 13.05.2015
Fertigstellung Statusberichte bis zum 12.06.2015 08:00 Uhr	IT-Projektstatus: 15.06.2015

MapIT wird acht Jahre alt



MapIT

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Liebe Kollegen,


heute, am 5.3.2015, wurde MapIT **acht** Jahre alt. Acht Jahre, in denen wir gemeinsam das Thema Projektmanagement einheitlich bei der FMG IT zum Leben erweckt und schließlich zu einer Erfolgsgeschichte gemacht haben.

In diesem Sinne hat heute auch das Engagement und die Arbeit, die jeder von Euch/Ihnen in dieses „Projekt“ gesteckt hat, Geburtstag! Auch dazu einen herzlichen Glückwunsch.

Wir hoffen auf noch viele weitere, erfolgreiche Jahre, in denen wir alle zusammen bei der FMG IT Projekte gestalten und leben.

Ein herzlicher Gruß an alle und weiterhin viel Erfolg wünscht das IT-PMO-Team

Projektcockpit

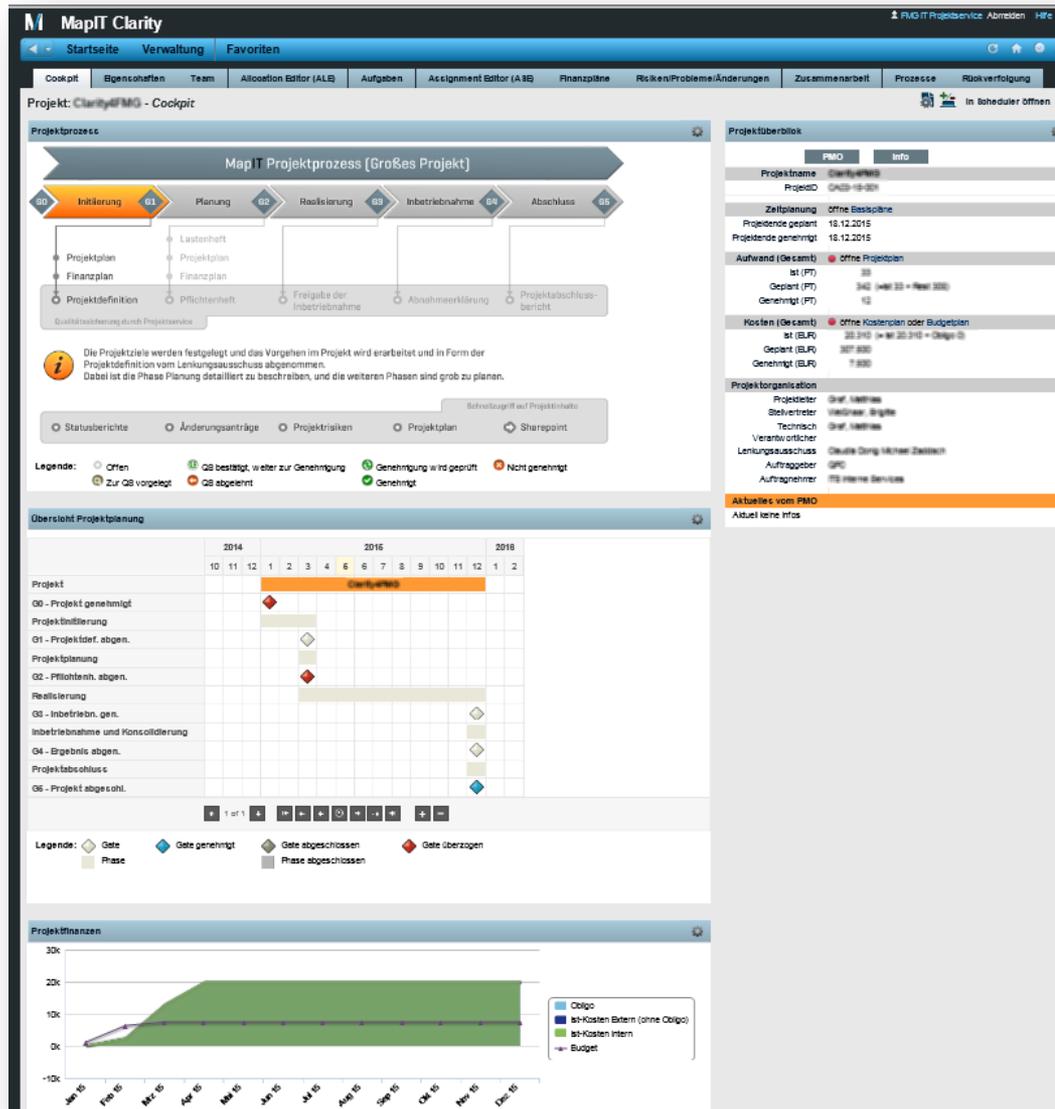

Interaktive Prozessgrafik (1)



Interaktive Prozezzgrafik [2]



Projektüberblick (1)

Projektüberblick ⚙️

PMO
Info

Projektname	FlughafenMUC
ProjektID	0000150001
Zeitplanung	öffne Basispläne
Projektende geplant	18.12.2015
Projektende genehmigt	18.12.2015
Aufwand (Gesamt)	● öffne Projektplan
Ist (PT)	0
Geplant (PT)	100 (= 100 + Rest 0)
Genehmigt (PT)	0
Kosten (Gesamt)	● öffne Kostenplan oder Budgetplan
Ist (EUR)	0 (= Ist 0 + Obligo 0)
Geplant (EUR)	100.000
Genehmigt (EUR)	0
Projektorganisation	
Projektleiter	Graf, Matthias
Stellvertreter	Weißhaar, Brigitte
Technisch Verantwortlicher	Graf, Matthias
Lenkungsausschuss	Claudia Donig Michael Zaddach
Auftraggeber	QPC
Auftragnehmer	ITS Interne Services
Aktuelles vom PMO	
Aktuell keine Infos	

PMO
Info

2015-04-01 SMA: G3 ist zum 16.09.2015 geplant/gen.; interne Aufwände sind mit knapp 422.000€ geplant, ausgeschöpft sind bis jetzt gut 66.000€.

2015-03-04 SMA: Ph mit finaler Planung, IT-Gov-CI sowie Testkonzept gen.; AA ok, Budgetplan und Baseline entsprechend genehmigt; Projekt in nächste Phase "Realisierung" gestellt. G3 16.9.15

2015-02-25 SMA: Lh wurde bereits am 03.02.2015 freigegeben; der fachliche Teil des Ph wurde am 17.02.2015 zur Vorabprüfung vorgelegt, da der fachliche Teil dem LA zur Information vor der LA-Sitzung am 04.03.2015 zur Verfügung gestellt werden soll; nach der LA-Sitzung werden alle Ph-Dokumente final zur QS vorgelegt und dann an den LA zur Genehmigung versandt.

2015-01-27 IT-ITS: LH+PH werden parallel erstellt

2014-11-17 SMA: Pdef gen.; AA gen., entsprechend Basis- und Budgetplan gen (G2 zum 28.02.2015); Projekt in nächste Phase "Planung" geleitet; WWL Anfang Januar (Freigabe Lastenheft nachfragen, ist zur Zeit nicht explizit geplant)

Projektüberblick (2)

Projektüberblick 

PMO Info

Projektname Öffne Projektplan

ProjektID 0403-15-001

Zeitplanung öffne Basispläne

Projektende geplant 18.12.2015

Projektende genehmigt 18.12.2015

Aufwand (Gesamt) öffne Projektplan

Ist (PT) 33

Geplant (PT) 332 (= 332 - 0 + 0)

Genehmigt (PT) 33

Kosten (Gesamt) öffne Kostenplan oder Budgetplan

Ist (EUR) 28.336 (= Ist 28.336 + Obligo 0)

Geplant (EUR) 287.336

Genehmigt (EUR) 7.336

Projektorganisation

Projektleiter Graf, Matthias

Stellvertreter Weißhaar, Brigitte

Technisch Graf, Matthias

Verantwortlicher

Lenkungsausschuss Claudia Donig Michael Zaddach

Auftraggeber QPC

Auftragnehmer ITS Interne Services

Aktuelles vom PMO

Aktuell keine Infos

PMO Info

PMO-Seite y4FMG

Aufträge 0403-15-001

PSP-Elemente Basisspläne

Zugriff auf dieses Projekt

Projektantrag

 33

Aufwand  **Detail**

Hier können Sie in SAP die **Ist-Kosten** im Detail einsehen.
(Sie benötigen einen SAP-Portal-Zugang.)

Projektüberblick (Absprung nach SAP)

Projektauswertung IT


CO2CLA - Einzelpostenauswertung

Menü

Auswertung

Jahr	Per.	Projekt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Transaktionsklasse	Betrag	Belegnummer	Auf...	Lief...	Li...	Buchungstext	Bestellu	
2015	3	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		180,00	88401702						
2015	3	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		204,00	88401702						
2015	3	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		204,00	88401702						
2015	3	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		180,00	88401480						
2015	3	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		216,00	88401470						
2015	3	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		180,00	88401470						
2015	3	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		78,00	88400824						
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		370,00	88400820				Probleme mit Visio Viewer 2010 Deinstall		
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		370,00	88400820				Probleme mit Visio Viewer 2010 Deinstall		
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		408,00	88400820				Probleme mit Visio Viewer 2010 Deinstall		
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		90,00	88400810				Umstellung Baetke, Horn, Tubb, Stömmner		
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		408,00	88400820				Probleme mit Visio Viewer 2010 Deinstall		
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		78,00	88400810						
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00025	Client Test		180,00	88400820						
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00026	Kompatibilität zu Exchange		37,00	88402280				Ressourcenmailboxen für Testräume		
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00027	Rollout vorbereiten		117,00	88400820				Test Serien E-Mail Rollout		
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00027	Rollout vorbereiten		78,00	88400824						
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00027	Rollout vorbereiten		90,00	88401470				Benachrichtigung der User-Abklärung		
2015	4	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00027	Rollout vorbereiten		90,00	88402280				Abklärung Forstmaier wegen Mails		
2015	5	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00027	Rollout vorbereiten		117,00	88400820				Termin Test Postfach 2013, Doku Spicker		
2015	5	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00027	Rollout vorbereiten		90,00	88400824				u.a. Termin Forstmaier		
2015	5	ZIT/BK03-14-001	Einführung Office 201	ZIT/BK03-14-001/03/00027	Rollout vorbereiten		90,00	88400824				Abklärung wegen Benachrichtigung		
INT														
								77.880,00						
								78.148,00						

Aggregierte Darstellung der Projektplanung

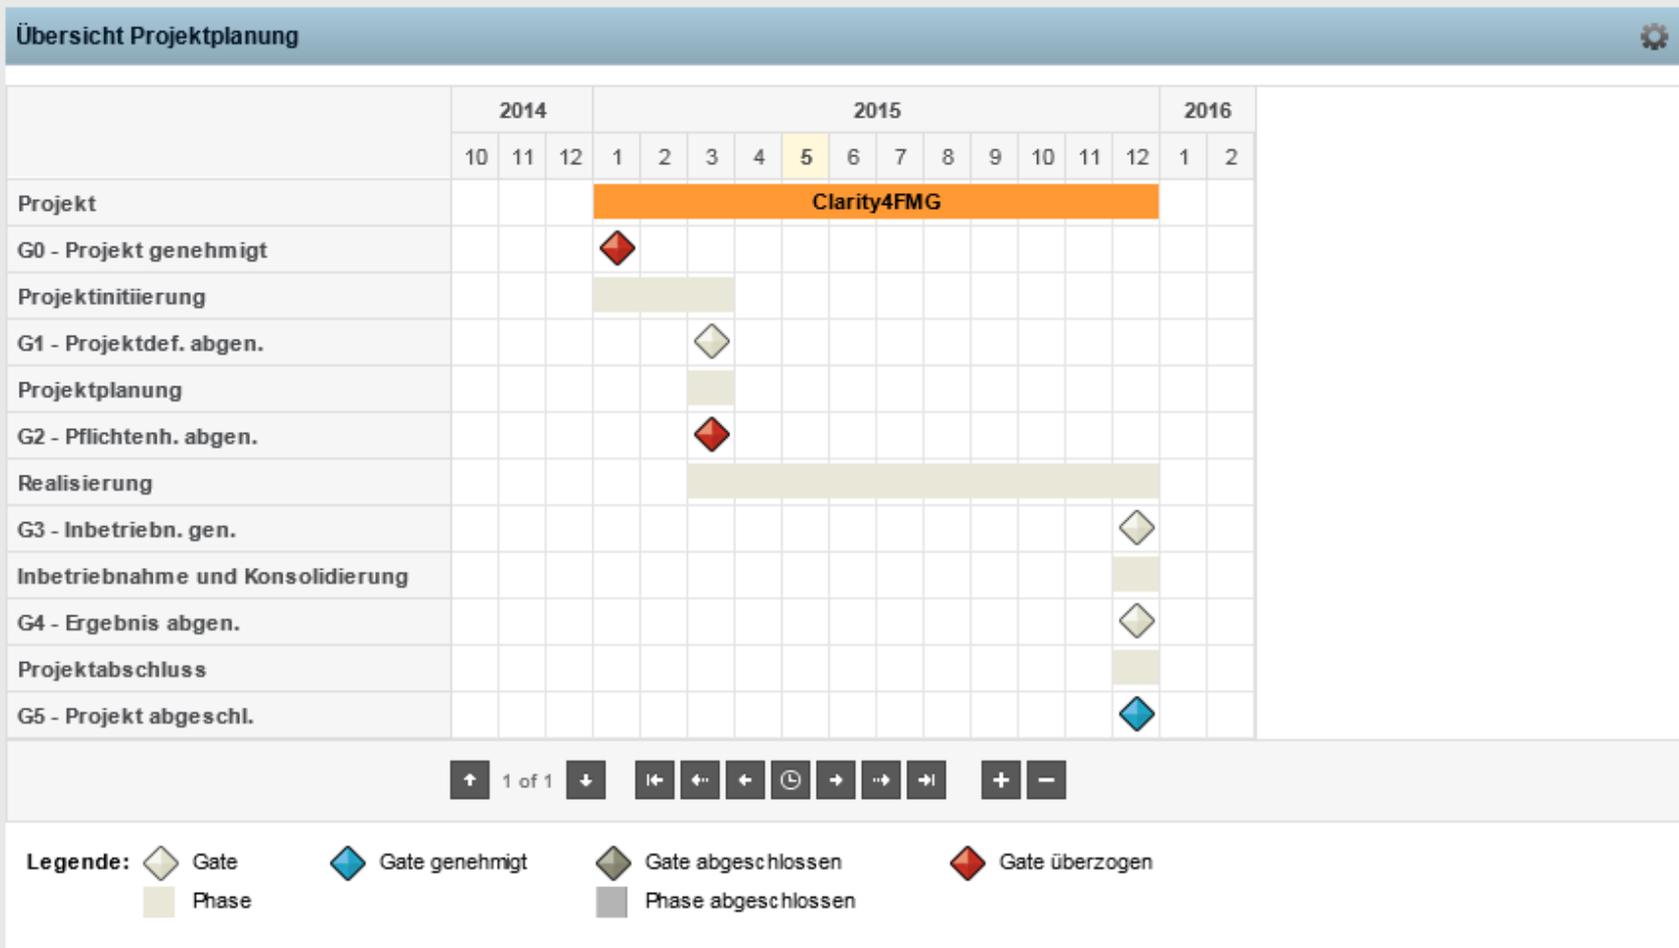

Baselines

Projekt: **Einführung iPPM 2015 - Eigenschaften - Basisplan**



In Scheduler öffnen

Aktionen

Filter: Kein(e)



<input type="checkbox"/>	Aktueller Basisplan	Aktuell Genehmigt	Baseline Status	Basisplan Name ▲	Anfang	Ende	Erstellt von	Erstellungs - datum	Aktualisiert am	Aktualisiert von	Aufwand [PT]
<input type="checkbox"/>			◆ genehmigt	1. Basisplan nach Genehmigung durch IT-SK am 16.09.2014	16.09.14	05.11.14	Projektservice, FMG IT	18.09.14	18.09.14	Projektservice, FMG IT	32
<input type="checkbox"/>			◆ PL-eigen	1. Basisplan nach Genehmigung durch IT-SK am 16.09.2014	16.09.14	02.03.15	Projektservice, FMG IT	18.09.14	22.09.14	Projektservice, FMG IT	128
<input type="checkbox"/>			◆ PL-eigen	2. Basisplan G2	16.09.14	28.02.15	Projektservice, FMG IT	06.11.14	09.05.15	Projektservice, FMG IT	132
<input type="checkbox"/>			◆ genehmigt	2. Basisplan G2	16.09.14	28.02.15	Projektservice, FMG IT	17.11.14	09.05.15	Projektservice, FMG IT	132
<input type="checkbox"/>		🚩	◆ genehmigt	3. Basisplan Planung 20150304	16.09.14	15.01.16	Projektservice, FMG IT	04.03.15	09.05.15	Projektservice, FMG IT	699
<input type="checkbox"/>	✓		◆ PL-eigen	3. Basisplan Planung 20150304	16.09.14	15.01.16	Projektservice, FMG IT	04.03.15	09.05.15	Projektservice, FMG IT	699

1 - 6 von 6 angezeigt

Speichern

Neu

🗑️ Löschen

Aktueller Basisplan vorlegen

Websiteaktionen Seite

M Clarity4FMG **Homepage**
Erweiterung des bestehenden Projektmanagement Tools Clarity auf die FMG, inklusive der Migration auf das aktuelle Software-Release.
Neue Reports werden mit der neuen Reporting-Engine "JasperReports" erstellt.

★ **Homepage**

/Clarity

/Bibliotheken

- Webseiten
- Projektdokumentation
- E-Mails
- Projekt intern

/Listen

- Kalender
- Aufgaben
- Kontakte
- Ankündigungen
- Schulungsliste

Papierkorb

Gesamter Websiteinhalt

/Projektphase

MapIT Projektprozess (Großes Projekt)

60 Initialisierung 61 Planung 62 Realisierung 63 Inbetriebnahme 64 Abschluss 65

/News Ticker

Projekt

Das Projekt "Clarity4FMG" wurde neu gestartet.

Graf Matthias

/Meine offenen Projektaufgaben

Es gibt keine Elemente, die in dieser Ansicht angezeigt werden.

/Projektmitglieder

- Strawert Jörg**
+498937532400
joerg.strawert@munich-airport.de
- Graf Michael**
michael.graf@munich-airport.de
- Teller Dennis**
+498937532400
dennis.teller@munich-airport.de
- Dierig Sandra**
+498937532400
sandra.dierig@munich-airport.de

/Zuletzt bearbeitete Projektdokumente

<input type="checkbox"/> Typ	Name	Geändert	<input type="checkbox"/> Geändert von
	X0G	03.03.2015 16:54	Graf Matthias
	ITD WS	09.02.2015 10:06	Graf Matthias
	Orga	29.01.2015 11:25	Graf Matthias
	Projektlebenszyklus-Übersicht	06.05.2015 08:19	Graf Matthias

Noch Fragen?



Vielen Dank

