

GESCHÄFTSPROZESS- INTEGRATION MIT CLARITY

T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS GMBH

(CA PPM CLARITY USER GROUP – DACH)

CLARITY GESCHÄFTSPROZESSINTEGRATION

AGENDA

1. **T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS GMBH**
(Unternehmensdarstellung T-Systems MMS)
2. **CLARITY@T-SYSTEMS MMS**
3. **GESCHÄFTSPROZESSE**
4. **INTEGRATION ENTERPRISE ARCHITEKTUR**
5. **REPORTING PROZESSÜBERGREIFEND**



CLARITY GESCHÄFTSPROZESSINTEGRATION

IHRE GASTGEBER

- **Frank Treichel**
(Service- und Prozessmanager „Lead to Cash“)



- **Rico Fleischer**
(Projektleiter Clarity)



DIGITALE LÖSUNGEN UND WEB-INNOVATIONEN

T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS (Unternehmensdarstellung)

WEGWEISEND. DIGITAL.

UNSER LEBEN HAT SICH VERÄNDERT

wegweisend
Digital
T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS



T · · Systems ·

WEGWEISEND. DIGITAL.

UNSER LEBEN HAT SICH VERÄNDERT

Digitalisierung und **Vernetzung** verändern unser Leben, verändern die Gesellschaft, verändern Unternehmen – nicht in Jahrzehnten, sondern binnen weniger Jahre.

Neue **Firmen** und **Geschäftsmodelle** entstehen. Neue Wege der **Kommunikation** und **Zusammenarbeit** etablieren sich. Bei allen Unternehmensaktivitäten steht der **Kunde** im Mittelpunkt.


Unternehmen, Organisationen und Marken setzt diese Entwicklung unter Druck und erzeugt große Herausforderungen – die **Digitale Transformation**. Für unsere Kunden sind wir daher vor allem eines: Wegweiser im digitalen Geschäft.

Wegweisend. Digital.

DURCH TEILEN GEWINNEN

ZUSAMMEN ARBEITEN IST ALLTAG

wegweisend
Digital
T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS

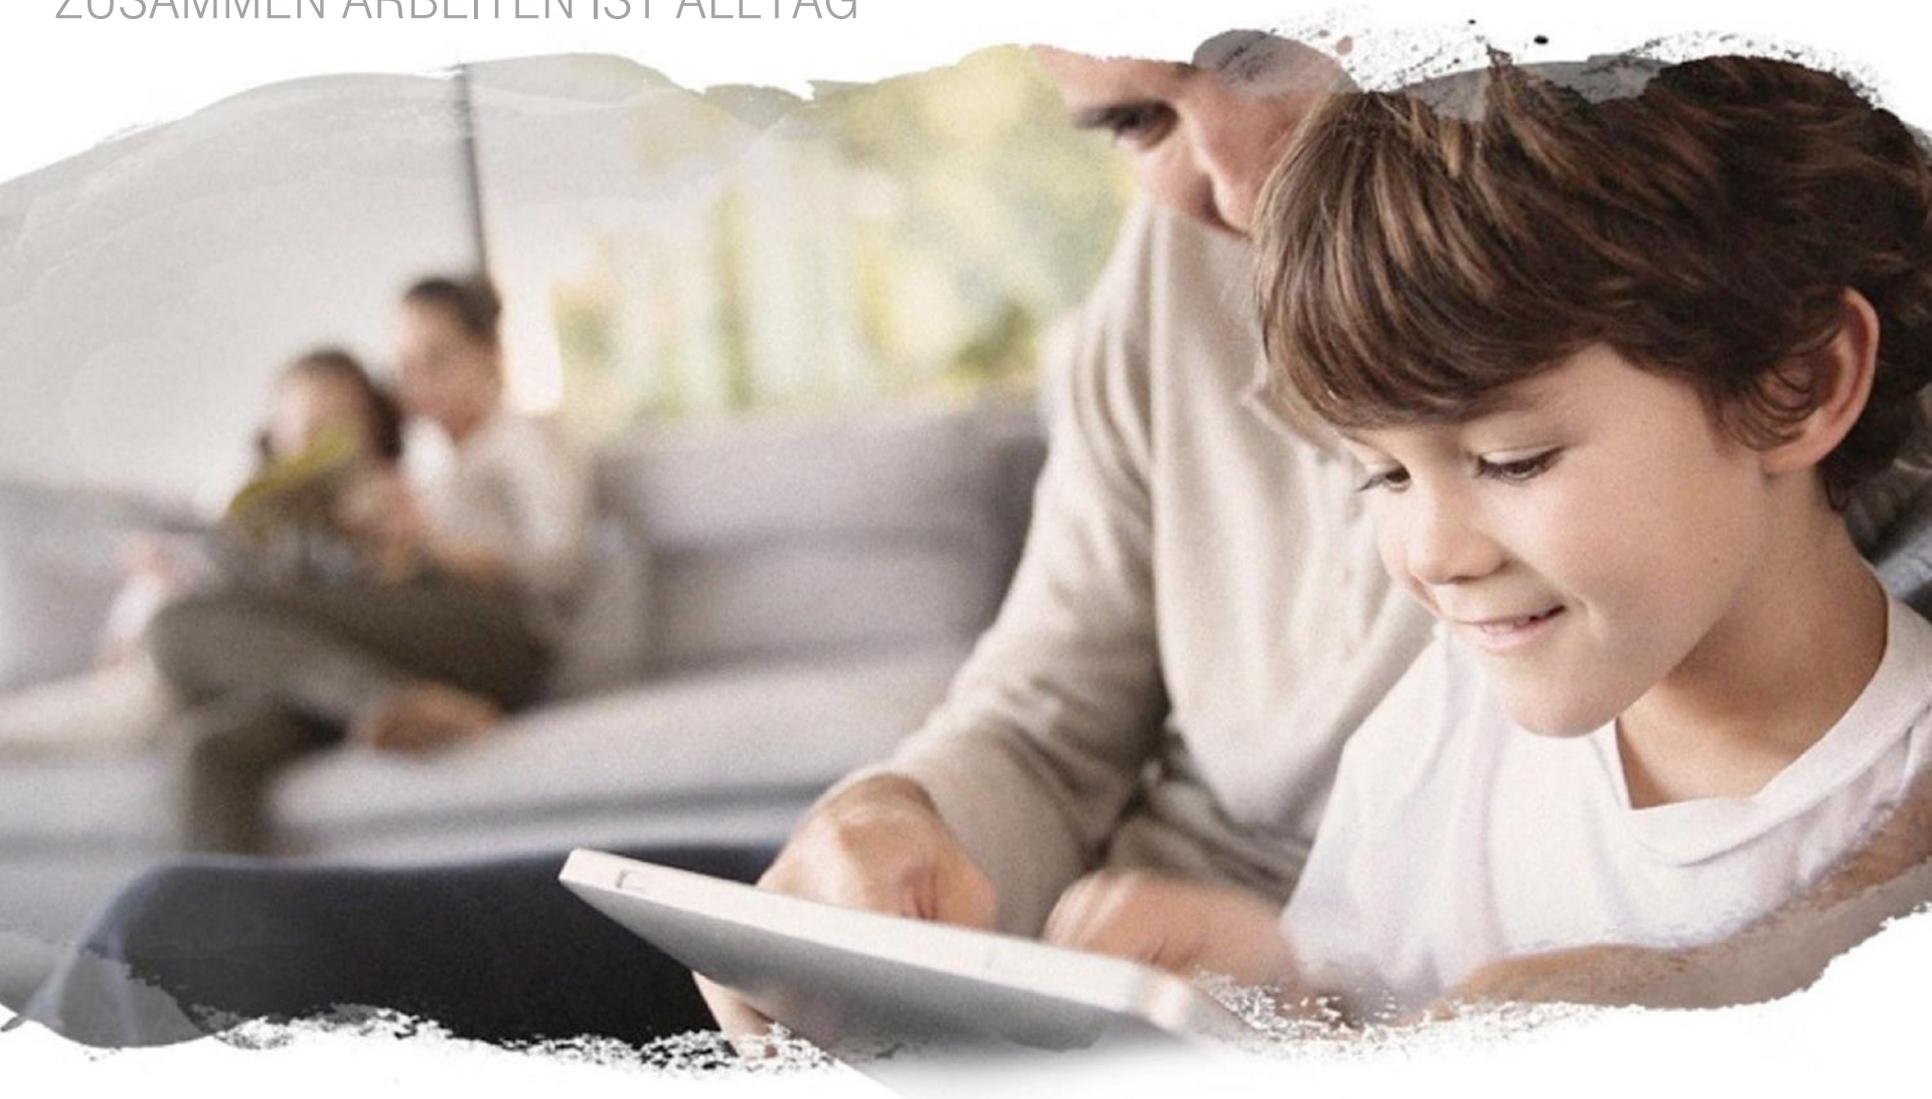

T · · Systems ·

DURCH TEILEN GEWINNEN

ZUSAMMEN ARBEITEN IST ALLTAG

Der Einsatz sozialer Technologien kann die Produktivität von Wissensarbeitern in Unternehmen um bis zu 25 Prozent steigern – ein echter Gewinn!

Vernetzt zusammen arbeiten, spontan Ideen austauschen, vorhandenes Wissen schneller verfügbar machen – so **optimieren** Sie **Arbeitsabläufe**, senken **Kommunikationskosten** und steigern Ihre **Wettbewerbsfähigkeit**.

EFFEKTIVER PRODUZIEREN

PERFEKT ABGESTIMMTE ABLÄUFE

wegweisend
Digital
T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS



T · · Systems ·

EFFEKTIVER PRODUZIEREN

PERFEKT ABGESTIMMTE ABLÄUFE

Produktionssteigerung von rund 78 Milliarden Euro bis 2025 in Deutschland – wer in der **vierten industriellen Revolution** nicht mitmischt, wird abgehängt.

Durch digitalisierte Geschäftsprozesse und die intelligente Vernetzung aller Produktionsressourcen eröffnen sich grundlegend neue Möglichkeiten – damit Sie **flexibler**, **individueller** und **trotzdem kostengünstiger** produzieren.

KEINE KOMPROMISSE

SCHÜTZEN SIE SICH UND IHRE IDEEN

wegweisend
Digital
T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS



T-Systems

KEINE KOMPROMISSE

SCHÜTZEN SIE SICH UND IHRE IDEEN

500 Milliarden Euro ist der geschätzte jährliche Schaden durch Cyberkriminalität weltweit – können Sie sich das leisten?

Sicherheit für digitale Anwendungen, Infrastrukturen und Datenaustausch – damit Ihre vertraulichen Informationen und das Know-how Ihres Unternehmens nicht in falsche Hände geraten. Vertrauen Sie Deutschlands einzigem **akkreditieren Testcenter** in der **Internetbranche**.

ALLES AUS EINER HAND

INDIVIDUELL ZUGESCHNITTENE LÖSUNGEN


*wegweisend
Digital*
T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS



T · · Systems ·

VON DER STRATEGIE BIS ZUR UMSETZUNG

ABGESTIMMT AUF IHREN BEDARF

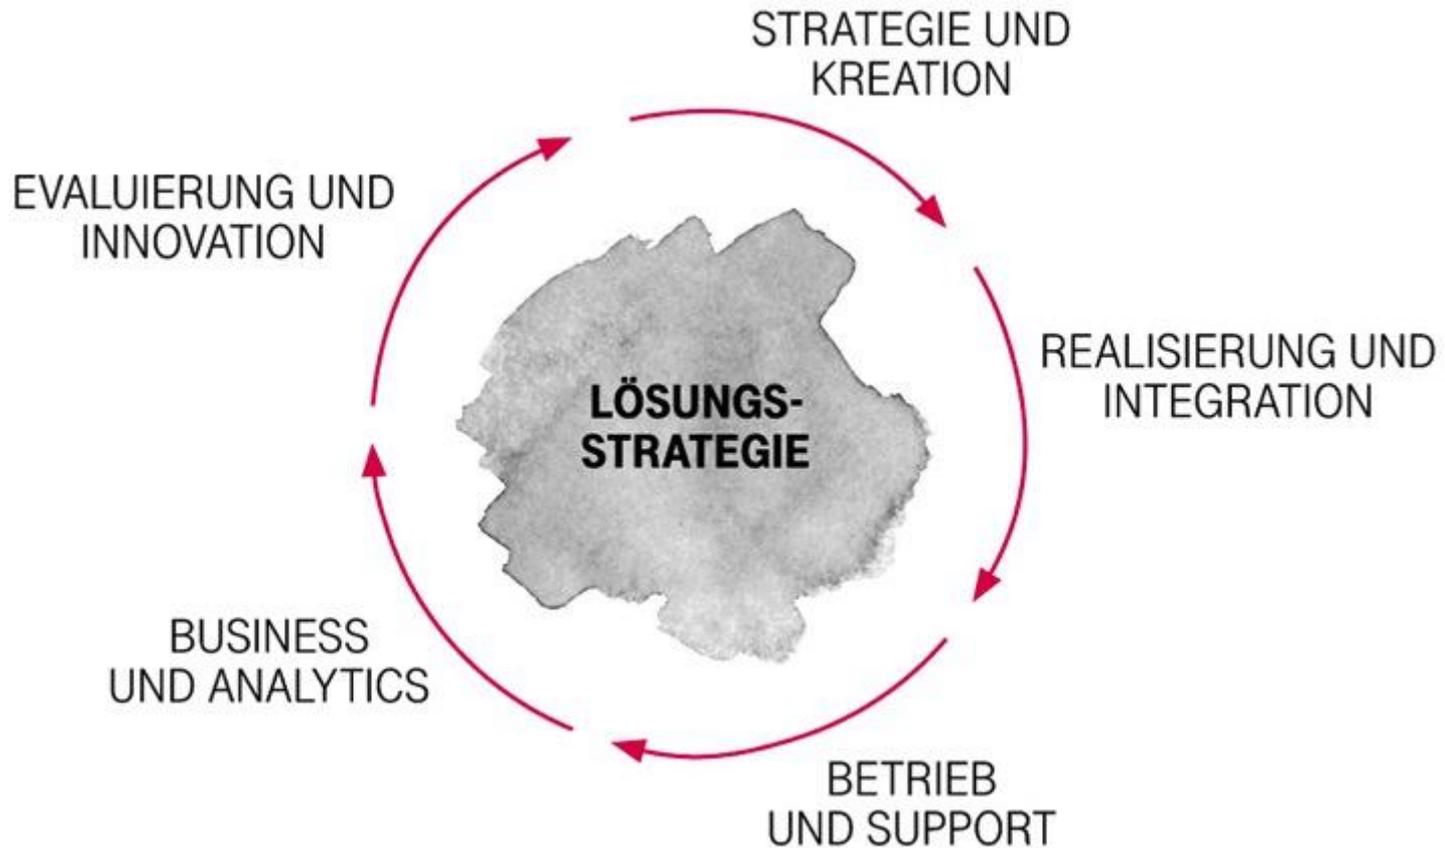

TALENTIERT UND ERFOLGREICH

WIR BRINGEN DAS BESTE ZUSAMMEN

- **Digital Business:** seit 20 Jahren
- **Umsatz im Jahr 2014:** 145 Mio. €
- **Mitarbeiter:** rund 1.500 (Durchschnittsalter 37 Jahre)
- **Kundenprojekte im Jahr 2014:** 2.786
- **Gesamtzufriedenheit unserer Kunden 2014:** 96,1 %
- **Arbeitsweise:** agil, flexibel, professionell, zuverlässig, digital – a Great Place to Work
- **7 Standorte** in Deutschland
- **Hochsichere** Netze und Rechenzentren der Deutschen Telekom AG



T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS

KUNDENAUSWAHL



T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS

STARKE PARTNERSCHAFTEN



T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS


GUTE ARGUMENTE

wegweisend
Digital
T-SYSTEMS MULTIMEDIA SOLUTIONS



CLARITY@ T-SYSTEMS MMS

Einordnung

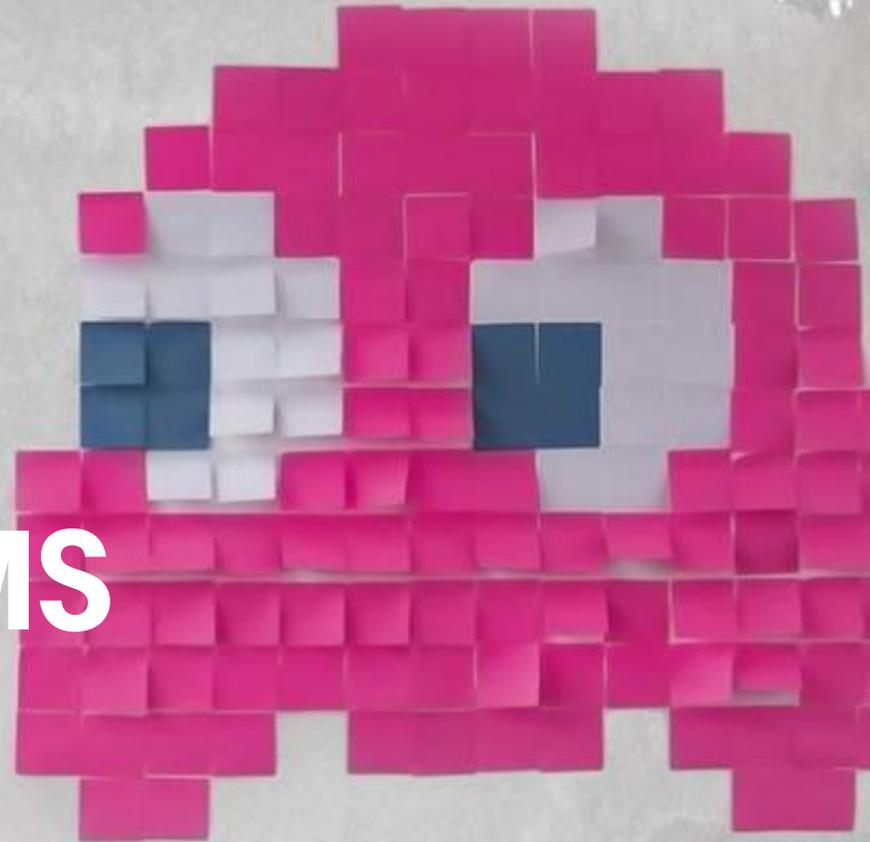

CLARITY@T-SYSTEMS MMS

GESCHICHTLICHE ECKPUNKTE

2005-2006

- Evaluierung Enterprise-Projektmanagement-Systems (Februar – Juni)
- Einführung Clarity 7, inkl. Workbench und MS Project (August – Dezember)
- **Wirkbetriebsaufnahme zum 01.01.2006**
- Schnittstellen SAP CO von/nach Clarity (Flatfiles)

2007-2010

- **Schnittstellen** Clarity nach **MIS** (IBM Cognos, DataHub SQL)
- **E-Angebot** (inkl. Schnittstelle SharePoint)
- itd TimeTracker, Überarbeitung Standard-Stellvertreterfunktion (Proxy)

2011-2015

- **Schnittstelle MS CRM** nach CA Clarity (Webservice)
- **E-Auftrag** (Elektronische Abbildung Auftragsfreigabe inkl. Schnittstelle SharePoint)
- Import von Auftragsdaten über **Schnittstelle DMS/DOXiS** (E-Auftrag)
- **E-Abrechnung** (Schnittstelle SAP SD, Webservice)

CLARITY@T-SYSTEMS MMS

INFRASTRUKTUR

Clarity-Version 13.1.0.5

Applikationsserver

- **CPU:** 1x Hexacore CPU (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-640 0 @ 2.50GHz)
- **HDD:** 2x 279 GB (als Hardware RAID 1)
- **RAM:** 32GB (gesamt)
 - 3 APP-Dienste mit je min. 2GB, max. 6GB
 - 1 BG-Dienst mit min. 2GB, max. 4GB

Datenbank (Oracle 11.2.0.4)

- **RAC-DB** (Aktiv-Aktiv-Passiv) mit **SSD-Speicher**
- **SGA (RAM)** max. 80GB, freigegeben 60GB
- **Größe Tablespace:**

DB (gesamt)	max. 128GB	genutzt 64GB
INDX_LARGE	30GB	12,8GB
INDX_SMALL	20GB	9,6GB
USERS_LARGE	30GB	16,7GB
USERS_SMALL	35GB	22,3GB

Support-/
Implementierungspartner
itdesign GmbH




Geschäftsprozesse

PROZESSMODELL
T-SYSTEMS MMS


ÜBERBLICK GESCHÄFTSPROZESSE

PROZESSORIENTIERTES MANAGEMENT SYSTEM

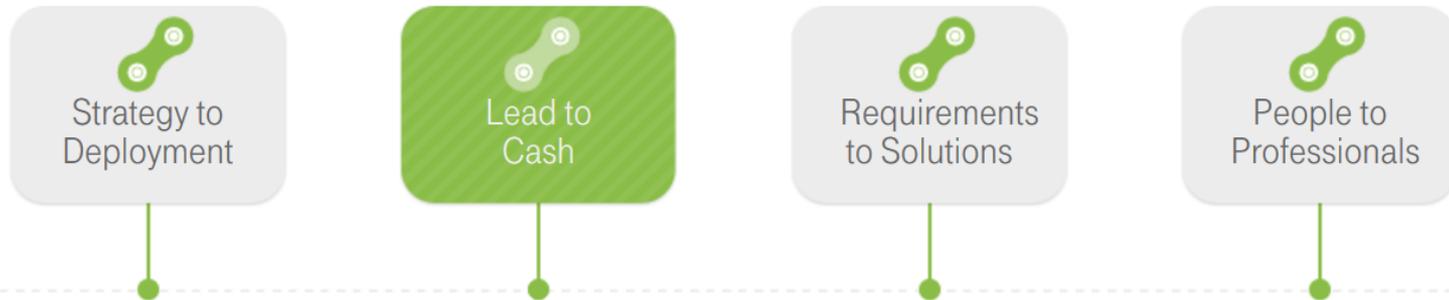


LEAD TO CASH TEILPROZESSE

IM DETAIL

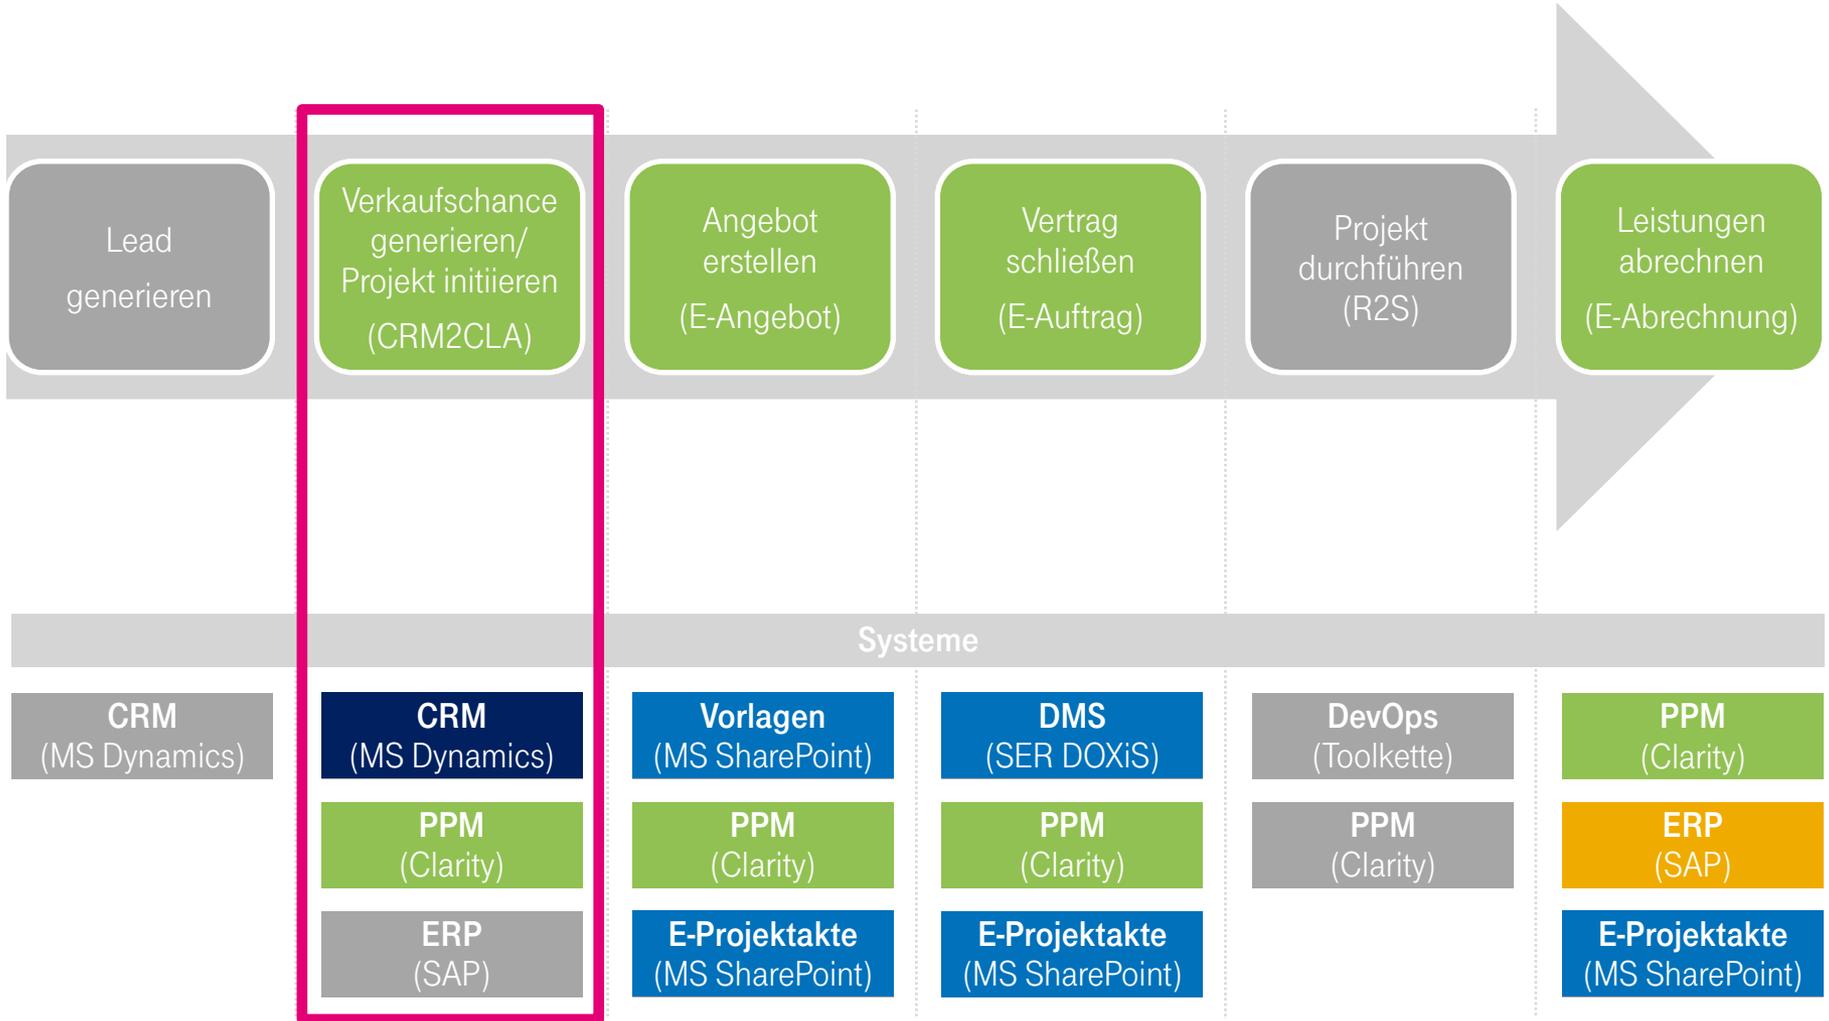

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA - THEORIE

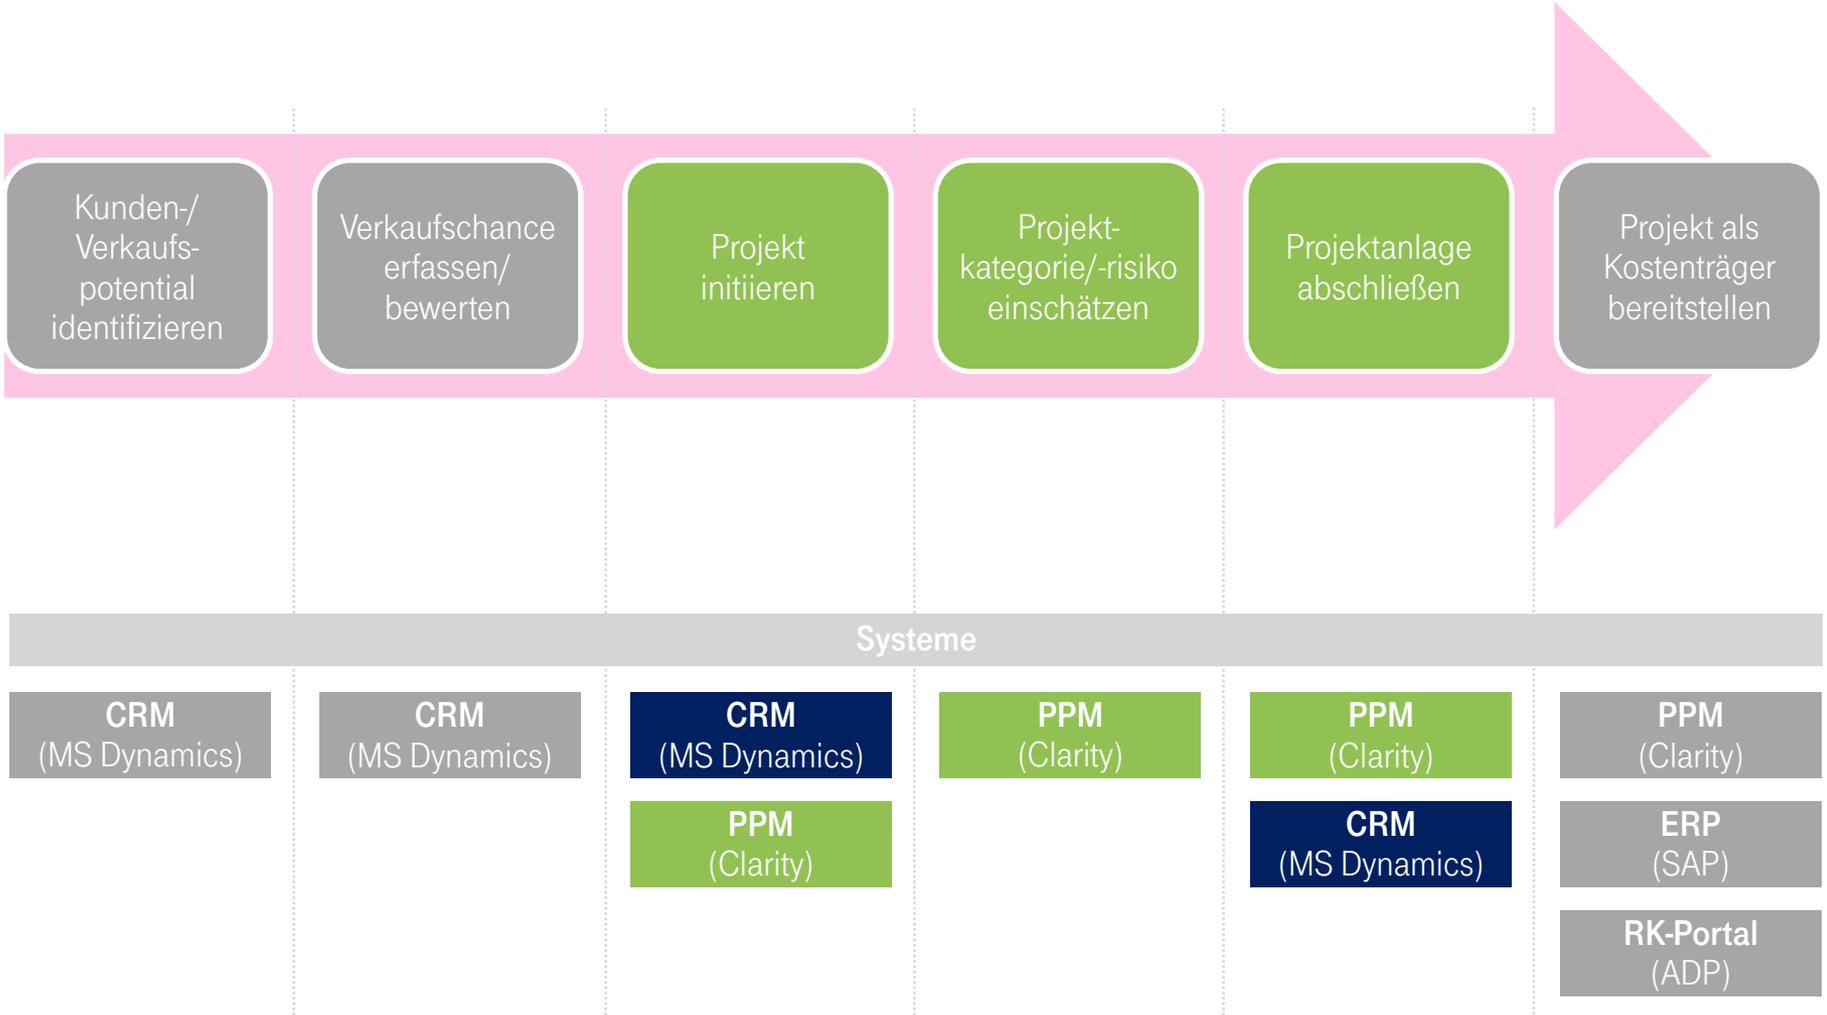

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA – PRAXIS

Microsoft Dynamics CRM | VERTRIEB | Verkaufschancen | CA PPM Clarity Use...

Erstellen Rico Fleischer TSYSTEMS

VERKAUFSSCHANCE

CA PPM Clarity User Group – DACH

Clarity-Projekt-ID | Selling Team Leiter Rico Fleischer

Accountplanung / Sales Accepted Lead | Opportunity Prüfen Und Bewerten | **Gegenseitiges Qualifizieren (Aktiv)** | Lösung Erarbeiten | Angebot | Letter Of Intent (LOI) | Auftrag (Signed) | Nächste...

Clarity-Projekt-ID	zum öffnen klicken	Mitbewerber identifizieren	Als erledigt markieren	Nehmer	zum öffnen klicken	AAM / Einkauf mit ein	Nein
Prozess durch Clarity	zum öffnen klicken	Selling Team bilden	Als erledigt markieren	Offshore fähig	zum öffnen klicken	Angebotskizze / Preis	Nein
Nutzbaser Bewertung	Nein	Macher	zum öffnen klicken	Risikobewertung	Als erledigt markieren		

Zusammenfassung

Informationen zu Verkaufschancen

Kurzbezeichnung: CA PPM Clarity User Group – DACH

Potenzieller Endkunde: itdesign GmbH

Ansprechpartner Endkunde: Jörg Leute

Auftraggeber: Steffen Schostok

Akquisequelle: --

Ausschreibung: Nein

Marketingmaßnahme: --

Unternehmenseinheit: SF01: AM eHealth

Marktlösung: Business Intelligence & Big Data

Portfolioelement: Data Warehousing and Big Data

Technologie: --

Beschreibung: Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management Reporting

SubAccount: --

Offshore

Offshore fähig: Nein - Begründung notwendig

Begründung: Anforderung Datenschutz

pot. ungewichteteter Umsatz: 300.000,00€

Abschlusswahrscheinlichkeit: 100

pot. gewichteter Umsatz: 300.000,00€

geschätztes Auftragsdatum: 01.12.2015

geschätztes Umsatzdatum: 15.03.2016

NACHRICHTEN AKTIVITÄTEN NOTIZEN

Nachricht hier eingeben

Beide Automatische Beiträge Benutzerbeiträge

CA PPM Clarity User Group – DACH

Verkaufschance: Erstellt von Rico Fleischer für Firma itdesign GmbH.
Auf Pinnwand von CA PPM Clarity User Group – DACH
Heute

Sales Manager: Claudia Palfi

Selling Team Leiter: Rico Fleischer

Selling Team

Name	Rolle
Rico Fleischer	Selling Team - Leiter

PROJEKT BETEILIGTE

Keine Stakeholder verfügbar.

Mitbewerber

Mitbewerber	Website
Kein(e) mitbewerber gefunden.	

Offen

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA – PRAXIS

The screenshot displays the Microsoft Dynamics CRM interface for a sales opportunity. The main record is titled "CA PPM Clarity User Group – DACH". A context menu is open over the record, listing various actions such as "Prozess wechseln", "Prozess bearbeiten", and "Neues Projekt erstellen". The "Neues Projekt erstellen" option is highlighted with a red box. The interface also shows a sidebar with "Zusammenfassung" and "Informationen zu Verkaufschancen", and a bottom section with "NACHRICHTEN AKTIVITÄTEN NOTIZEN".

Informationen zu Verkaufschancen

Kurzbezeichnung *	CA PPM Clarity User Group – DACH
Potenzieller Endkunde *	itdesign GmbH
Ansprechpartner Endkunde *	Jörg Leute
Auftraggeber *	Steffen Schostok
Akquisequelle *	--
Ausschreibung *	Nein
Marketingmaßnahme *	--
Unternehmensinhaber *	SF01: AM eHealth
Marktlösung *	Business Intelligence & Big Data
Portfolioelement *	Data Warehousing and Big Data
Technologie *	--
Beschreibung *	Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management

NACHRICHTEN AKTIVITÄTEN NOTIZEN

Beide Automatische Beiträge Benutzerbeiträge

CA PPM Clarity User Group – DACH
Verkaufschance: Erstellt von Rico Fleischer für Firma itdesign GmbH.
Auf Pinnwand von CA PPM Clarity User Group – DACH
Heute

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Projekt erstellen

Allgemein

- Projekt-ID: 8000372
- Projektname: CA PPM Clarity User Group – DACH
- Beschreibung: Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management Reporting
- Anfangsdatum: 30.11.2015
- Enddatum: 30.11.2015
- Kunde: CA Deutschland GmbH
- Ansprechpartner Kunde: Steffen Schostok
- Endkunde (Leistungsempfänger): Idesign GmbH
- Ansprechpartner Endkunde: Jörg Leute
- Sales Manager: [Name]
- Projektleiter: Fleischer, Rico
- Stellvertreter: [Name]
- Projekttyp: Produktiv Projekt
- Leistungskategorie: [Auswählen--]
- Projektkategorisierung:
 - Auftragswert (€): [Auswählen--]
 - Auftragsumfang (Ph): [Auswählen--]
 - Terminsituation: [Auswählen--]
 - Techn. Komplexität/ MMS-Erfahrungshintergrund: [Auswählen--]

Risikobewertung: Wie Wahrscheinlich ist es, dass ...

- Zeit-/Planungsengpässe: [Auswählen--] (... Liefertermine nicht eingehalten werden können?)
- Finanzen/Budget: [Auswählen--] (... kalkulierte Stunden nicht ausreichen?)
- Qualität/Kundenzufriedenheit: [Auswählen--] (... durch mangelnde Qualität/Kundenorientierung ein öffentlich wirksamer Imageschaden verursacht wird?)
- Ressourcen Verfügbarkeit: [Auswählen--] (... nicht genügend Mitarbeiter mit den richtigen Skill zur Verfügung stehen?)
- Anforderungen: [Auswählen--] (... Kundenanforderungen mit dem Kunden zu Vertragsabschluss NICHT abgestimmt und dokumentiert sind?)
- Vertrag und Mitwirkungspflichten: [Auswählen--] (... wir in Vorleistung gehen müssen?)
- Lieferanten: [Auswählen--] (... durch den Subdienstleister Lieferschwierigkeiten eintreten können?)
- Architektur, Technologie und Werkzeuge: [Auswählen--] (... wir in der angebotenen Technologie ungenügende Erfahrung haben?)
- Kommunikation: [Auswählen--] (... Kommunikationsschwierigkeiten (unterschiedliche Kultur, Sprache, nicht eingebundene Stakeholder, unklare Kommunikationswege) im Projekt auftreten können?)
- Organisation & Politik: [Auswählen--] (... wir Abhängigkeiten zu TSI Beistellungen haben?)
- Sicherheitsrisiken: [Auswählen--] (... die Sicherheits- und Datenschutzerfordernisse des Kunden unbekannt sind?)

Organisationsorientierte Strukturpläne

- T-Systems MMS OBS Programm: [Auswählen--]
- T-Systems MMS OBS Projekte: [Auswählen--]
- Abteilung: MMS/MMS 4.0/IGB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH
- Speichern
- Speichern und zurückkehren
- Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden Hilfe Info

Startseite Verwaltung Favoriten 🔄 🏠 🔍

Eigenschaften Team Aufgaben **Finanzpläne** Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - **Eigenschaften - Stammdaten - Allgemein** In Scheduler öffnen Aktionen

Projektkategorie B Risiko

Allgemein

<p>Projekt-ID: 8000372</p> <p>Projektname: CA PPM Clarity User Group – DACH</p> <p>Beschreibung: Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management Reporting</p> <p>Anfangsdatum: 30.11.2015</p> <p>Enddatum: 30.11.2015</p> <p>Kunde: CA Deutschland GmbH</p> <p>Ansprechpartner Kunde: Steffen Schostok</p> <p>Endkunde (Leistungsempfänger): tdesign GmbH</p> <p>Ansprechpartner Endkunde: Jörg Leute</p> <p>Sales Manager</p>	<p>Hauptprojekt</p> <p>Vertragsstatus: Gegenseitiges Qualifizieren (20%)</p> <p>Projektstatus: Nicht Genehmigt</p> <p>Projektleiter: Fleischer, Rico</p> <p>Stellvertreter:</p> <p>Projekttyp: Produktiv Projekt</p> <p>Leistungskategorie: Lösungsentwicklung</p> <p>Topprojekt: <input type="checkbox"/></p> <p>Programm: <input type="checkbox"/></p> <p>Verlage: <input type="checkbox"/></p> <p>Scheduler-Format: Workbench</p> <p>Link zur Verkaufschance: </p> <p>Link zum Projektordner (SharePoint): -</p>
---	---

Kaufmännische Informationen

<p>Projektwert</p> <p>durchschnittl. Stundensatz</p> <p>Geschätzter Aufwand (Ph)</p>	<p>Vertragsart</p> <p>Abrechnungsmodus</p> <p>Reisekostenabrechnungsart</p>
--	---

Organisationsorientierte Strukturpläne

T-Systems MMS OBS Programm:

T-Systems MMS OBS Projekte:

Abteilung: /MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Finanzpläne - Kostenpläne Aktionen

Filter: Systemstandardwert

ID	Grundlegender Plan	Grundlegenden Plan festlegen	Anfangszeitraum	Endzeitraum	Einheiten gesamt	Gesamtkosten	Gesamtertrag	Zuletzt von	Datum der letzten Aktualisierung
0045893	✓	iii	2016/03	2016/03			300.000,00	Administrator, Niku	27.11.15

1 - 1 von 1 wird angezeigt

Speichern Neuer manuell erstellter Plan Löschen

Währung = EUR

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Detail Prozesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Kostenplan: Initialer Kostenplan gemäß Datenübernahme aus CRM-System - Kostenplandetails

Anzeigeeinstellungen

Anzeige: Nur Projekt Anzuzeigende Daten: Kosten und Umsatz Vergleiche: Plan- und Ist-Werte Summe Finanzperioden: Ansicht aktualisieren Excel Export

Alle aufklappen Alle zuklappen

Gruppierung (Abt./TK) Finanzperioden - Start: 2016/03 Anzahl: 1 Anzeigen

Gruppierung (Abt./TK)	Plankosten	Istkosten	Planumsatz	Istumsatz	Plankosten	Istkosten	Planumsatz	Istumsatz
SF7001 - Servicefeld AM eHealth			300.000,00					
SF7001 Eigenleistung konterierend			300.000,00				300.000,00	
Summe	0,00	0,00	300.000,00	0,00			300.000,00	

Speichern Hinzufügen Löschen Aus Aufgabenzuweisungen auffüllen Eingabeassistent f. kfm. Meilensteine Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten In Scheduler öffnen Aktionen

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Allgemein In Scheduler öffnen Aktionen

Projektkategorie B Risiko

Allgemein

<p>Projekt-ID 8000372</p> <p>Projektname CA PPM Clarity User Group – DACH</p> <p>Beschreibung Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management Reporting</p> <p>Anfangsdatum 30.11.2015</p> <p>Enddatum 30.11.2015</p> <p>Kunde CA Deutschland GmbH</p> <p>Ansprechpartner Kunde Steffen Schostok</p> <p>Endkunde (Leistungsempfänger) itdesign GmbH</p> <p>Ansprechpartner Endkunde Jörg Leute</p> <p>Sales Manager</p>	<p>Hauptprojekt</p> <p>Vertragsstatus Lösung erarbeiten (30%)</p> <p>Projektstatus Nicht Genehmigt</p> <p>Projektleiter Fleischer, Rico</p> <p>Stellvertreter</p> <p>Projekttyp Produktiv Projekt</p> <p>Leistungskategorie Lösungsentwicklung</p> <p>Topprojekt</p> <p>Programm</p> <p>Vorlage</p> <p>Scheduler-Format Workbench</p> <p>Link zur Verkaufschance</p> <p>Link zum Projektordner (SharePoint)</p>
---	--

Kaufmännische Informationen

<p>Projektwert</p> <p>durchschnittl. Stundensatz</p> <p>Geschätzter Aufwand (Ph)</p>	<p>Vertragsart</p> <p>Abrechnungsmodus</p> <p>Reisekostenabrechnungsart</p>
---	--

Organisationsorientierte Strukturpläne

T-Systems MMS OBS Programm

T-Systems MMS OBS Projekte /MMS/8000372

Abteilung /MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA – PRAXIS

Microsoft Dynamics CRM | VERTRIEB | Verkaufschancen | CA PPM Clarity Use... | Erstellen | Rico Fleischer | TSYSTEMS

VERKAUFSSCHANCE | CA PPM Clarity User Group – DACH

Accountplanung / Sales Accepted Lead | Opportunity Prüfen Und Bewerten

ZUWEISEN | LINK PER E-MAIL SENDEN | LÖSCHEN

Clarity-Projekt-ID | zum öffnen klicken | Mitbewerber identifizieren | Als e...
Prozess durch Clarity | zum öffnen klicken | Selling Team bilden | Als e...
Nutzbaser Bewertung | Nein | Macher | zum

Zusammenfassung

Informationen zu Verkaufschancen

Kurzbezeichnung * CA PPM Clarity User Group – DACH
Potenzieller Endku... * itdesign GmbH
Ansprechpartner End... Jörg Leute
Auftraggeber * Steffen Schostok
Akquisequelle --
Ausschreibung Nein
Marketingmaßnahm... --
Unternehmenseinl... * SF01: AM eHealth
Marktlösung * Business Intelligence & Big Data
Portfolioelement * Data Warehousing and Big Data
Technologie --
Beschreibung * Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Managem...

SubAccount --
Offshore

Offshore fähig * Nein - Begründung notwendig
Begründung * Anforderung Datenschutz

pot. ungewichtet: * 300.000,00€
Abschlusswahrsch... * 100
pot. gewichteter Um... * 300.000,00€
geschätztes Auftra... * 01.12.2015
geschätztes Umsat... * 15.03.2016

Offen

Gegenseitiges Qualifizieren (Aktiv) | Lösung Erarbeiten

gt markieren | Nehmer | zum öffnen klicke...
gt markieren | ✓ Offshore fähig * | Nein - Begründu...
en klicken | Risikobewertung | Als erledigt mark...

NACHRICHTEN | AKTIVITÄTEN | NOTIZEN

Nachricht hier eingeben

Beide | Automatische Beiträge | Benutzerbeiträge

CA PPM Clarity User Group – DACH
Verkaufschance: Erstellt von Rico Fleischer für Firma itdesign GmbH.
Auf Pinnwand von CA PPM Clarity User Group – DACH
Heute

Mitbewerber ↑ | Website | Kein(e) mitbewerber gefunden.

Context Menu Options:

- Prozess wechseln
- Prozess bearbeiten
- Formular
- Freigeben
- Gesicherte Felder freigeben
- Nicht mehr folgen
- Workflow ausführen
- Dialog starten
- Bericht ausführen
- CA Clarity PPM - Integriati...
- Neues Projekt erstellen
- Neues Projekt aus Vorlage
- Clarity Projekt öffnen

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

CRM2CLA – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten 🔄 🏠 ⚙️ 🔍

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Allgemein 📄 In Scheduler öffnen ⌵ Aktionen ⌵

Projektkategorie B Risiko ◆

Allgemein

<input checked="" type="checkbox"/> *Projekt-ID 8000372	Hauptprojekt
<input checked="" type="checkbox"/> Projektname CA PPM Clarity User Group – DACH	<input type="text" value="Vertragsstatus Lösung erarbeiten (30%)"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Beschreibung Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management Reporting	<input type="text" value="Projektstatus Nicht Genehmigt"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anfangsdatum 30.11.2015 <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Projektleiter Fleischer, Rico <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Enddatum 30.11.2015 <input type="text"/>	<input type="text" value="Stellvertreter"/>
<input type="text" value="Kunde CA Deutschland GmbH"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Projekttyp Produktiv Projekt
<input checked="" type="checkbox"/> Ansprechpartner Kunde Steffen Schostok	<input checked="" type="checkbox"/> Leistungskategorie Lösungsentwicklung <input type="text"/>
<input type="text" value="Endkunde (Leistungsempfänger) itesign GmbH"/>	<input type="checkbox"/> Topprojekt
<input checked="" type="checkbox"/> Ansprechpartner Endkunde Jörg Leute	<input type="checkbox"/> Programm
<input type="text" value="Sales Manager"/>	<input type="checkbox"/> Vorlage
	<input type="text" value="Scheduler-Format Workbench"/>
	<input type="text" value="Link zur Verkaufschance"/>
	<input type="text" value="Link zum Projektordner (SharePoint)"/>

Kaufmännische Informationen


<input type="text" value="Projektwert"/>	<input type="text" value="Vertragsart"/>
<input type="text" value="durchschnittl. Stundensatz"/>	<input type="text" value="Abrechnungsmodus"/>
<input type="text" value="Geschätzter Aufwand (Ph)"/>	<input type="text" value="Reisekostenabrechnungsart"/>

Organisationsorientierte Strukturpläne

<input type="text" value="T-Systems MMS OBS Programm"/>
<input type="text" value="T-Systems MMS OBS Projekte /MMS/8000372"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Abteilung /MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH


LEAD TO CASH TEILPROZESSE

ÜBERBLICK

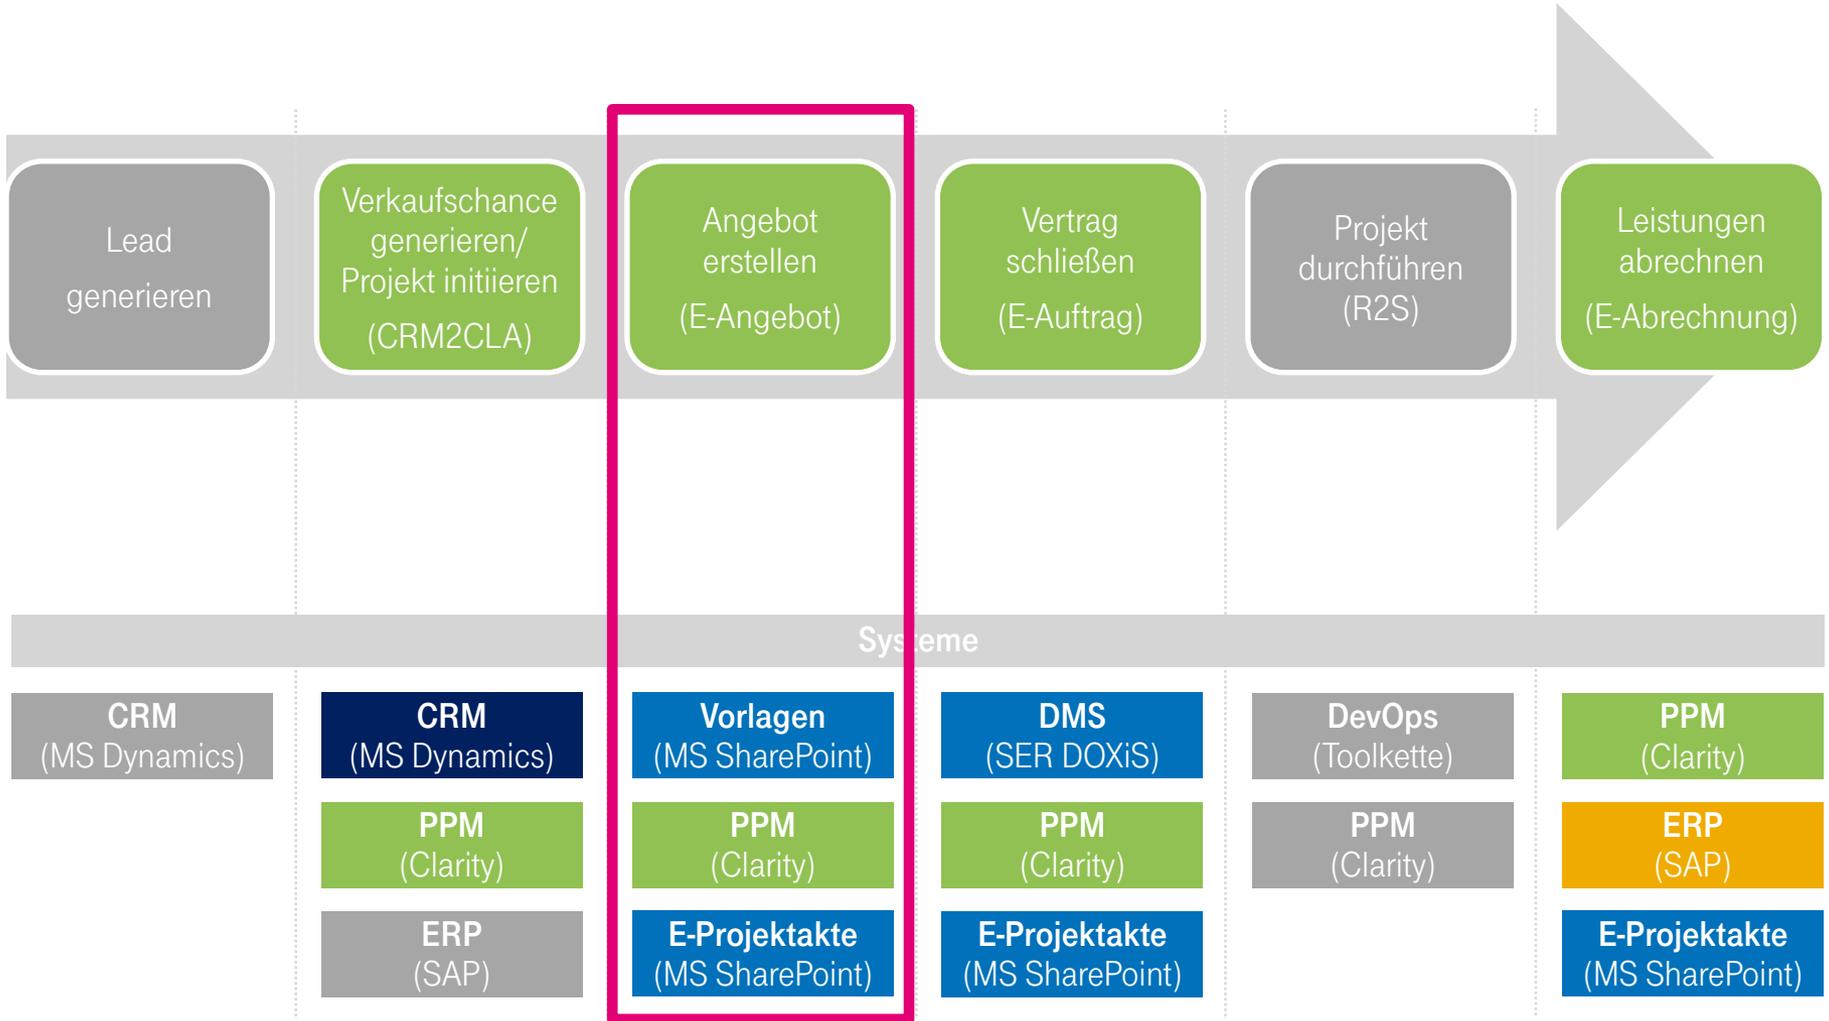

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT

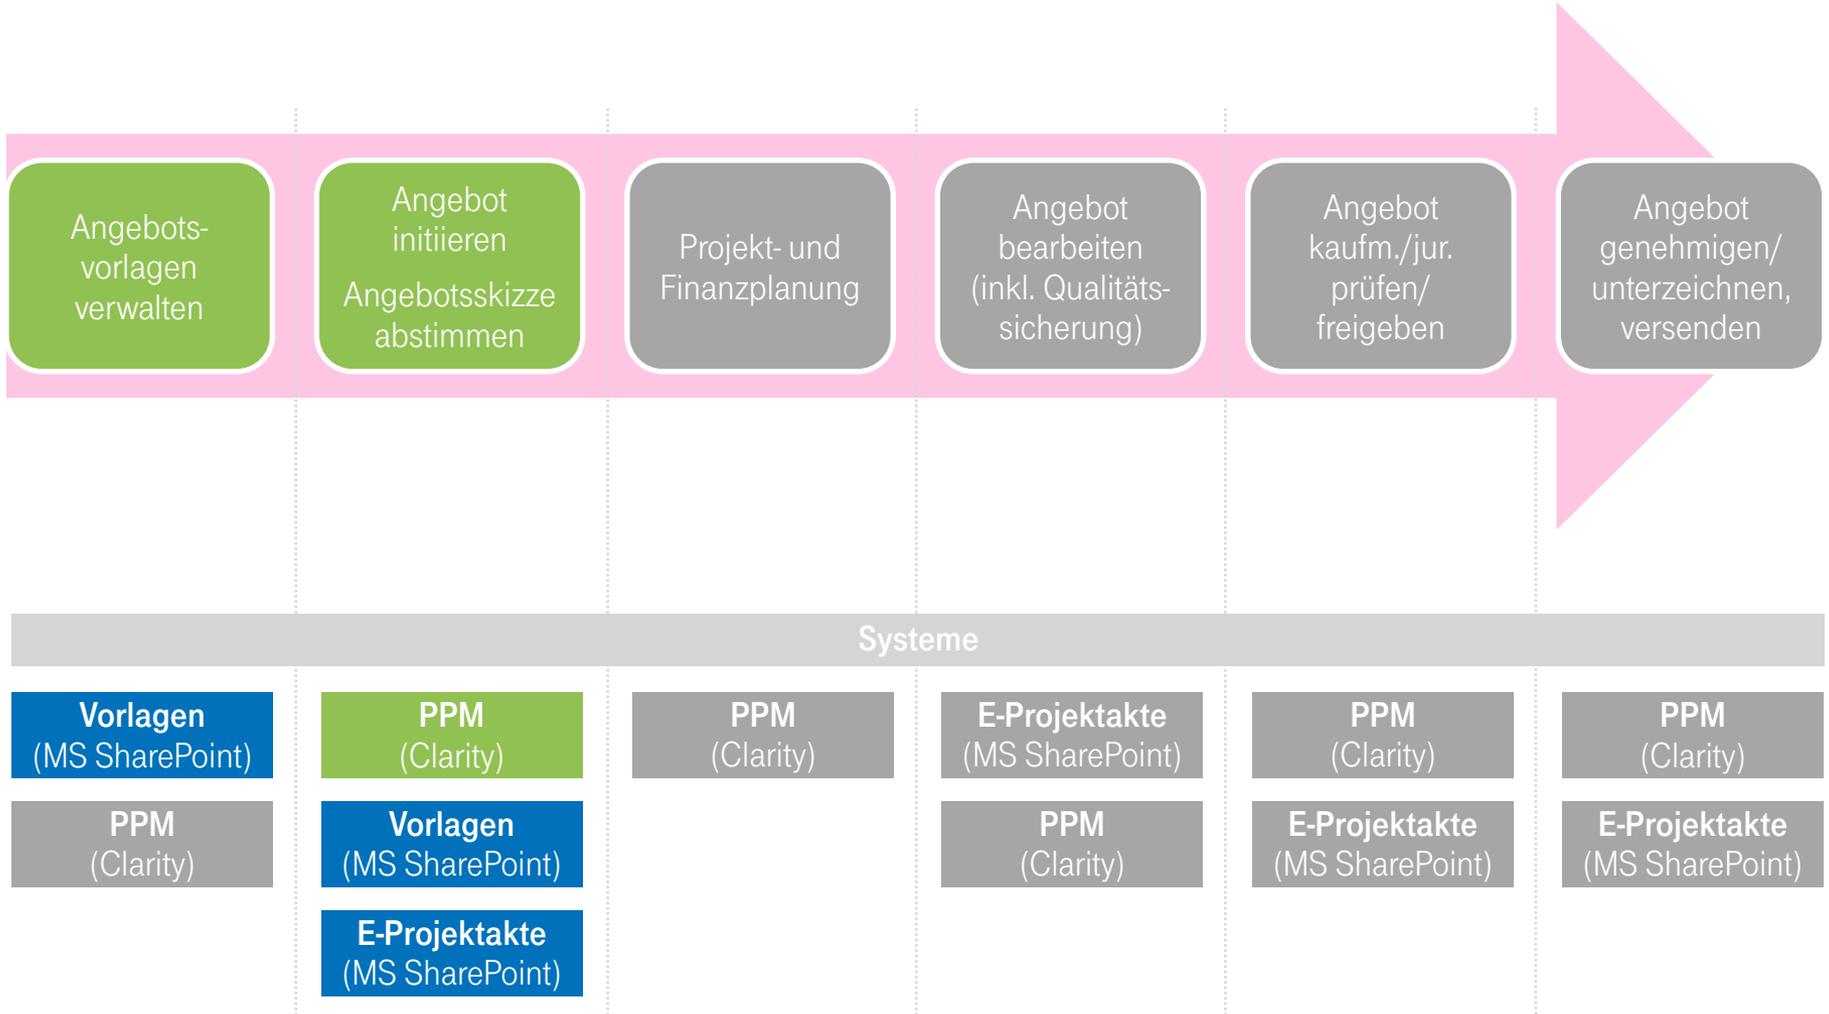

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT – PRAXIS

Websteaktionen - Durchsuchen Bibliothekstools Dokumente Bibliothek Rico Fleischer

Neues Dokument, Dokumentupload, Neuer Ordner, Dokument bearbeiten, Auschecken, Einchecken, Auschecken verwerfen, Öffnen und auschecken, Eigenschaften anzeigen, Eigenschaften bearbeiten, Verwalten, Versionsverlauf, Dokumentberechtigungen, Dokument löschen, Link als E-Mail versenden, Benachrichtigen, Freigeben und verfolgen, Kopie herunterladen, Kopie, Kopien verwalten, Gehe zu Quellcode, Kopien, Senden an, Workflows, Veröffentlichen, Genehmigen/Ablehnen, Genehmigung abbrechen, Veröffentlichen, Genehmigen/Ablehnen, Gefällt mir, Kategorien und Notizen, Kategorien und Notizen

Dokumente	Typ	Name	Geändert	Version	Dokumententyp	Kommentar zum Einchecken	Ausgecheckt von	Geändert von	Inhaltstyp	Vorlagentypen (Angebot)
Projektdokumente		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot allgemein (1)								
Vorlagen		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot allgemein (english) (2)								
Vorlagen (Angebot)		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot Baukasten (2)								
Vorlagen (Auftragsbestätigung)		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot Baukasten (english) (2)								
Vorlagentypen		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot Call of Services (1)								
Vorlagentypen (Angebot)		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot CEO Chats EADS (1)								
Vorlagentypen (Auftragsbestätigung)		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot Change Request (3)								
		Angebotsvorlage_Change Request	26.01.2015 13:46	9.5	Angebot			Franziska Huebner	Vorlage (Angebot)	Angebot Change Request
		Referenzkundenvereinbarung_de_allgemein	27.11.2015 16:12	6.0	Anlage			Rico Fleischer	Vorlage (Angebot)	Angebot Change Request
		BC_Risikoliste_extern	27.11.2015 16:14	0.2	Interne Anlage			Rico Fleischer	Vorlage (Angebot)	Angebot Change Request
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot Change Request (english) (1)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot Change Request DE-Mail (1)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot Change Request Telekom Deutschland Geschäftskunden (2)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot doculife - direkt extern (4)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot doculife - LIA (5)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot doculife - Telekom Deutschland Geschäftskunden (6)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot doculife - T-Systems extern (5)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot doculife - T-Systems intern (5)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot GHS Dienstvertrag (1)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot GHS Werkvertrag (1)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot LIA Dienstvertrag SI-Leistungen (1)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot LIA Werksvertrag SI-Leistungen (1)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot Microsoft Lync Teststellung/Miete (2)								
		Vorlagentypen (Angebot) : Angebot PF 65 - Monitoring TMART (1)								

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT – PRAXIS

The screenshot shows a SharePoint library named 'Bibliothek' containing various document templates. The 'Angebotsvorlage_Change Request' template is highlighted. A preview window is open, showing the document content with several fields highlighted in pink to indicate data binding.

1 CHANGE REQUEST - [ANGEBOTSTITEL]

1.1 PROJEKTDATEN

Auftraggeber	
Projektnummer (Projekt-ID)	[Projekt-ID]
Angebotsnummer	[Angebotsnummer]
Vertrag (Bezeichnung, Datum)	
Laufende Nr. des Change Request (z. B. 0001)	
Version/ Datum des Change Request	
Beschreibung des Change Requests	[Angebotsbeschreibung]

1.2 UNTERSCHRIFTEN (AUFTRAGNEHMER)

Wir halten uns an das vorliegende Angebot bis zum [Bindefrist] gebunden.

Die Parteien sind sich darüber einig, dass für die Einhaltung des Schriftformerfordernisses die allgemeine (einfache) elektronische Signatur ausreichend, jedoch mindestens erforderlich ist.

Dieses Dokument wurde elektronisch genehmigt von:

[Genehmigung2] [Genehmigung1]

T-Systems Multimedia Solutions GmbH T-Systems Multimedia Solutions GmbH

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Allgemein

In Scheduler öffnen Aktionen

Projektkategorie B

Risiko

Allgemein

Projekt-ID 8000372
 Projektname CA PPM Clarity User Group – DACH
 Beschreibung Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management Reporting
 Anfangsdatum 30.11.2015
 Enddatum 30.11.2015
 Kunde CA Deutschland GmbH
 Ansprechpartner Kunde Steffen Schostok
 Endkunde (Leistungsempfänger) Idesign GmbH
 Ansprechpartner Endkunde Jörg Leute
 Sales Manager

Hauptprojekt
 Vertragsstatus Lösung erarbeiten (30%)
 Projektstatus Nicht Genehmigt
 Projektleiter Fleischer, Rico
 Stellvertreter
 Projekttyp Produktiv Projekt
 Leistungskategorie Lösungsentwicklung
 Topprojekt
 Programm
 Vorlage
 Scheduler-Format Workbench
 Link zur Verkaufschance
 Link zum Projektordner (SharePoint)

Kaufmännische Informationen

Projektwert
 durchschnittl. Stundensatz
 Geschätzter Aufwand (Ph)
 Vertragsart
 Abrechnungsmodus
 Reisekostenabrechnungsart

Organisationsorientierte Strukturpläne

T-Systems MMS OBS Programm
 T-Systems MMS OBS Projekte /MMS/8000372
 Abteilung /MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden Hilfe Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Stammdaten Eigenschaften Zugriff auf dieses Projekt

Teilprojekte Allgemein Gesamtansicht

Abhängigkeiten AAM Ressource

Basisplan Finanzen Gruppe

Schätzung Projektkategorie OSP-Einheit

Risikobewertung

Schutzbedarfsanalyse

Angebot Liste

Rechnung Liste

Statusmeldung Liste

Gewährleistung

Monatsabschluss

Earned Value Analyse

Anfangsdatum 06.07.2015

Risiko

Hauptprojekt

Vertragsstatus Auftrag (Signed) (100%)

Projektstatus Genehmigt

Projektleiter Fleischer, Rico

Stellvertreter

Projekttyp Produktiv Projekt

Leistungskategorie Lösungsentwicklung

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Angebot Liste

Filter: Systemstandardwert

Angebotsdokument	Angebotsnummer	Angebotsumfang (Ph)	Angebotswert	Angebotsstatus	Erstellt am	Abgegeben am	Bindefrist	Prozess Kommentar	Prozess Informationen
0029751-01-01	Accessib_Usab_Test_Teammate	224,00	26.432,00	Abgegeben	26.05.15	03.06.15	26.06.15	(Leer)	Am 2015/06/03 um 15:32 von Ehrentraut, Paul auf "Versand erledigt" gesetzt.

Speichern **Neu** Zurückkehren

Währung = EUR

Projektwert 26.432,00

durchschnittl. Stundensatz 118,00

Geschätzter Aufwand (Ph) 224,00

Vertragsart Werkvertrag

Abrechnungsmodus Zahlungsplan

Reisekostenabrechnungsart Ist-Aufwand (Pauschalen)

Organisationsorientierte Strukturpläne

T-Systems MMS OBS Programm

T-Systems MMS OBS Projekte /MMS/0029751

Abteilung /MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

Erforderlich * = Eindeutig = Locked by Process

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Angebot erstellen

Allgemein

Angebotstitel: Clarity Geschäftsprozessintegration

Angebotsbeschreibung:

Angebotsvorlage: **Angebot Change Request**

Angebotswert: 300000

Angebotsumfang (Ph): 3000

Stundensatz: 100

Bindefrist: 15.12.15

Vertragsart: Dienstvertrag

Abrechnungsmodus: Monatlich

Reisekostenabrechnungsart: Ist-Aufwand (Einzelnachweise)

Anmerkungen Reisekostenabrechnungsart:

Versandart: Per E-Mail

Anmerkungen Versandart: Durch PL

Zusatzangaben

Zusatzprüfer:

Öffentliche Ausschreibung:

Gemäß AGB:

Einkaufsrelevante Leistungen enthalten

Anmerkungen einkaufsrelevante Leistungen:

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

= Erforderlich = Einmal eingeben

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden Hilfe Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Prozesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Angebot: Clarity Geschäftsprozessintegration - Allgemein

Allgemein

Angebotsnummer	0029751-02-01	Angebotsstatus	Bearbeitung
Angebotsstitel	Clarity Geschäftsprozessintegration	Prozessinformationen	Das Angebot wird dem PL zur Bearbeitung vorgelegt
Angebotsbeschreibung		Prozesskommentar	
Angebotsvorlage	Angebot Change Request	Angebotsdokument	
Angebotswert	300.000,00	Angebotsordner	
Angebotsumfang (Ph)	3.000,00	Anlagen in Sharepoint	
Stundensatz	100,00	Versandart	Per E-Mail
Vertragsart	Dienstvertrag	Anmerkungen Versandart	Durch PL
Abrechnungsmodus	Monatlich	Bindefrist	15.12.2015
Reisekostenabrechnungsart	Ist-Aufwand (Einzelnachweise)	Abgabedatum	
Anmerkungen Reisekostenabrechnungsart			

Zusatzinformationen

Zusatzprüfer		Öffentliche Ausschreibung	<input type="checkbox"/>
Einkaufsrelevante Leistungen enthalten	<input type="checkbox"/>	Gemäß AGB	<input type="checkbox"/>
Anmerkungen einkaufsrelevante Leistungen		Risikoliste vorhanden	<input type="checkbox"/>
		Anmerkungen AAM	

Abhängigkeiten

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT – PRAXIS

The screenshot displays the Clarity Viewer interface. The top navigation bar includes 'Websteaktionen', 'Durchsuchen', and 'Bibliothekstools'. The main content area shows a list of documents with columns for 'Typ', 'Name', 'Version', 'Kommentar zum Einchecken', 'Erstellt', 'Geändert', 'Geändert von', 'Ausgecheckt von', 'Inhaltstyp', 'Bearbeiter AAM', 'Projekt-ID', 'Projektname', 'Angebotstitel', 'Angebotsnummer', 'Angebotsbeschreibung', 'Bindefrist', and 'Gene'. A table lists documents such as 'Anlagen' (version 1.0), 'Final' (version 1.0), and 'Interne Anlagen' (version 1.0). A context menu is open over the 'Interne Anlagen' document, with 'Berechtigungen verwalten' highlighted. A second screenshot shows a document titled 'BC_Risikoliste_extern' (version 1.0) with a 'NEU' status, and a list of participants for electronic signing.

(einfache) elektronische Signatur ausreichend, jedoch mindestens erforderlich ist.

Dieses Dokument wurde elektronisch genehmigt von:

[Genehmigung2]

T-Systems Multimedia Solutions GmbH

[Genehmigung1]

T-Systems Multimedia Solutions GmbH

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ANGEBOT – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer [Abmelden](#) | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten ↻ 🏠 🔍

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Angebot Liste 📅 In Scheduler öffnen

Filter: Systemstandardwert ⚙️

Angebotsdokument	Angebotsordner	Angebotsnummer	Angebots-titel	Angebots-umfang (Ph)	Angebotswert	Angebots-status	Erstellt am	Abgegeben am	Bindefrist	Prozess Kommentar	Prozess Informationen
<input type="checkbox"/>		0029751-01-01	Accessib_Usab_Test_Teammate	224,00	26.432,00	Abgegeben	26.05.15	03.06.15	26.06.15	(Leer)	Am 2015/06/03 um 15:32 von Ehrentraut, Paul auf "Versand erledigt" gesetzt.
<input type="checkbox"/>		0029751-02-01	Clarity Geschäftsprozessintegration	3.000,00	300.000,00	Bearbeitung	27.11.15		15.12.15		Das Angebot wird dem PL zur Bearbeitung vorgelegt


1 - 2 von 2 wird angezeigt

Speichern Neu Zurückkehren

Währung = EUR


LEAD TO CASH TEILPROZESSE

ÜBERBLICK

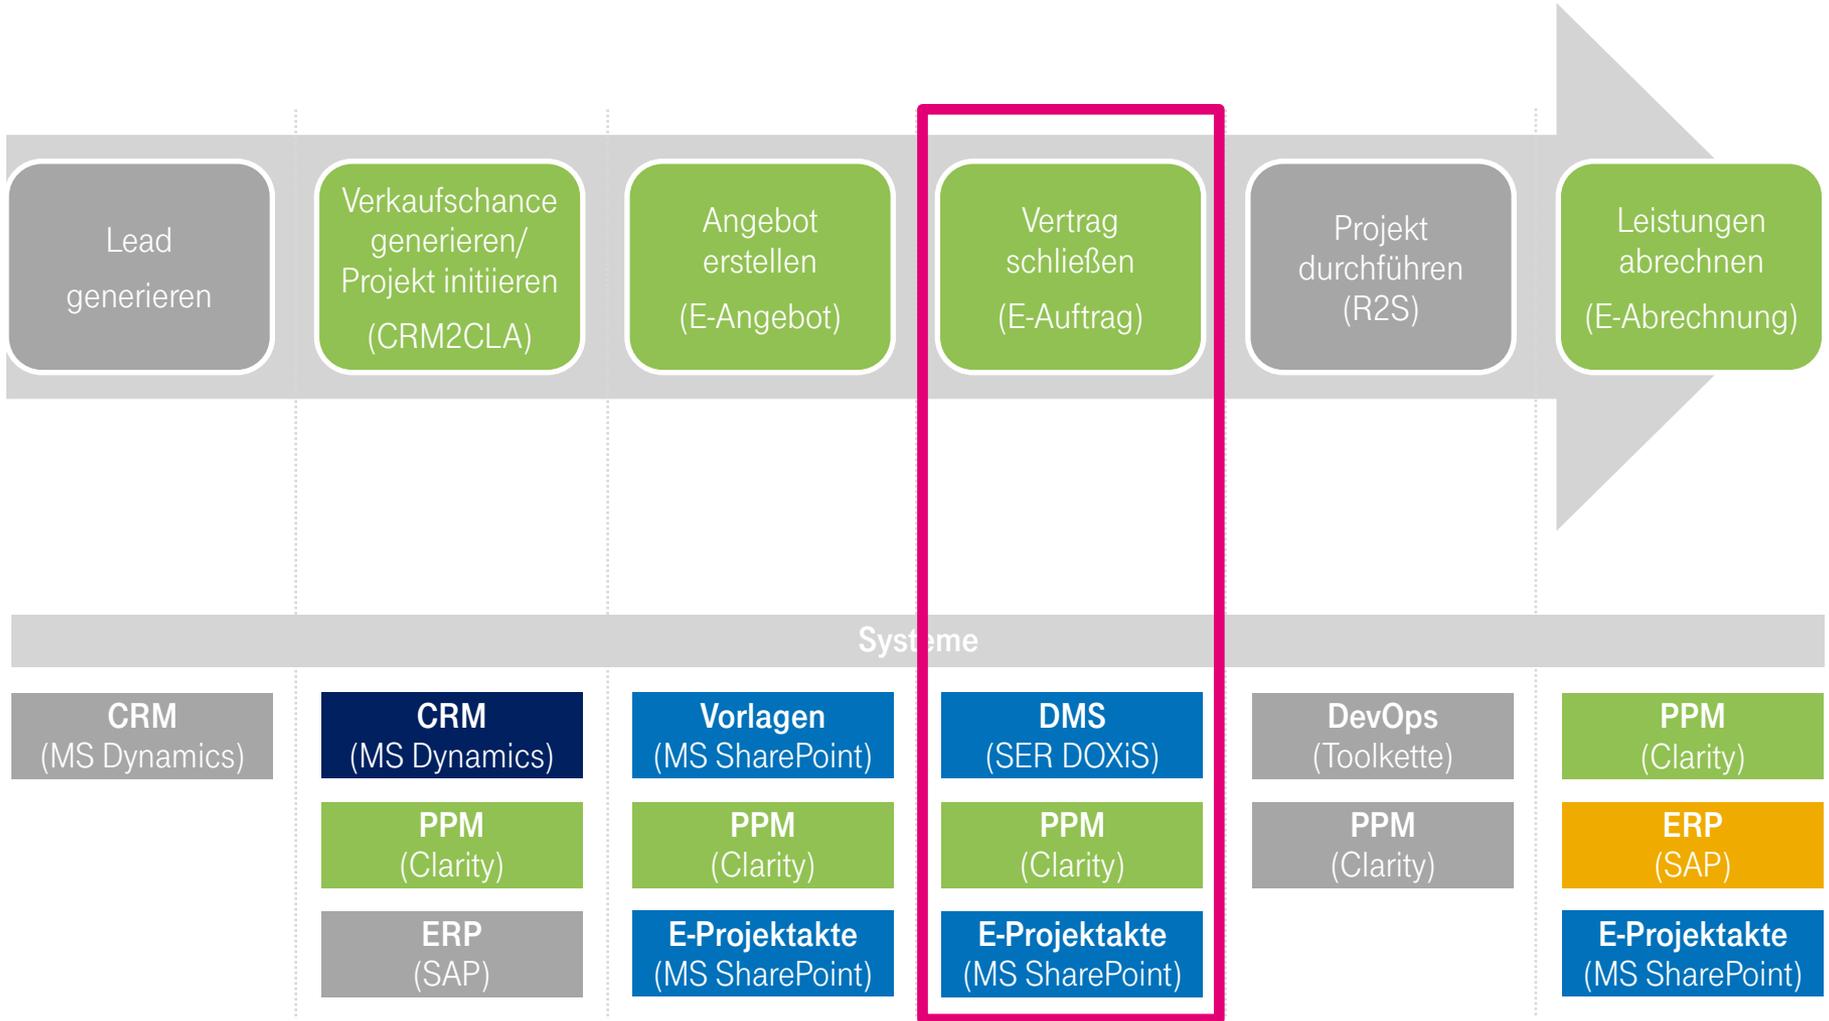

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-AUFTRAG

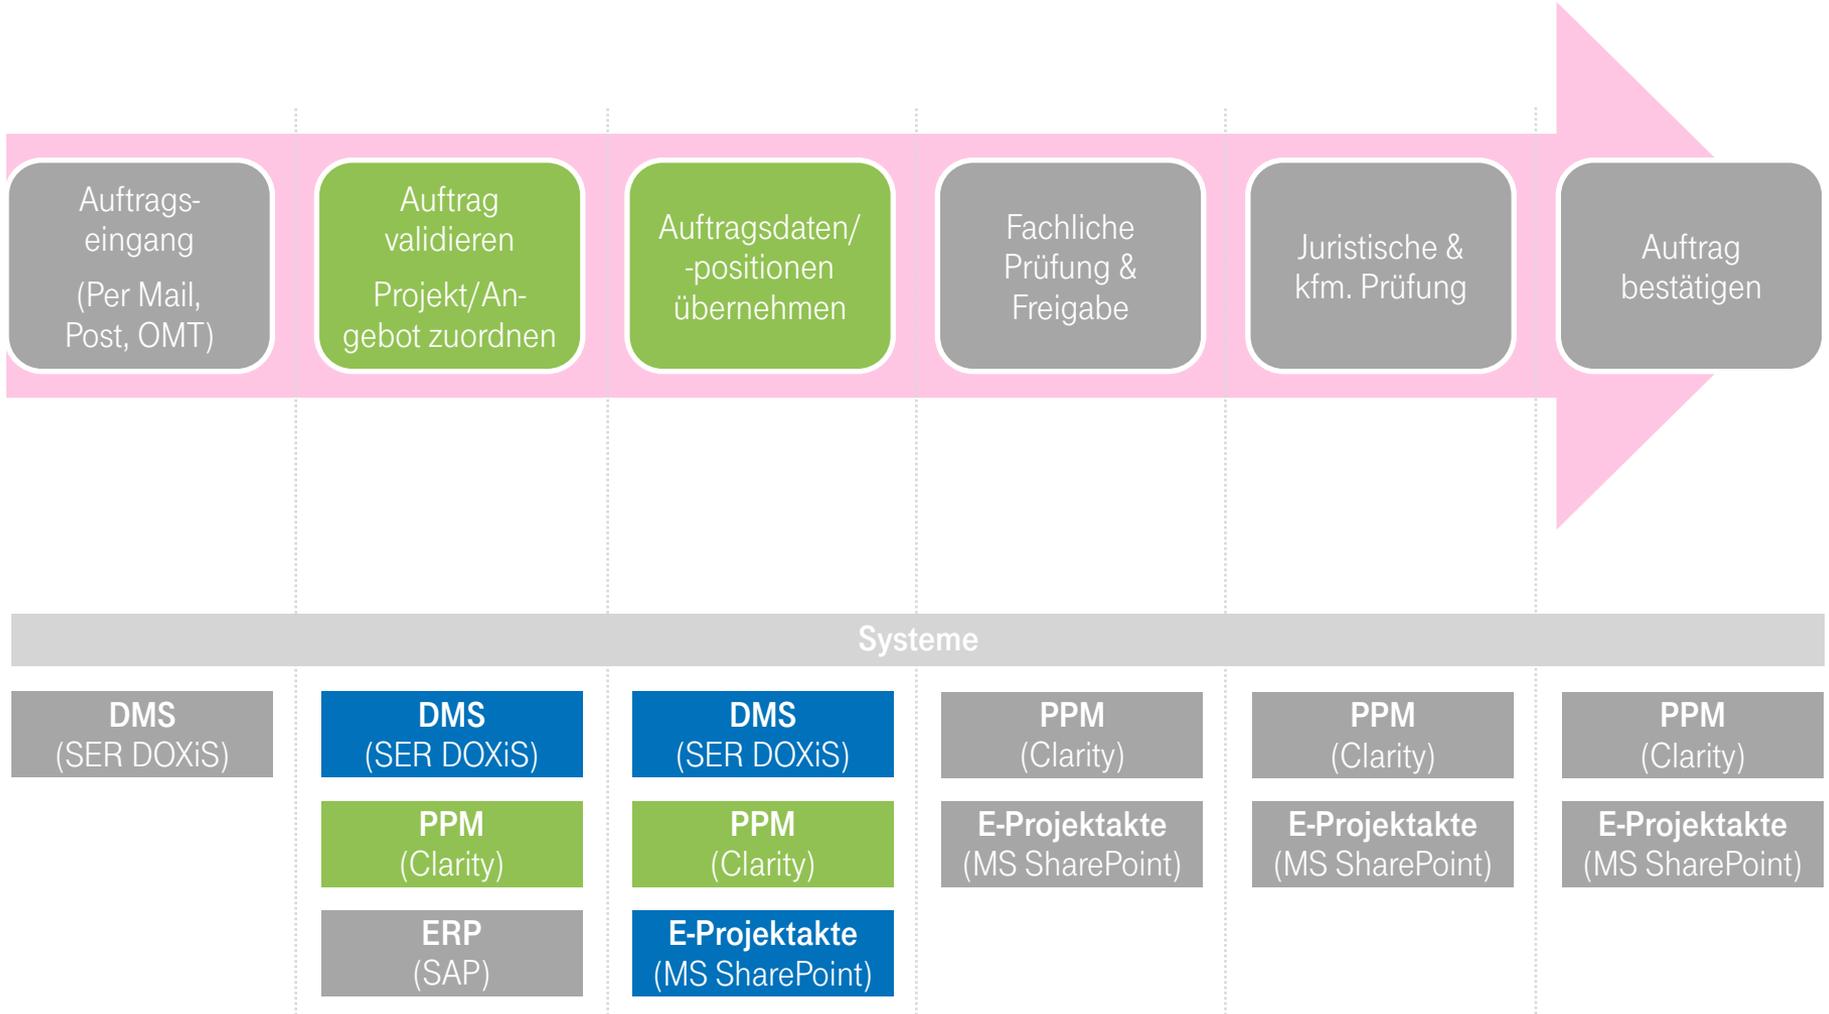

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-AUFTRAG - PRAXIS

Stapel Bearbeiten Ansicht Ordner Dokument Seite Feld Optionen Hilfe

Stapel bearbeiten

Klassifikationsergebnis - 27 Felder gültig, 0 Felder ungültig (12 Felder unsichtbar, 0 Felder schreibgeschützt)

Debitor

Name T-Systems International GmbH, IBAN

Name2 PG 8108, SWIFT

Straße Hahnstraße 43d, Kontonummer

PLZ / Stadt 60528 Frankfurt am Main, Bankleitzahl

GesellschaftsNr 8108, Steuernummer

ID 0000030100, Debitorensuche [F8], USID DE118645675

Abweichender Debitor im Teilauftrag OMT-Beauftragung

Kopfdaten

BestellNr. 4155969462_Nachtrag, AngebotsNr 0029751-01-01, Suche AngebotsNr

Bestelldatum 10.07.2015, ProjektID 0029751, Suche ProjektID

Laufzeit Beginn , Laufzeit Ende , Anzeige Clarity Projekt

Leistungsempfänger /Absender

Leistungsempfänger sms International GmbH (BK 1000 J) Gebäudeunknown Etage- Raumunknown Leipziger Str 58 39112 Magdeburg

Absendekontakt maschinell erzeugt

Absenderadresse Deutsche Telekom AG| Group Procurement| Fasanenweg 5| 70771 Leinfelden - Echterdingen

Auftragsdaten

Tabelle "PositionData", 0 ungültige Zelle(n), Tabelle ist gültig

Export	Positio	Menge	Men	Beschreibung	Einzelpr	Gesamt	AngebotsNr	KA	ProjektID	KP	Clarity	KC	Lau
<input checked="" type="checkbox"/>	00010	1,000	LE	GSD_MC_EWF_11183_KE	26432,00	26432,00	0029751-01-01	<input checked="" type="checkbox"/>	0029751	<input checked="" type="checkbox"/>	https://clarity4	<input checked="" type="checkbox"/>	

Sonstiges

Bemerkung

Aussteuerungsgrund Auftrag in Ordnung (00)

Aktueller Fehler

----- T -----

Deutsche Telekom AG
Group Procurement
Fasanenweg 5, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Datum 10.07.2015
Seite 1 von 2

Bestellnummer 4155969462
USt-IdNr. DE 118645675

Firma T-Systems Multimedia Solutions GmbH
Postfach 10 02 24
01072 Dresden

Anspruchspartner maschinell erzeugt
Telefon
Telefax
E-Mail jennifer.spandau@t-systems.com

Lieferantennummer: 9001300168

Ihr Sachbearbeiter André Meixner
Telefon +49 351 2820 256
Telefax 0351 28205 107
Ihr Angebot **0029751-01-01** vom 02.06.2015

Bestellung
Dies ist keine Bestellung des Einkaufs und dient nur zu internen Zwecken

Lieferanschrift:
Ges.Nr. 8108
T-Systems International GmbH (BK 1000)
Gebäude: unknown
Etage - Raum: unknown
Leipziger Str. 58
39112 Magdeburg

Rechnungsanschrift:
T-Systems International GmbH (PG 8108)
Hahnstraße 43d, 60528 Frankfurt am Main
c/o Postfach 4101
49031 Osnabrück

Kontakt Buchhaltung: 0800-3307555

Zahlungsbedingungen:
innerhalb von 15 Tagen ohne Abzug

Wichtiger Hinweis:
Rechnungen werden nur akzeptiert, wenn ihnen der Leistungsschein als Nachweis hinzugefügt ist. Schlussrechnungen sind bitte als solche zu kennzeichnen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Rechnungen den aktuellen steuerrechtlichen Vorgaben des UStG entsprechen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestellen hiermit die nachstehend bezeichneten Lieferungen/Leistungen im Namen und auf Rechnung der in der Rechnungsanschrift genannten Gesellschaft zu den folgenden Bedingungen. Als Vertragsbestandteile gelten in nachstehender Reihenfolge

- diese Bestellung
- die Leistungsbeschreibung
- die Einkaufsbedingungen für die Beauftragung von ICT-Projekten der Deutschen Telekom (EB ICT-Projekte, Stand Mai 2015)
- Ihr Angebot, soweit im Betreff genannt.

Weitere wichtige Informationen stehen Ihnen im Internet unter dem Link www.zuplier.t-telekom.de zur Verfügung.

Hausanschrift: Deutsche Telekom AG
Group Procurement, Fasanenweg 5, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Postanschrift: Fasanenweg 5, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 69 60531-5, **Telefax:** +49 69 60531-499, **Internet:** www.telekom.de
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 500 100 66), **Kto.Nr.:** 166095662
BANK: DE05590100600100095662, **SWIFT/BIC:** FBWIDE3300
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Ulrich Lehner (Vorsitzender)
Vorstand: Timotheus Höttges (Vorsitzender), Reinhard Clemens, Niek Jan van Damme, Thomas Dannenfeldt, Dr. Thomas Kretmer, Claudia Nemat
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 6794, Sitz der Gesellschaft: Bonn
USt-IdNr.: DE 123415223

Fortsetzung auf Seite 2

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-AUFTRAG - PRAXIS

Stapel Bearbeiten Ansicht Ordner Dokument Seite Feld Optionen Hilfe

Klassifizierungsergebnis - 27 Felder gültig, 0 Felder ungültig (12 Felder unsichtbar, 0 Felder schreibgeschützt)

Debitor

Name T-Systems International GmbH, IBAN

Name2 PG 8108, SWIFT

Straße Hahnstraße 43d, Kontonummer

PLZ / Stadt 60528 Frankfurt am Main, Bankleitzahl

GesellschaftsNr 8108, Steuernummer

ID 0000030100, USID DE118645675

Abweichender Debitor im Teilauftrag OMT-Beauftragung

Debitorensuche [F8]

Kopfdaten

BestellNr. 4155969462_Nachtrag, AngebotsNr. 0029751-01-01, Suche AngebotsNr.

Bestelldatum 10.07.2015, ProjektID 0029751, Suche ProjektID

Laufzeit Beginn , Laufzeit Ende , Anzeige Clarity Projekt

Leistungsempfänger /Absender

Leistungsempfänger sms International GmbH (BK 1000 | Gebäudeunknown Etage- Raumunknown Leipziger Str 58 39112 Magdeburg ...)

Absendekontakt maschinell erzeugt

Absenderadresse Deutsche Telekom

Auftragsdaten

Tabelle "PositionData": 0 ungültige Zelle(n)

Export	Positio	Menge	Men
<input checked="" type="checkbox"/>	00010	1,000	LE

Sonstiges

Bemerkung

Aussteuerungsgrund Auftrag in Or

Bestellung

Deutsche Telekom AG
Group Procurement
Fasanenweg 5, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Datum 10.07.2015
Seite 1 von 2

Firma T-Systems Multimedia Solutions GmbH
Postfach 10 02 24
01072 Dresden

Lieferantenummer: 9001300168

Bestellnummer 4155969462
USt-IdNr. DE 118645675

Ansprechpartner maschinell erzeugt
Telefon
Telefax
E-Mail jennifer.spanda@t-systems.com

Ihr Sachbearbeiter André Meixner
Telefon +49 351 2820 256
Telefax 0351 28205 107
Ihr Angebot 0029751-01-01 vom 02.06.2015

Bestellung
Dies ist keine Bestellung des Einkaufs und dient nur zu internen Zwecken

Clarity Projektsuche

Nach welchem Projekt suchen Sie?

PROJECT_CODE	PROJECT_NAME
1 002975	
2 0029751	CA PPM Clarity User Group - DACH
3 0029754	Abnahmevertrag Retail Solution ilo-profit
4 0029756	Westerwald Bank Lizenzen Videoberatung (Wirkb
5 0029757	SeCelT-Unterstützung "Betrieb & Get Well-Phase

Suchen

DOXG4 Inbound Center SLX - Validierung

Alle Dokumente des Stapels [30.11.2015 07:32:39_26432_00_0029751-01-01_4155969462_T-Systems International GmbH,] sind gültig. Soll der Stapel geschlossen werden?

OK Abbrechen

OFFER_TITLE

Accessib_Usab_Test_Teammate

Westerwald Bank Lizenzen Videoberatung
SeCelT-Unterstützung "Betrieb & Get Well-Phase für RC 15.2 und 15.3"

OK Abbrechen Hilfe

Mit "Ctrl + Enter" wählen Sie einen Eintrag aus und schließen den Dialog.

Aktueller Fehler

USt-IdNr. DE 123456789

Fortsetzung auf Seite 2

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-AUFTRAG – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Zusammenarbeit Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Allgemein

In Scheduler öffnen Aktionen

Projektkategorie B

Risiko

Allgemein

Projekt-ID 8000372
Projektname CA PPM Clarity User Group – DACH
Beschreibung Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management Reporting
Anfangsdatum 30.11.2015
Enddatum 30.11.2015
Kunde CA Deutschland GmbH
Ansprechpartner Kunde Steffen Schostok
Endkunde (Leistungsempfänger) Idesign GmbH
Ansprechpartner Endkunde Jörg Leute
Sales Manager

Hauptprojekt
Vertragsstatus Lösung erarbeiten (30%)
Projektstatus Nicht Genehmigt
Projektleiter Fleischer, Rico
Stellvertreter
Projekttyp Produktiv Projekt
Leistungskategorie Lösungsentwicklung
Topprojekt
Programm
Vorlage
Scheduler-Format Workbench
Link zur Verkaufschance
Link zum Projektordner (SharePoint)

Kaufmännische Informationen

Projektwert
durchschnittl. Stundensatz
Geschätzter Aufwand (Ph)
Vertragsart
Abrechnungsmodus
Reisekostenabrechnungsart

Organisationsorientierte Strukturpläne

T-Systems MMS OBS Programm
T-Systems MMS OBS Projekte /MMS/8000372
Abteilung /MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-AUFTRAG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Stammdaten Eigenschaften Zugriff auf dieses Projekt

Teilprojekte Allgemein Gesamtansicht

Abhängigkeiten AAM Ressource

Basisplan Finanzen Gruppe

Schätzung Projektkategorie OSP-Einheit

Risikobewertung

Schutzbedarfsanalyse

Vorleistung

Teilauftrag Liste

Rechnung Liste

Statusmeldung Liste

Gewährleistung

Monatsabschluss

Earned Value Analyse

Anfangsdatum 06.07.2015

Enddatum 31.03.2016

Kunde CA Deutschland GmbH

Risiko

Hauptprojekt

Vertragsstatus Auftrag (Signed) (100%)

Projektstatus Genehmigt

Projektleiter Fleischer, Rico

Stellvertreter

Projekttyp Produktiv Projekt

Leistungskategorie Lösungsentwicklung

Topprojekt

Programm

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Teilauftrag Liste

Filter: Systemstandardwert

Auftrags-dokument	Auftrags-ordner	Datensatz-Nr.	Bestellnummer	Beauftragte Stunden	Auftragswert	Bearbeitungsstatus	Auftragsstatus	Bestellt am	Erfasst am	Bestätigt am	Prozesskommentar	Prozessinformationen	Beauftragt	Erstellt von
		001	4155969462	224,000	26.432,00	Abgeschlossen	Mit Änderungen angenommen	10.07.15	25.08.15	27.08.15	(Leer)	Am 2015/08/27 um 08:56 von Vo Ta, Nam auf "Versand erledigt" gesetzt.	✓	Administrator, Niku
		002	4155969462_Nachtrag	0,000	26.432,00	Prüfung/Freigabe PL	Erfasst	10.07.15	30.11.15			Der Teilauftrag wird dem PL zur Prüfung/Freigabe vorgelegt.	✓	Administrator, Niku
Summe					52.864,00									

Speichern Neu Zurückkehren

1 - 2 von 2 wird angezeigt

T-Systems MMS OBS Programm

T-Systems MMS OBS Projekte /MMS/0029751

Abteilung /MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-AUFTRAG – PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Prozesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Teilauftrag: 4155969462_Nachtrag - Teilauftrag Eigenschaften

Allgemein

Datensatz-Nr.	002	Auftragsstatus	Erfasst
Bestellnummer	4155969462_Nachtrag	Bearbeitungsstatus	Prüfung/Freigabe PL
Bestelldatum	10.07.2015	Prozessinformationen	Der Teilauftrag wird dem PL zur Prüfung/Freigabe vorgelegt.
Absender-Kontakt	maschinell erzeugt	Prozesskommentar	
Absender-Adresse	Deutsche Telekom AG Group Procurement Fasanenweg 5 70771 Leinfelden - Echterdingen	Auftragsdokument	
Leistungsempfänger	GesNr8108 T - Systems International GmbH (BK 1000) Gebäudeunknown Etage- Raumunknown Leipziger Str 58 39112 Magdeburg	Auftragsordner	
Laufzeit Beginn		Auftrag bestätigt	
Laufzeit Ende		Auftragswert	26.432,00
		Auftragswert (Leistung)	0,00
		Beauftragte Stunden	0,000

Zusatzinformationen

Individueller Objektschlüssel		Beauftragt	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatzprüfer		Genehmiger 1	
Debitor abweichend zum Projekt		Status Genehmiger 1	
Bemerkungen		Genehmigungsdatum 1	
		Genehmiger 2	
		Status Genehmiger 2	
		Genehmigungsdatum 2	

Abhängigkeiten

Rechnungspositionen	Verknüpfte Projekte
Rechnungspositionen (2)	Verknüpfte Angebote
Rechnungspositionen (3)	0029751-01-01
Rechnungspositionen (4)	

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-AUFTRAG – PRAXIS

The screenshot displays a web-based document management interface. On the left, a sidebar shows a navigation tree with 'E-Akte' and 'Projekt Dokumente'. The main area shows a document list with columns for 'Name', 'Version', and 'Kommentar zum Einchecken'. A document titled 'Auftrag-4155969462_Nachtrag_2015-11-30_8-10' is highlighted in a pink box. Below the list, there is a 'Dokument hinzufügen' button. On the right, a detailed order form is displayed, featuring a T-Systems logo at the top. The form includes contact information for Deutsche Telekom AG and T-Systems Multimedia Solutions GmbH, as well as order details such as 'Datum', 'Seite', 'Bestellnummer', 'USt-IdNr.', 'Anspruchspartner', 'Telefon', 'Telefax', 'E-Mail', 'Ihr Sachbearbeiter', and 'Ihr Angebot'. At the bottom, there are sections for 'Bestellung', 'Lieferanschrift', 'Rechnungsanschrift', and 'Zahlungsbedingungen'.

Name	Version	Kommentar zum Einchecken
Interne Anlagen	1.0	
Auftrag-4155969462_Nachtrag_2015-11-30_8-10 NEU	2.0	Aktualisierung der Meta- durch Clarity

Bestellung
Dies ist keine Bestellung des Einkaufs und dient nur zu internen Zwecken

Lieferanschrift:	Rechnungsanschrift:
Ges.Nr. 8108 T-Systems International GmbH (BK 1000) Gebäude: unknown Etage: - Raum: unknown Leipziger Str. 58 39112 Magdeburg	T-Systems International GmbH (PG 8108) Hahnstraße 43d, 60528 Frankfurt am Main c/o Postfach 4101 49031 Osnabrück

Zahlungsbedingungen:
innerhalb von 15 Tagen ohne Abzug

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-AUFTRAG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Proesse

Allgemein Zugriff auf dieses Objekt

Auftragsposition Liste

Administration

Gesamtansicht

Ressource

Gruppe

OSP-Einheit

Teilauftrag: 4155969462_Nachtrag - Teilauftrag Eigenschaften

Auftragsstatus Erfasst

Bearbeitungsstatus Prüfung/Freigabe PL

Prozessinformationen Der Teilauftrag wird dem PL zur Prüfung/Freigabe vorgelegt.

Prozesskommentar

Bestellnummer 4155969462_Nachtrag

Bestelldatum 10.07.2015

Absender-Kontakt maschinell erzeugt

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Proesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Teilauftrag: 4155969462_Nachtrag - Teilauftrag Eigenschaften

Filter: Systemstandardwert

<input type="checkbox"/>	Positionsnummer▲	Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Beauftragte Stunden	Zugrundeliegendes Angebot
<input type="checkbox"/>	00010	1,000	LE - Leistungseinheit(en)	GSO_MC_EWF_11183_KEO_Adcx_WV_03 LesEin	26.432,00	26.432,00	0,000	0029751-01-01
Summe							26.432,00	

1 - 1 von 1 wird angezeigt

Speichern Neu Löschen Zurückkehren

Debitor abweichend zum Projekt

Bemerkungen

Genehmiger 2

Status Genehmiger 2

Genehmigungsdatum 2

Abhängigkeiten

Rechnungspositionen

Rechnungspositionen (2)

Rechnungspositionen (3)

Rechnungspositionen (4)


Verknüpfte Projekte

Verknüpfte Angebote 0029751-01-01

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren


LEAD TO CASH TEILPROZESSE

ÜBERBLICK

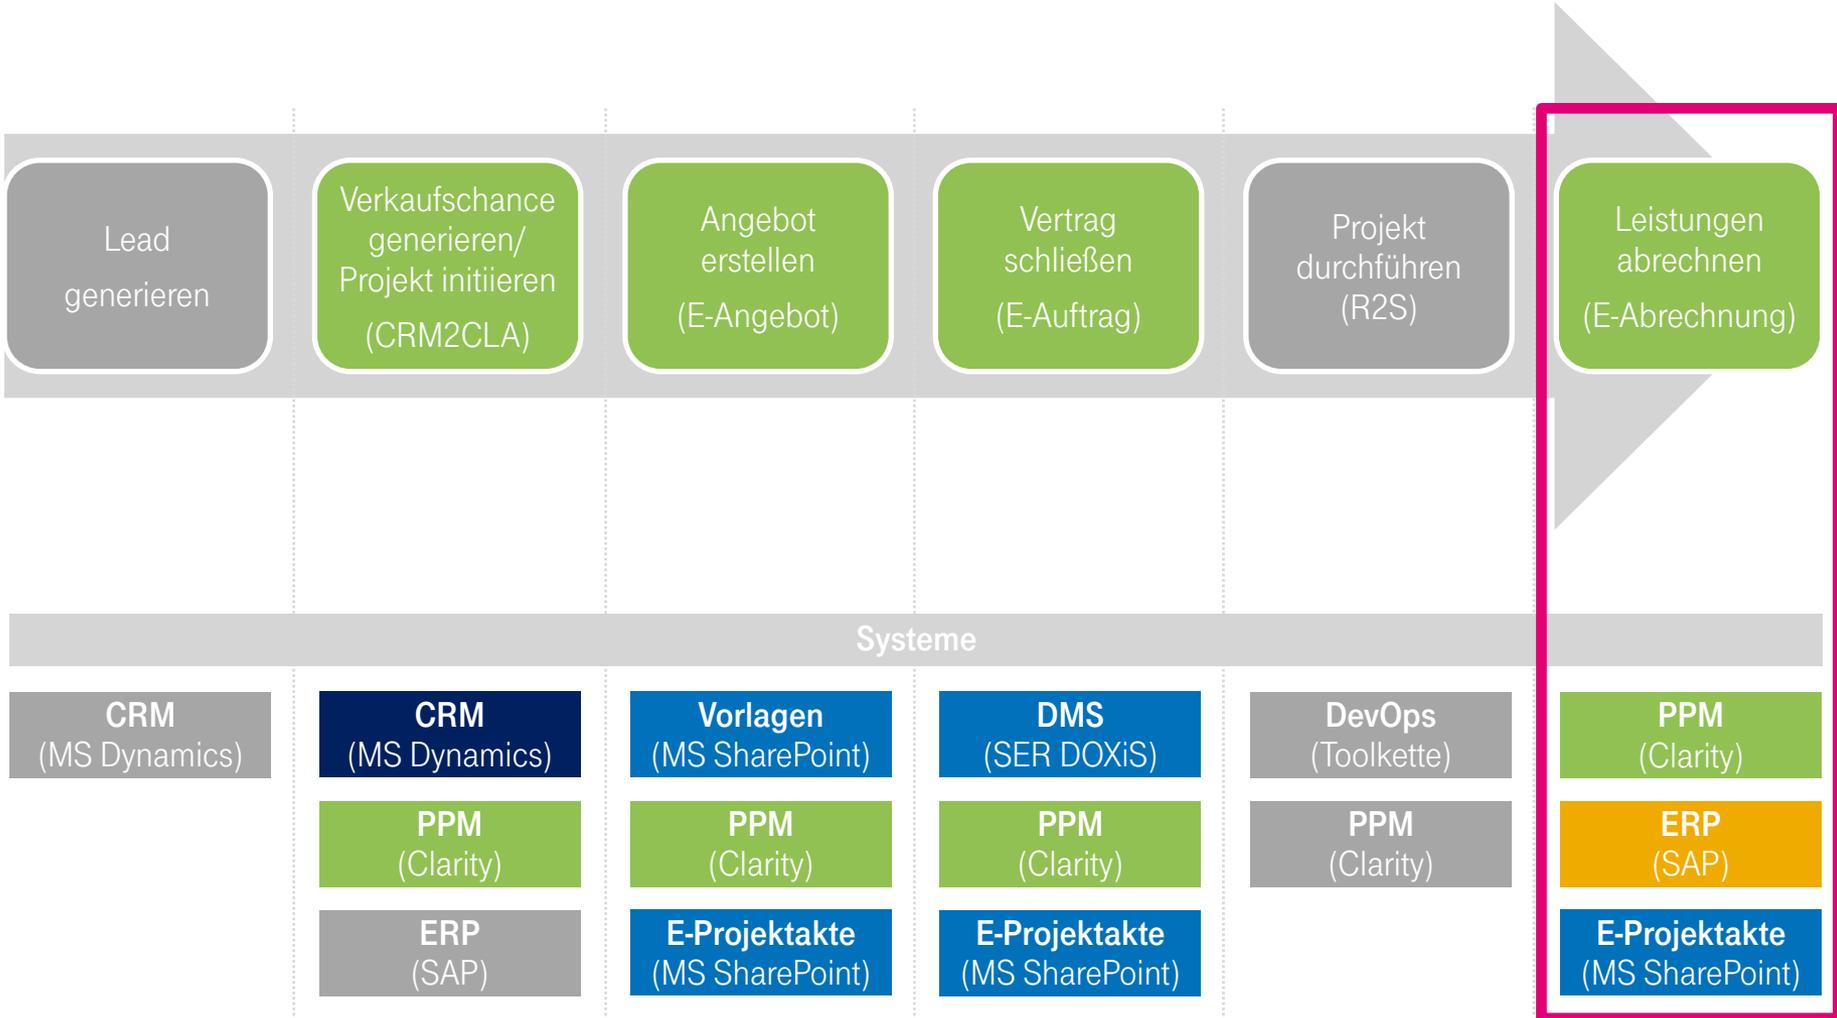

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG

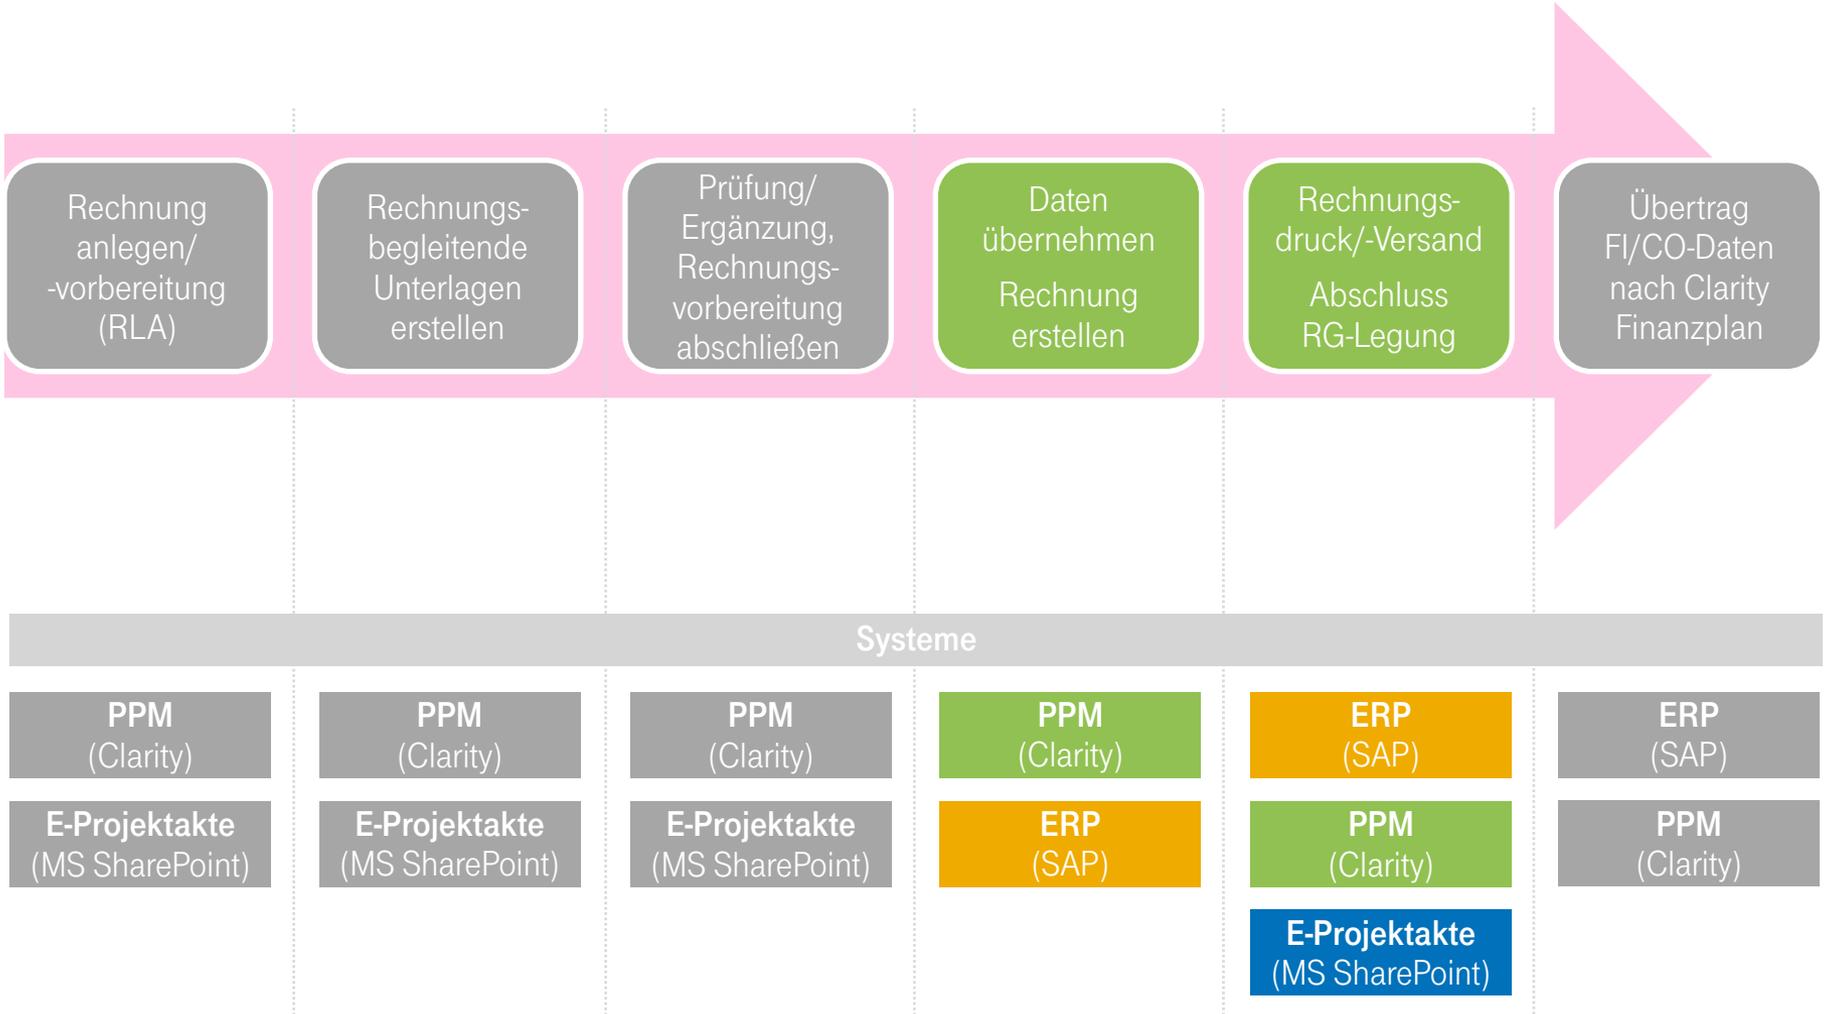

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten 🏠 🔍

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Allgemein In Scheduler öffnen Aktionen

Projektkategorie B Risiko

Allgemein

*Projekt-ID	0029751	Hauptprojekt	
Projektname	CA PPM Clarity User Group – DACH	Vertragsstatus	Auftrag (Signed) (100%)
Beschreibung	Clarity Geschäftsprozessintegration mit übergreifendem Management Reporting	Projektstatus	Genehmigt
Anfangsdatum	06.07.2015	Projektleiter	Fleischer, Rico
Enddatum	31.03.2016	Stellvertreter	
Kunde	CA Deutschland GmbH	Projekttyp	Produktiv Projekt
Ansprechpartner Kunde	Steffen Schostok	Leistungskategorie	Lösungsentwicklung
Endkunde (Leistungsempfänger)	tdesign GmbH	Topprojekt	<input type="checkbox"/>
Ansprechpartner Endkunde	Jörg Leute	Programm	<input type="checkbox"/>
Sales Manager		Vorlage	<input type="checkbox"/>
		Scheduler-Format	Workbench
		Link zur Verkaufschance	
		Link zum Projektordner (SharePoint)	

Kaufmännische Informationen

Projektwert	26.432,00	Vertragsart	Werkvertrag
durchschnittl. Stundensatz	118,00	Abrechnungsmodus	Zahlungsplan
Geschätzter Aufwand (Ph)	224,00	Reisekostenabrechnungsart	Ist-Aufwand (Pauschalen)

Organisationsorientierte Strukturpläne

T-Systems MMS OBS Programm	
T-Systems MMS OBS Projekte	/MMS/0029751
Abteilung	/MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Stammdaten Eigenschaften Zugriff auf dieses Projekt

Stammdaten - Allgemein

Stammdaten
 Teilprojekte
 Abhängigkeiten
 Basisplan
 Schätzung
 Team
 Aufgaben
 Finanzpläne
 Leistungsübersicht
 Hierarchie
 Risiken/Probleme/Änderungen
 Prozesse
 Rückverfolgungspfad
 Dashboard
 Stammdaten - Allgemein
 Stammdaten - Risikobewertung
 Stammdaten - Schutzbedarfsanalyse
 Stammdaten - Vorleistung
 Stammdaten - Angebot Liste
 Stammdaten - Teilauftrag Liste
 Stammdaten - Rechnung Liste
 Stammdaten - Statusänderung Liste
 Stammdaten - Gewährleistung
 Stammdaten - Monatsabschluss
 Stammdaten - Earned Value Analyse

Risiko

Hauptprojekt

Vertragsstatus Auftrag (Signed) (100%)

Projektstatus Genehmigt

Projektleiter Fleischer, Rico

Stellvertreter

Projekttyp Produktiv Projekt

Leistungskategorie Lösungsentwicklung

Anfangsdatum 06.07.2015

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem

Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Team Aufgaben Finanzpläne Leistungsübersicht Hierarchie Risiken/Probleme/Änderungen Prozesse Rückverfolgungspfad Dashboard

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH - Eigenschaften - Stammdaten - Rechnung Liste

Filter: Systemstandardwert

Rechnungs-dokument	Rechnungs- order	Datensatz-Nr.	Rechnungsart	Bestellnummer	Leistungszeitraum	Individueller Objektschlüssel	Abgerechnete Stunden	Rechnungsbetrag	Bearbeitungsstatus	Erstellt am	Fakturiert am	Rechnungsnummer	Prozesskommentar	Prozessinformationen
		001	Rechnung	4155969462	Dezember 2015	Clarity-DACH	224,000	26.445,00	Prüfung/Freigabe AAM	30.11.15			(Leer)	Am 2015/11/30 um 09:19 von Fleischer, Rico auf "Bei AAM einreichen" gesetzt.

1 - 1 von 1 wird angezeigt

Neu Zurückkehren

Geschätzter Aufwand (Ph) 224,00

Reisekostenabrechnungsart ISB-Aufwand (Pauschalen)

Organisationsorientierte Strukturpläne

T-Systems MMS OBS Programm

T-Systems MMS OBS Projekte /MMS/0029751

Abteilung /MMS/MMS 4.0/GB6100 - WMS/BU6008 - AMCS/SF7001 - AMEH

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften **Textpositionen** Kontierungspositionen Prozesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Rechnung: Dezember 2015 - Allgemein

Allgemein

Datensatz-Nr. 001

Rechnungsart Rechnung

Bestellnummer 4155969462

Leistungszeitraum Dezember 2015

Reisekosten angefallen Nein

Anlagen LNW

Bearbeitungsstatus Prüfung/Freigabe AAM

Prozessinformationen Am 2015/11/30 um 09:19 von Fleischer, Rico auf "Bei AAM einreichen" gesetzt.

Prozesskommentar (Leer)

Rechnungsdokument

Rechnungsordner

Nr. SD-Kundenauftrag

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

Nr.

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Textpositionen **Kontierungspositionen** Prozesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Rechnung: Dezember 2015 - Textpositionen

Filter: Systemstandardwert

Auftragspositionsquelle	Abrechnungsrelevant	Menge	Einheit	Bezeichnung	Positionstext	Einzelpreis	Gesamtpreis	Aktueller Gesamtpreis	Restvolumen	Sortierreihenfolge	Quelltextposition der Teilrechnung
(GSO_MC_EWF_11183_KEO_Adcx_WV_03)	✓	1,000	LE - Leistungseinheit(en)	GSO_MC_EWF_11183_KEO_Adcx_WV_03	(Bestell-Pos.: 00010)	26.445,00	26.445,00	26.445,00	0,00		1
Summe							26.445,00				

Speichern Neu Löschen Zurückkehren

1 - 1 von 1 wird angezeigt

Optionen (Nur relevant, wenn sich Auftragspositionen zur ausgewählten Bestellnummer und/oder Leistungserbringung über mehrere Projekte der Projektstruktur verteilen/erstreckt)

Vorbelegung Textpositionen als abrechnungsrelevant Teilrechnungen Projekt, über- und untergeordnete (Auftragspositionen welcher Projekte der Projektstruktur sind für die Abrechnung vorzubelegen?)

Auswahl Leistungsbezug zur Projektstruktur Erbrachte Leistungen als Abzurechnen vorbelegen Projekt und untergeordnete (Erbrachte Leistungen welcher Projekte der Projektstruktur sind für die Abrechnung zu berücksichtigen?)

Abhängigkeiten

Auftragspositionen 0029751 / 001 / 00010 / GSO_MC_EWF_11183_KEO_Adcx_WV_03 / 26.432,00

Rechnungsvorlage Referenzbeleg

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung **Favoriten**

Eigenschaften Textpositionen **Kontierungspositionen** Prozesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Rechnung: Dezember 2015 - Allgemein

Allgemein

Datensatz-Nr. 001

Rechnungsart Rechnung

Bestellnummer 4155969462

Leistungszeitraum Dezember 2015

Reisekosten angefallen Nein

Bearbeitungsstatus Prüfung/Freigabe AAM

Prozessinformationen Am 2015/11/30 um 09:19 von Fleischer, Rico auf "Bei AAM einreichen" gesetzt.

Prozesskommentar (Leer)

Rechnungsdokument

Rechnungsordner

Nr. SD-Kundenauftrag

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Rico Fleischer Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Textpositionen **Kontierungspositionen** Prozesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Rechnung: Dezember 2015 - Kontierungspositionen (Leistungsübersicht)

Filter für Leistungsübersicht (Rechnung)

Von

Bis

Projekt 0029751

Abrechnungsrelevant

Filter Leeren Alle bearbeiten

Leistungsübersicht (Rechnung)

Projekt-ID	Projektname	Transaktionsklasse	Leistungsart	Budget (h)	Budget (€)	Erbracht (h)	Erbracht (€)	Abgerechnet über andere Belege (h)	Abgerechnet über andere Belege (€)	Ist-Umsatz (€)	Abrechnen (h)	Abrechnen (€)	Abrechnen über andere Belege (h)	Abrechnen über andere Belege (€)	Später abrechnen (h)	Später abrechnen (€)	Nicht abrechnen (h)	Nicht abrechnen (€)	Rest (h)	Rest (€)
0029751	CA PPM Clarity User Group – DACH	PF7013_5	Eigen. n.k.	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	(500,00)
0029751	CA PPM Clarity User Group – DACH	PF7025_0	Eigen	224,000	26.432,00	210,000	24.793,00	0,000	0,00	0,00	210,000	24.793,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	14,000	1.639,00
0029751	CA PPM Clarity User Group – DACH	PF7025_1	Fremd	0,000	0,00	14,000	1.652,00	0,000	0,00	0,00	14,000	1.652,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	(14,000)	(1.652,00)
Summe				224,000	26.432,00	224,000	26.445,00	0,000	0,00	0,00	224,000	26.945,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	(513,00)

Abhängigkeiten

Auftragspositionen 0029751 / 001 / 00010 / GSO_MC_EWF_11183_KEO_Adcx_WV_03 / 26.432,00

Rechnungsvorlage Referenzbeleg

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

Details Notizen

Aktionsdetails

Allgemein

Thema Bitte Abrechnung prüfen/freigeben

Erstellt von Administrator, Process

Beschreibung Abrechnung - Dezember 2015

Bitte prüfen Sie die Abrechnung zum Projekt "CA PPM Clarity User Group – DACH" (Fleischer, Rico) und geben diese für die Rechnungslegung frei. Hierzu wechseln Sie bitte über den Link "Objekte" in die Eigenschaften der Abrechnung.

Abschließend erledigen Sie bitte diese Aufgabe unter Angabe des gewünschten Status.

Letzte Prozessinformation:
Am 2015/11/30 um 09:19 von Fleischer, Rico auf "Bei AAM einreichen" gesetzt.

Letzter Prozesskommentar:
(Leer)

Fälligkeitsdatum 07.12.2015 00:00

Objektverknüpfungen

Prozess Rechnungsbearbeitung

Objekte Dezember 2015

Verantwortliche

<input type="checkbox"/>	Nachname	Vorname	Ressourcen-ID	E-Mail	Status	Stellvertreter	Eskaliert
<input type="checkbox"/>	ANKE		ANKE	ANKE@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	admin		admin	mms-clarity@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	KAUL		KAUL	KAUL@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	CAF		CAF	CAF@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	JAGR		JAGR	JAGR@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	MADA		MADA	MADA@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	PAEH		PAEH	PAEH@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	FRBR		FRBR	FRBR@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	ANTR		ANTR	ANTR@mms-dresden.de	Freigeben		
<input type="checkbox"/>	ANSE		ANSE	ANSE@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	KTHI		KTHI	KTHI@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	VIBR		VIBR	VIBR@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	NAVO		NAVO	NAVO@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	MAMR		MAMR	MAMR@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	SNGE		SNGE	SNGE@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	MABU		MABU	MABU@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	SUHI		SUHI	SUHI@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	FHU		FHU	FHU@mms-dresden.de	Offen		
<input type="checkbox"/>	BEGO		BEGO	BEGO@mms-dresden.de	Offen		

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Anka Träger Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Eigenschaften Textpositionen Kontierungspositionen Prozesse

Projekt: CA PPM Clarity User Group – DACH | Rechnung: Dezember 2015 - Allgemein

! WARNUNG: Diese Ansicht kann in diesem Rechnungsstatus nicht bearbeitet werden.

Allgemein

Datensatz-Nr.	001	Bearbeitungsstatus	Abrechnung
Rechnungsart	Rechnung	Prozessinformationen	Der SAP/SD-Kundenauftrag wurde angelegt
Bestellnummer	4155989462	Prozesskommentar	(Leer)
Leistungszeitraum	Dezember 2015	Rechnungsdokument	
Reisekosten angefallen	Nein	Rechnungsordner	
Anlagen	LNW	Nr. SD-Kundenauftrag	2046903
		Rechnungsnummer	
		Rechnungsdatum	
		Nr. SD-Gutschriftsanforderung	
		Rechnungsnummer Storno/Gutschrift	

Zusatzinformationen

Individueller Objektschlüssel	Clarity-DACH	Rechnungsbetrag	26.945,00
Ansprechpartner Kunde abweichend zum Projekt		Abgerechnete Stunden lt. Kontierungspositionen	224,000
Kommentar		Rechnungssumme lt. Kontierungspositionen	26.945,00
		Korrekturbedarf Kontierungspositionen	0,00
		Summe inaktiver Transaktionsklassen	

Optionen (Nur relevant, wenn sich Auftragspositionen zur ausgewählten Bestellnummer und/oder Leistungserbringung über mehrere Projekte der Projektstruktur verteilen/erstreckt)

Vorbelegung Textpositionen als abrechnungsrelevant	Projekt, über- und untergeordnete (Auftragspositionen welcher Projekte der Projektstruktur sind für die Abrechnung vorzubelegen?)	Auswahl Leistungsbezug zur Projektstruktur	Projekt und untergeordnete (Erbrachte Leistungen welcher Projekte der Projektstruktur sind für die Abrechnung zu berücksichtigen?)
Teilrechnungen		Erbrachte Leistungen als Abzurechnen vorbelegen	<input checked="" type="checkbox"/>

Abhängigkeiten

Auftragspositionen	0029751 / 001 / 00010 / GSO_MC_EWF_11183_KEO_Adcx_WV_03 / 26.432,00	Rechnungsvorlage	
		Referenzbeleg	

Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe Beleg 9049014 gesichert

Auftrag MMS 2046903 ändern: Übersicht

Auftrag MMS: 2046903 Nettowert: 26.945,00 EUR
Auftraggeber: 30100 T-Systems International GmbH, / Postfach 41 01 / 49031 Osn...
Warenempfänger: 30100 T-Systems International GmbH, / Postfach 41 01 / 49031 Osn...
Bestellnummer: 4155969462 Bestelldatum:

Verkauf | Positionenübersicht | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Wunschlieferdat: 30.11.2015 Auslieferung:
 Komplettlief. Gesamtgewicht: 0 KG
Liefersperre: Volumen: 0,000
Fakturasperre: Preisdatum: 30.11.2015
Zahlungsbed: ZVDO Incoterms:
Auftragsgrund:
Vertr.bereich: 0128 / 28 / 28 Verkaufsg. MMS, Vertriebsweg MMS, T-Systems MMS

Pos	Material	Auftrags...	ME	Bezeichnung	Betrag	Ptyp	Nettopreis	p.. ME	Nettowert	Wä...	Fakturasperre
10	T-00		1 LE	GSO_MC_EWF_11183_KEO_Adcx_WV_03		ZMTX	26.445,00	1 PT	26.445,00	EUR	
20	T-00		1 LE	Reisekosten		ZMTX	500,00	1 PT	500,00	EUR	
30	0002800040		1 LE	Eigenleistung nicht kontierend		ZMKO	500,00	1 LE	500,00	EUR	
40	0002800000		210 PS	Eigenleistung		ZMKO	944,50	1 PT	24.793,00	EUR	
50	0002800001		14 PS	Fremdleistung kontierend		ZMKO	944,00	1 PT	1.652,00	EUR	

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Anka Träger Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Details Notizen

Aktionsdetails

Allgemein

Thema Bitte SAP/SD-Kundenauftrag fakturieren

Erstellt von Administrator, Process

Beschreibung Abrechnung - Dezember 2015
SD-Kundenauftrag - 2048903

Bitte führen Sie die Abrechnung zum Projekt "CA PPM Clarity User Group - DACH" (Fleischer, Rico) im SAP/SD durch.

Überprüfen Sie hierzu bitte die nach SAP in den o. g. SD-Kundenauftrag übernommen Daten, ergänzen Sie ggf. diese und fakturieren Sie den finalen SD-Kundenauftrag.

Bei Bedarf wechseln Sie bitte über den Link "Objekte" in die Eigenschaften der Abrechnung. Dort finden Sie einen Link auf den SAP/SD-Kundenauftrag.

Abschließend erledigen Sie bitte diese Aufgabe unter Angabe des gewünschten Status.

Letzte Prozessinformation:
Der SAP/SD-Kundenauftrag wurde angelegt

Letzter Prozesskommentar:
(Leer)

Fälligkeitsdatum 07.12.2015 00:00

Objektverknüpfungen

Prozess Rechnungsbearbeitung

Objekte Dezember 2015

Verantwortliche

Nachname	Vorname	Ressourcen-ID	E-Mail	Status	Stellvertreter	Eskaliert
			mms-clarity@mms-dresden.de	Offen		
			CAF@mms-dresden.de			
			ANTR@mms-dresden.de	Faktura erstellt		
			ANSE@mms-dresden.de			
			RFL@mms-dresden.de	Offen		
			MAMR@mms-dresden.de	Offen		
			NAVO@mms-dresden.de	Offen		
			MABU@mms-dresden.de	Offen		
			FHU@mms-dresden.de	Offen		
			NFU@mms-dresden.de	Offen		
			ANKE@mms-dresden.de	Offen		
			KAUL@mms-dresden.de	Offen		
			MADA@mms-dresden.de	Offen		
			JAGR@mms-dresden.de	Offen		
			PAEH@mms-dresden.de	Offen		
			FRBR@mms-dresden.de	Offen		

Speichern Speichern und zurückkehren Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

E-ABRECHNUNG - PRAXIS

T-Systems Multimedia Solutions GmbH / CA Clarity™ PPM - Testsystem Anka Träger Abmelden | Hilfe | Info

Startseite Verwaltung Favoriten

Projekt
T-Systems Multimedia Solutions GmbH
Postfach 10 02 24 - D-01072 Dresden

Allgemein
T-Systems International GmbH,
PG 8108
Hahnstr. 43d, 60528 Frankfurt/Main
c/o
Postfach 41 01
49031 Osnabrück

Rechnung

Ihre Bestellnummer 4155969462	Unser Ansprechpartner Herr Rico Fleischer	Ihr Ansprechpartner Steffen Schostok	Rechnungsnummer 9049014
Projektnummer 0029751	Telefon 0351/2820-2923	Ihre Gesellschafts-nr. 8108	Kundennummer 30100
			Datum 30.11.2015
			Unsere Auftragsnummer 2046903

* Leistungsempfänger: T-Systems International GmbH(BK 1000), Leipziger Str 58, 39112 Magdeburg
* Leistungszeitraum: Dezember 2015

Bezeichnung	Menge	Gesamt (EUR)
000010 GSO_MC_EWF_11183_KEO_Adcx_WV_03 (Bestell-Pos.: 00010)	1,000 LE	26.445,00
000020 Reisekosten (ohne Best.-Pos.)	1,000 LE	500,00

Ggf. zusätzlich angefallene Reisekosten werden gesondert in Rechnung gestellt.
Die Weiterberechnung erfolgt bis spätestens 31.03.2015.

Nettobetrag	MWSt	MWSt Betrag (EUR)	Gesamt (EUR)
26.945,00	0,000	0,00	26.945,00

Zahlungsziel: Bis zum 15.12.2015 ohne Abzug
Ihre Ust.-Id Nr.: DE118645675
Bezüglich der Entgeltsminderungen verweisen wir auf die aktuellen Zahlungskonditionsvereinbarungen.

Bearbeitungsstatus Rechnungsversand vorbereiten

Prozessinformationen Am 2015/11/30 um 10:17 von Träger, Anka auf "Faktura erstellt" gesetzt.

Prozesskommentar

Rechnungsdokumen

Rechnungsordnen

Nr. SD-Kundenauftrag 2046903
Rechnungsnummer 0009049014
Rechnungsdatum 30.11.2015

Nr. SD-Gutschriftsanforderung
Datum
Rechnungsnummer
Storno/Gutschrift

Rechnungsbetrag 26.945,00
Abgerechnete Stunden lt. Kontierungspositionen 224,000
Rechnungssumme lt. Kontierungspositionen 26.945,00
Korrekturbedarf Kontierungspositionen 0,00
Summe inaktiver Transaktionsklassen

Struktur verteilen/erstreckt

Auswahl Leistungsbezug zur Projektstruktur Projekt und untergeordnete (Erbrachte Leistungen welcher Projekte der Projektstruktur sind für die Abrechnung zu berücksichtigen?)


Erbrachte Leistungen als Abzurechnen vorlegen

Rechnungsvorlage
Referenzbeleg

Zurückkehren

LEAD TO CASH TEILPROZESSE

ÜBERBLICK

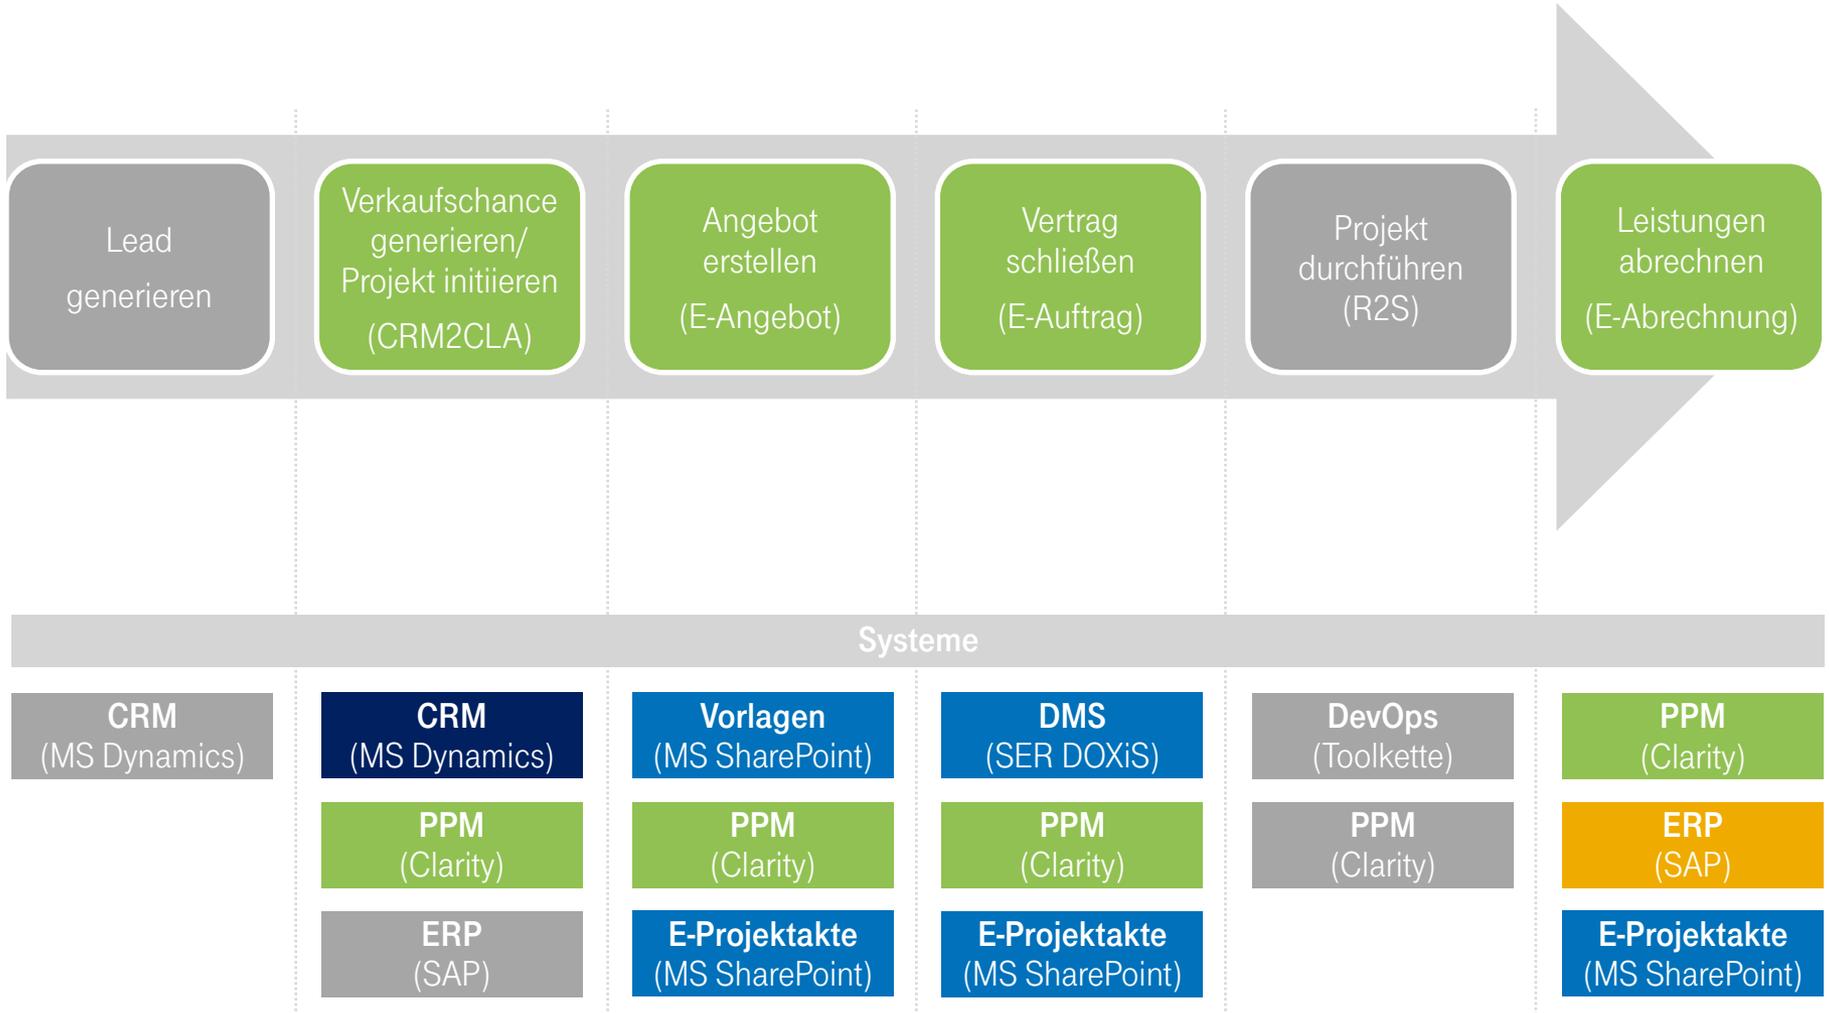


REPORTING PROZESS- ÜBERGREIFENDES

CLARITY vs. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

REPORTING PROZESSÜBERGREIFEND

ABGRENZUNG

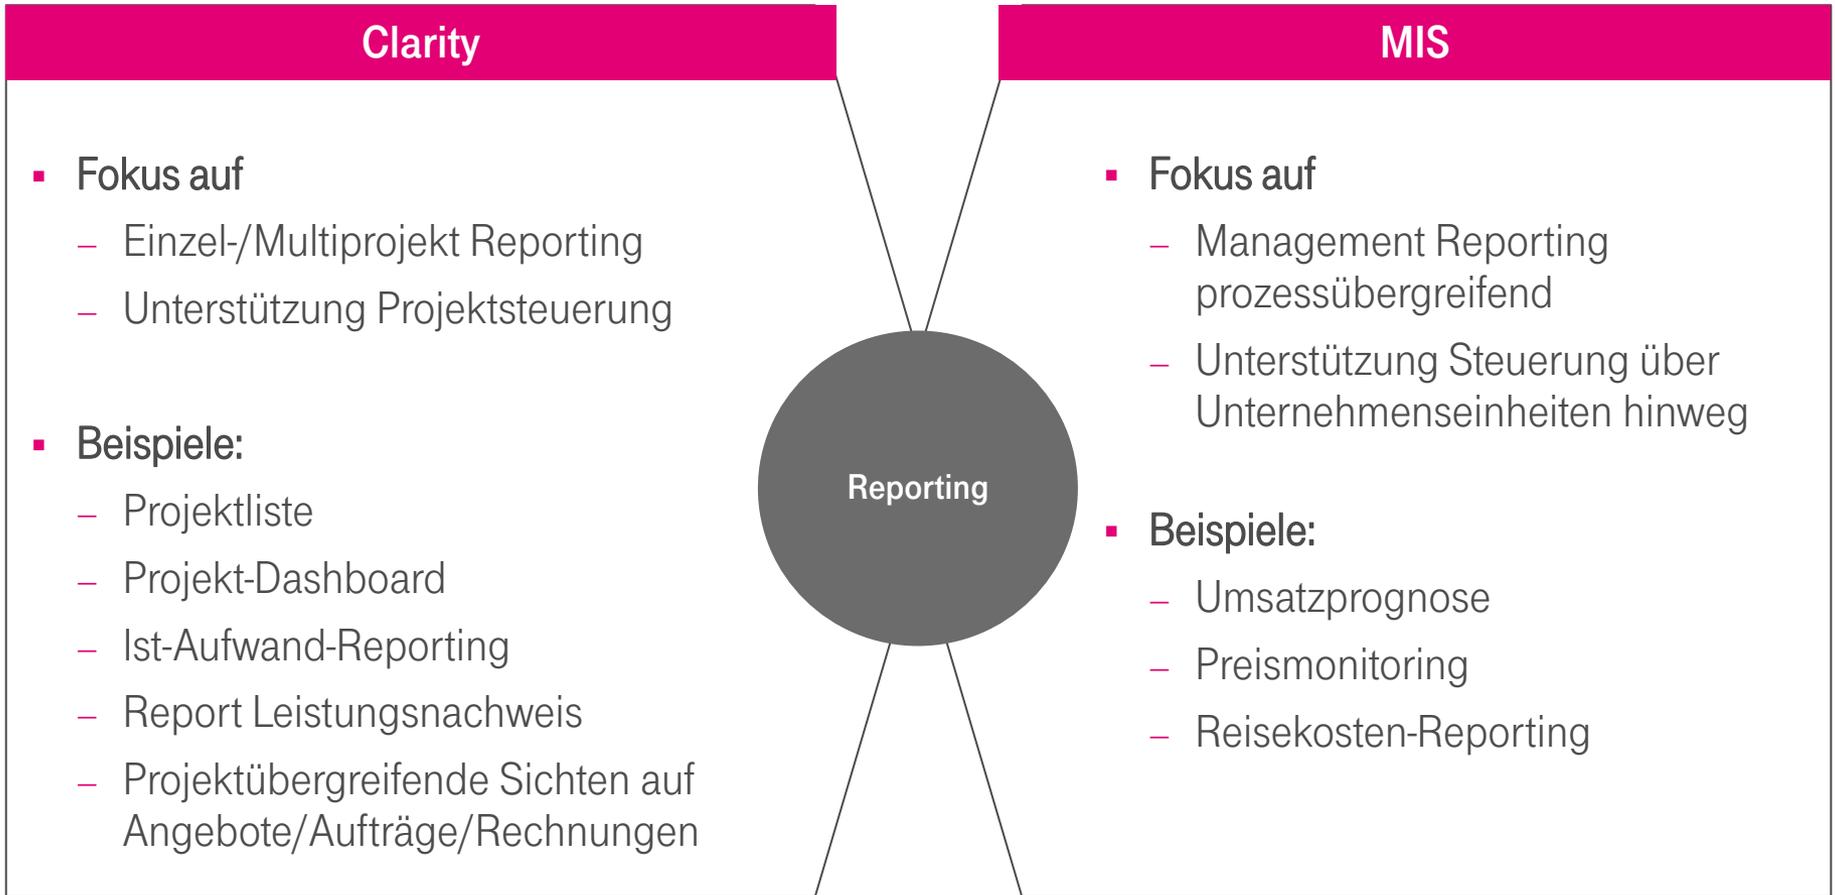

EINZEL-/MULTIPROJEKT REPORTING

CLARITY – BEISPIEL: PROJEKT-DASHBOARD

■ Übersicht Projektstundensätze

R-ID▲	Anfangsdatum	Enddatum	Ressourcenklasse	Kostensatz	Rolle	Preis
AHA	29.12.14	31.12.24	Senior Project Manager	39,60	T-Com_IT(Manager)	92,80
AHA	01.01.25	31.12.50	Senior Project Manager	39,60	T-Com_IT(Manager)	
AHA	29.12.14	31.12.24	Senior Project Manager	39,60	T-Com_IT(Senior)	117,00
AHA	01.01.25	31.12.50	Senior Project Manager	39,60	T-Com_IT(Senior)	
ALEH	29.12.14	31.12.24	Advanced System Engineer	24,99	T-Com_IT(Manager)	92,80
ALEH	01.01.25	31.12.50	Advanced System Engineer	24,99	T-Com_IT(Manager)	

■ Überbuchung im Blick

Vorgang	rid	Planaufwand (Basis)	Istaufwand	Restaufwand	Vorläufiger Aufwand	Gesamtaufwand	Differenz
ALT: {L:RE} {R:01.600} - dZAM - CR-Bewertungen	5.006.296		47,0	0,0	0,0	47,0	(47,0)
ALT: {L:RE} {R:01.600} - dZAM - CR-Bewertungen	5.032.900		5,0	0,0	0,0	5,0	(5,0)
{L:ARCH} {R:Campus} - Unterstützung KTs Campus-Mode Dresden 2013	5.030.724		2,0	0,0	0,0	2,0	(2,0)
{L:ARCH} {R:Campus} - Unterstützung	5.014.250		51,5	0,0	0,0	51,5	(51,5)

■ Finanzübersicht (Aggregation Kostenplan)

Klasse	Plan (Akt. Periode)	Ist (Akt. Periode)	Plan (Ende)	Planertrag zu Istkosten
Ertrag	2.811.792,44	2.742.241,40	2.811.792,44	2.811.792,44
-- Fakturiert	2.811.792,44	2.742.241,40	2.811.792,44	2.811.792,44
---- Eigenleistung	1.391.366,38	1.294.396,22	1.391.366,38	1.391.366,38
---- Fremdleistung	1.269.241,34	1.250.811,85	1.269.241,34	1.269.241,34
---- Eigenleistung n. kont.	79.923,83	117.248,06	79.923,83	79.923,83
---- Fremdleistung n. kont.	4.527,80	7.145,40	4.527,80	4.527,80
---- Reisekosten	66.733,09	72.639,87	66.733,09	66.733,09
---- Sonstiges		0,00		
Kosten		2.536.646,40		2.536.646,40
-- Kontierend		2.480.232,67		2.480.232,67
---- Eigenleistung		1.006.303,39		1.006.303,39
---- Fremdleistung		1.473.929,28		1.473.929,28
-- Eigenleistung n. kont.		0,00		0,00
-- Fremdleistung n. kont.		0,00		0,00
-- Reisekosten		43.955,47		43.955,47
-- Sonstiges		12.458,26		12.458,26
Ergebnis	2.811.792,44	205.595,00	2.811.792,44	275.146,04
Ergebnis %	100,00	7,50	100,00	9,79
Kosten-Fortschritt %				
Fachliche Fertigstellung %		70,00		

EINZEL-/MULTIPROJEKT REPORTING

CLARITY – BEISPIEL: IST-AUFWAND-REPORTING

Ist-Aufwand (global) | Ist-Aufwand (RM) | Plausibilität

Ist-Aufwand: Ist-Aufwand

Ist-Aufwand

Zeitraum: 01.11.2015 bis 15.11.2015

Ressourcen: Fleischer, Rico

Leistungsart:

Rolle:

Kommentar:

Ressourcenprojektfeld-ID:

Ressourcen-BU-ID:

Projekte:

Projekttyp:

Vorgangspfad:

Vorgang:

Projektprojektfeld-ID:

Projekt-BU-ID:

Filter | Alle anzeigen | Filter speichern | Leeren

P-BU ID	P-PF ID	Projekt-Hierarchie	Hauptprojekt	Projekt-ID	Projektname	Projektstart	Projektende	Projekttyp	Umsatzart	Datum	Aufwand	R-BU ID	R-PF ID	Mitarbeiter	Rolle	Leistungsart	Vorgang	Vorgangspfad	Kommentare
9007	9007	0027751/0027750	0027751	0027750	CU DM (9007) - Ständige Aktivität	11.01.13	20.11.15	Ständige Aktivität		04.11.15	0,97	9007	9007		Project Manager	Eigenleistung	Nicht projektbezogene Zeiten (mit Kommentar)	Nicht projektbezogene Zeiten (mit Kommentar)	
9007	9007	0028010/0027903	0028010	0027903	CU DM (9007) - Einzelaktivität	13.01.11	24.12.15	Ständige Aktivität		10.11.15	3,48	9007	9007		Project Manager	Eigenleistung	9007 Demandmanagement	Corporate Bereich - CB DM/9007 Demandmanagement	
9007	9007	0028010/0027903	0028010	0027903	CU DM (9007) - Einzelaktivität	13.01.11	24.12.15	Ständige Aktivität		12.11.15	3,05	9007	9007		Project Manager	Eigenleistung	9007 Demandmanagement	Corporate Bereich - CB DM/9007 Demandmanagement	
9007	9007	0028010/0027903	0028010	0027903	CU DM (9007) - Einzelaktivität	13.01.11	24.12.15	Ständige Aktivität		09.11.15	2,42	9007	9007		Project Manager	Eigenleistung	9007 Demandmanagement	Corporate Bereich - CB DM/9007 Demandmanagement	
9007	9007	0028010/0027903	0028010	0027903	CU DM (9007) - Einzelaktivität	13.01.11	24.12.15	Ständige Aktivität		04.11.15	0,57	9007	9007		Project Manager	Eigenleistung	9007 Demandmanagement	Corporate Bereich - CB DM/9007 Demandmanagement	
9007	9007	0027751/0027750	0027751	0027750	CU DM (9007) - Ständige Aktivität	11.01.13	20.11.15	Ständige Aktivität		09.11.15	0,38	9007	9007		Project Manager	Eigenleistung	Nicht projektbezogene Zeiten (mit Kommentar)	Nicht projektbezogene Zeiten (mit Kommentar)	
8100	7013	0012401/0012399	0012401	0012399	Clarity - ifd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	07.07.05	31.01.16	Internes Projekt		10.11.15	2,25	9007	9007			Eigenleistung	Clarity - Weiterentwicklung/ Test	Clarity - Weiterentwicklung/ Test	
8100	7013	0012401/0012399	0012401	0012399	Clarity - ifd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	07.07.05	31.01.16	Internes Projekt		11.11.15	3,28	9007	9007			Eigenleistung	Clarity - Weiterentwicklung/ Test	Clarity - Weiterentwicklung/ Test	
8100	7013	0012401/0012399	0012401	0012399	Clarity - ifd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	07.07.05	31.01.16	Internes Projekt		09.11.15	3,32	9007	9007			Eigenleistung	Clarity - Weiterentwicklung/ Test	Clarity - Weiterentwicklung/ Test	
8100	7013	0012401/0012399	0012401	0012399	Clarity - ifd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	07.07.05	31.01.16	Internes Projekt		06.11.15	2,25	9007	9007			Eigenleistung	Clarity - Systempflege/ Administration	Clarity - Systempflege/ Administration	

EINZEL-/MULTIPROJEKT REPORTING

CLARITY – BEISPIEL: REPORT LEISTUNGSNACHWEIS

Leistungsnachweis | Leistungsnachweis (OBS) | Leistungsnachweis (global)

Leistungsnachweis: Leistungsnachweis

Eigene Leistungsnachweise

Periode: 2015

Filter | Alle anzeigen | Filter speichern | Leeren

Periode	Ressource	Starten	Ende	Ist-Aufwand	Excel
2015/11	RFL	26.10.15	29.11.15	155,04	
2015/10	RFL	28.09.15	25.10.15	134,02	
2015/09	PEI	31.08.15	27.09.15	186,03	

Leistungsnachweis für

T-Systems Multimedia Solutions GmbH

Auftraggeber: _____
Auftragnehmer: _____

Corporate Bereich Demandmanagement (CB DM - Demandmanag

Projektfeld: _____
Bestellkennzeichen: _____

26.10.2015 _____
29.11.2015 _____

Periode von _____
bis _____

Datum	Projekt	Vorgang	Stunden
26.10.2015	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	Clarity - Projektmanagement	4.28
26.10.2015	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	Clarity - Systempflege/ Administration	3.52
27.10.2015	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	Clarity - Projektmanagement	4.88
27.10.2015	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	Clarity - Systempflege/ Administration	3.63
27.10.2015	CU DM (9007) - Ständige Aktivität	Nicht projektbezogene Zeiten (mit Kommentar)	0.17

19.11.2015	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	Clarity - Systempflege/ Administration	0.57
20.11.2015	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	Clarity - Systempflege/ Administration	3.77
Gesamt			155.04

Projekt-ID	Projekt	ff. Abteilung	Stunden	Unterschrift Projektleiter
Interne Projekte				
0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	PF7013	142.88	_____
Ständige Aktivitäten				
0027903	CU DM (9007) - Einzelaktivität	CB_DM	10.64	_____
0027750	CU DM (9007) - Ständige Aktivität	CB_DM	1.52	_____

Ort, Datum _____ Ort, Datum _____

EINZEL-/MULTIPROJEKT REPORTING

CLARITY – BEISPIEL: PROJEKTÜBERGREIFENDE SICHTEN

■ Angebotsübersicht

Angebotsdokument	Angebotsordner	Angebotsnummer	Name	Angebotswert	Angebotsstatus	Statuswechsel am	Erstellt am	Abgegeben am	Gültig bis	Verknüpfte Auftragspositionen	Projektname	Projektleiter	Säule	Umsatzart	International	Geschäftsbereich	Prozess Information	Prozess Kommentar
		0000575-02-01	Dienstleistungen einer BlackBerry Enterprise Lösung		Abgegeben		31.08.10	08.09.10	15.09.10	4508382492 / 00010 / 1.888,00 4508382492 / 00020 / 5.664,00 4508382492 / 00030 / 1.888,00	AM BES_TSI		T-Systems Konzern			BA 04 - BST (naktiv)		(Leer)
		0000725-02-01	die Nutzung von WebEx-Sessions		Abgegeben		17.05.11	14.06.11	30.06.11		WebEX		T-Systems Konzern			GB6200 - DB		(Leer)
		0001165-03-01	CP-0001 - Installation und Konfiguration		Abgegeben		02.11.10	12.11.10	12.11.10		Betrieb BARMER		T-Systems Extern			BA 04 - BST		(Leer)

■ Auftragsübersicht


Auftragsdokument	Auftragsordner	Bestellnummer	Auftragswert	Auftragsstatus	Bearbeitungsstatus	Bestellt am	Erfasst am	Bestätigt am	Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Zugrundliegendes Angebot	Projekt-ID	Projektname	Projektleiter	Prozessinfo	Prozesskommentar
		96572936	4.500,00	Mit Änderungen angenommen	Abgeschlossen	07.11.14	14.11.14	24.11.14	00010	6,000	PT	Entwicklung einer LOB App		0021969-01-02	0021969	Marketingbudget sto AG			(Leer)
		959094	27.125,00	Mit Änderungen angenommen	Abgeschlossen	02.06.15	03.06.15	05.06.15	0002	1,000	LE	Grundverwaltung und Bimanagement - Systeme		0029546-01-01	0029546	VEGA SEO + SEM Beratung			(Leer)
		959094	27.125,00	Mit Änderungen angenommen	Abgeschlossen	02.06.15	03.06.15	05.06.15	0001	1,000	LE	Service und Unterstützung im		0029546-01-01	0029546	VEGA SEO + SEM Beratung			(Leer)

■ Rechnungsübersicht

Rechnungsdokument	Rechnungsordner	Rechnungsart	Leistungszeitraum	Individualer Objektschlüssel	Rechnungswert	Bearbeitungsstatus	Erstellt am	Abgerechnet am	Rechnungsnummer	Verknüpfte Auftragspositionen	Projekt-ID	Projektname	Prozess Information	Prozess Kommentar
		Rechnung	Dezember 2015	0009116_TL_15-12_01		Bearbeitung PL/PA	25.11.15			4155734610 / 00030 / 299.988,00	0009116	eP-ErP DTAG TIT 2010-2015		Zurück an PL
		Rechnung	Dezember 2015	0009116_TL_15-12_02		Bearbeitung PL/PA	25.11.15			4155734633 / 00050 / 179.774,00	0009116	eP-ErP DTAG TIT 2010-2015		Zurück an PL
		Rechnung	November 2015	0009116_TL_15-11_02		Abgerechnet	29.10.15	06.11.15	0009053671	4155734633 / 00050 / 179.774,00	0009116	eP-ErP DTAG TIT 2010-2015		(Leer)
		Rechnung	November 2015	0009116_TL_15-11_01		Abgerechnet	29.10.15	06.11.15	0009053672	4155734610 / 00030 / 299.988,00	0009116	eP-ErP DTAG TIT 2010-2015		(Leer)
		Rechnung	Oktober 2015	Catspa Approval		Abgerechnet	29.09.15	07.10.15	0009053020	4155734610 / 00030 / 299.988,00	0009116	eP-ErP DTAG TIT 2010-2015		(Leer)

ÜBERGREIFENDES MANAGEMENT REPORTING

MIS – ÜBERBLICK

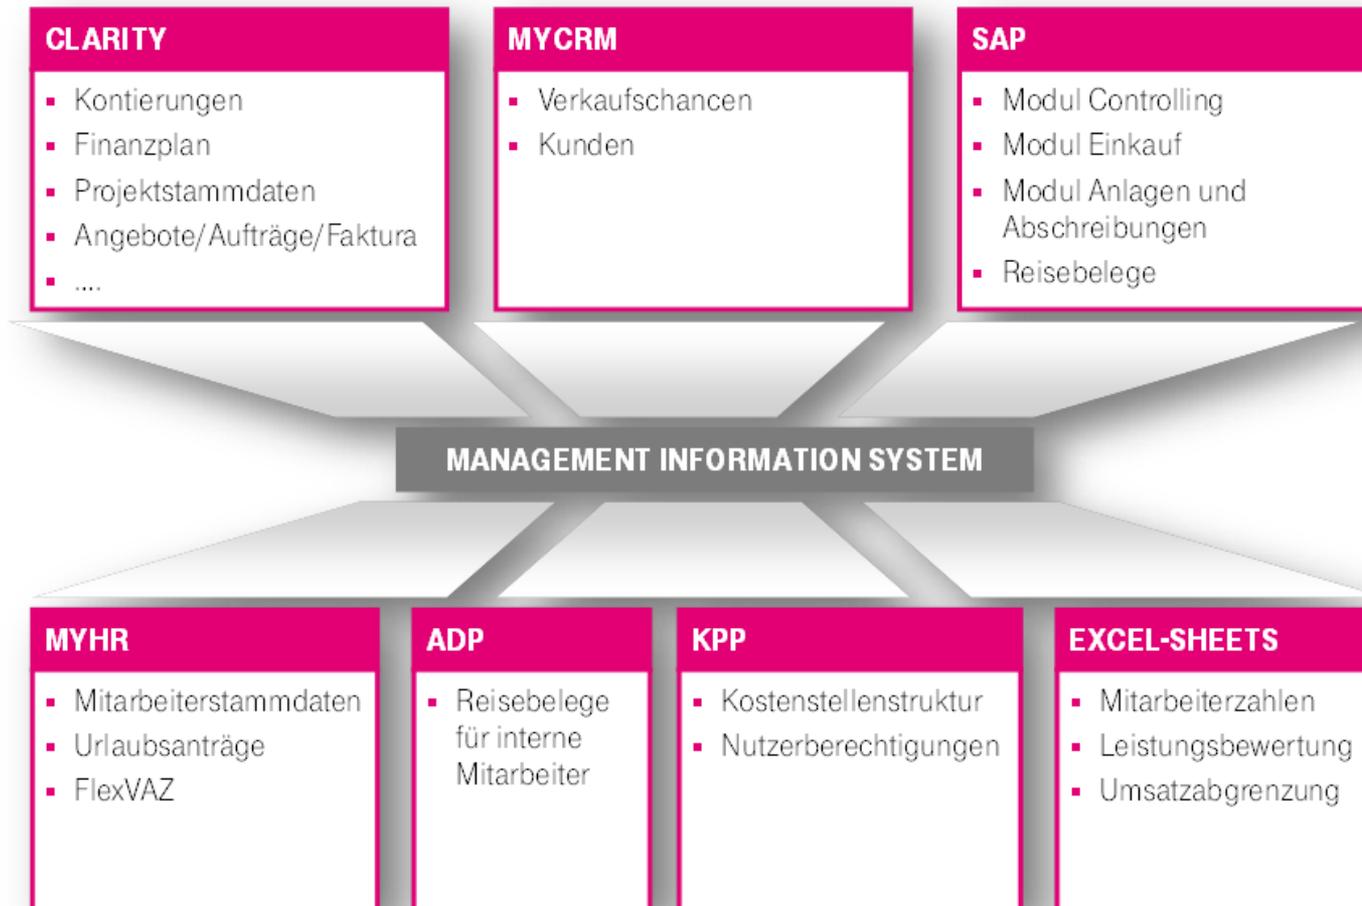


ÜBERGREIFENDES MANAGEMENT REPORTING

MIS – BEISPIEL: UMSATZPROGNOSE

- Akquise-Werte sind eine Kombination nicht verknüpfter CRM-Verkaufschancen und Clarity-Projekten vor „Angebot“
- Werte ab „Angebot“ stammen ausschließlich aus Clarity

Umsatzprognose gewichtet lt. Nutbaser je Business Unit

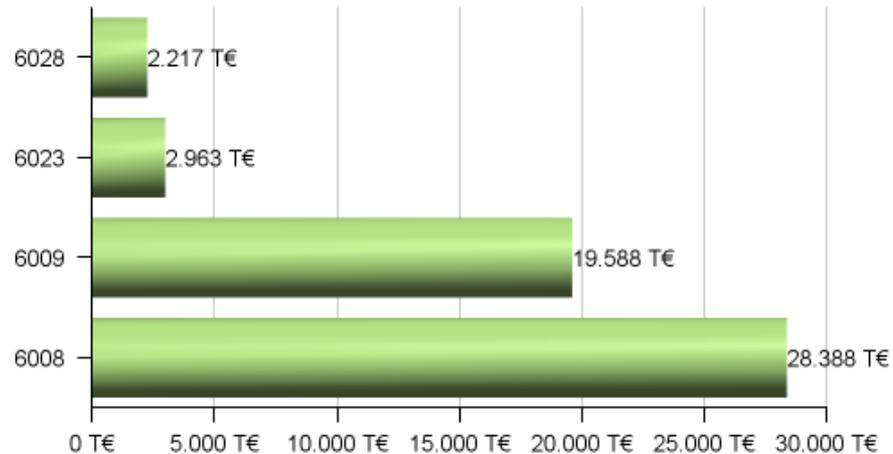


Umsatzprognose gewichtet lt. Nutbaser je Umsatzart

	Extern			Konzern		
	ungewichtet	gewichtet	Ist-Umsatz	ungewichtet	gewichtet	Ist-Umsatz
Akquise lt. Nutbaser	355.038	225.111	0	333.928	209.678	0
Angebot	1.273.914	777.604	275.814	478.595	312.324	106.794
Lol	887.564	841.390	652.073	29.704	23.763	12.996
Sicher	29.564.307	29.555.320	24.334.244	21.334.837	21.209.674	16.391.022
Summe	32.080.823	31.399.425	25.262.131	22.177.065	21.755.440	16.510.813

ÜBERGREIFENDES MANAGEMENT REPORTING

MIS – BEISPIEL: PREISMONITORING

- Die zugrundeliegenden **Stundensätze** stammen aus den Projekten im **Clarity**
- Die dargestellten **Branchen** werden über die, mit den Projekten verknüpften **CRM-Verkaufschancen** ermittelt

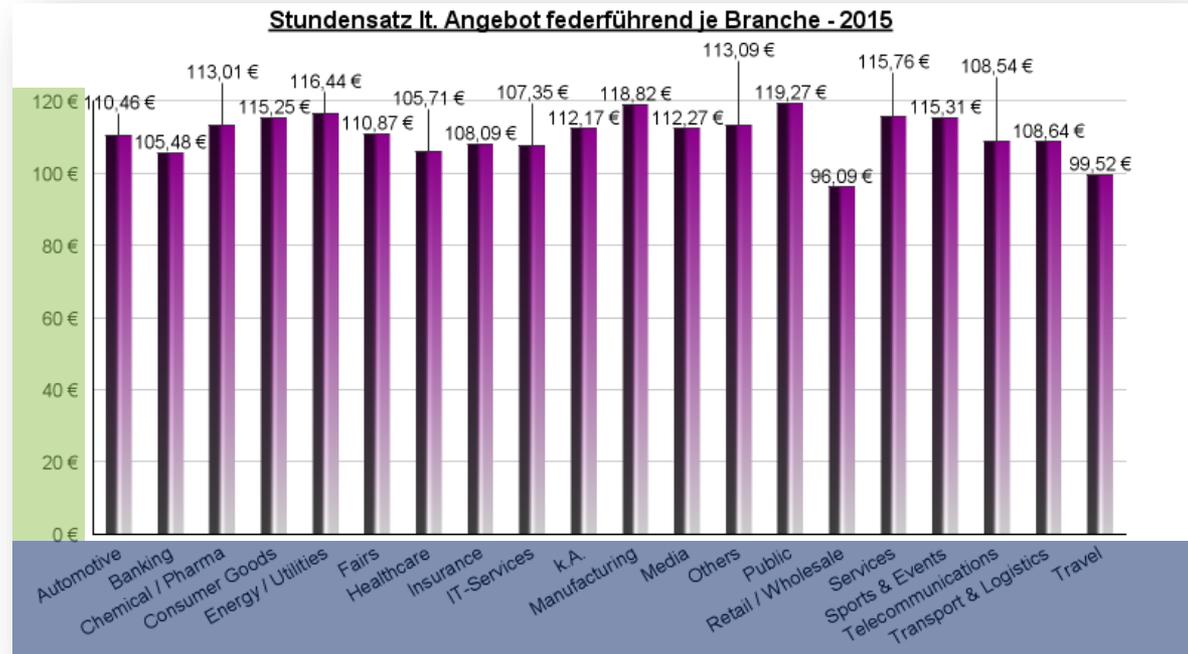

ÜBERGREIFENDES MANAGEMENT REPORTING

MIS – BEISPIEL: REISEKOSTEN-REPORTING

BU	PF	Name	Kürzel	Belegnummer	Belegposition	Belegdatum	Buchungsdatum	Anreisedatum	Abreisedatum	Zielort	Reiseart	Reisennummer ADP	Projekt-ID	Projekt	Reisekosten
9007	9007			92089386	1	05.03.2015	05.03.2015	03.02.2015	05.02.2015	Tübingen	Kilometergeld	2015000204	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	9,90 €
9007	9007			92089386	2	05.03.2015	05.03.2015	03.02.2015	05.02.2015	Tübingen	Spesen	2015000204	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	38,40 €
9007	9007			92089386	3	05.03.2015	05.03.2015	03.02.2015	05.02.2015	Tübingen	Hotel	2015000204	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	115,89 €
9007	9007			92089386	4	05.03.2015	05.03.2015	03.02.2015	05.02.2015	Tübingen	Frühstück	2015000204	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	21,85 €
9007	9007			92089386	5	05.03.2015	05.03.2015	03.02.2015	05.02.2015	Tübingen	Mietwagen	2015000204	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	45,25 €
9007	9007			92089386	6	05.03.2015	05.03.2015	03.02.2015	05.02.2015	Tübingen	Parken	2015000204	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	37,39 €
9007	9007			92089386	7	05.03.2015	05.03.2015	03.02.2015	05.02.2015	Tübingen	Tanken	2015000204	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	5,50 €
9007	9007			92091451	1	21.05.2015	21.05.2015	27.04.2015	30.04.2015	Tübingen	Mietwagen	2015002998	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	117,49 €
9007	9007			92091451	2	21.05.2015	21.05.2015	27.04.2015	30.04.2015	Tübingen	Tanken	2015002998	0012399	Clarity - lfd. fachliche Betreuung & Weiterentwicklung	11,34 €

- Liste aller Reisen und deren Stammdaten wie Projekt-ID, Who-is-Who-Nr. (Mitarbeiter) sowie die Reisedaten (wann, wohin, ...) kommen aus **ADP**
- Über die Projekt-ID werden die Stammdaten wie Projektname, -status/-typ sowie verantwortliche Abteilung aus **Clarity** ergänzt
- Mit der Who-is-Who-Nr. des Reisenden werden die Stammdaten wie Name, Kürzel, Kostenstelle aus **myHR** geholt
- Reisekosten:
 - Reise **abgerechnet**, Ausgabe Kosten laut **SAP**
 - Reise **nicht abgerechnet**, Keine Angabe von Kosten

REPORTING PROZESSÜBERGREIFEND

CHANCEN & HERAUSFORDERUNGEN



Fazit

Clarity Geschäftsprozessintegration

CLARITY GESCHÄFTSPROTESSINTEGRATION

FAZIT

- CA Clarity im Einsatz seit 10 Jahren
- Eines der zentralen Systeme in der MMS Prozesslandschaft
- Systembetreuung durch 1,5 FTE
- 1500 Mitarbeiter arbeiten mit dem System (64GB Daten)
- Schnittstellen zu 8 Systemen
- Durchgehendes elektronisches Vertragsmanagement
(Vom Angebot über den Auftrag bis hin zur Abrechnung)
- E-Abrechnung; Verknüpfung von externer und interner Leistungsverrechnung
- Übergreifendes Reporting mit IBM Cognos BI (MIS)

WIR SIND FÜR SIE DA HABEN SIE NOCH FRAGEN?

T-Systems Multimedia Solutions GmbH
Riesaer Straße 5
D-01129 Dresden

Rico Fleischer +49 351 2820 – 2923
Frank Treichel +49 351 2820 – 2778

E-Mail: clarity@mms-dresden.de
URL: www.t-systems-mms.com
